

2014

Inwestycje i remonty zrealizowane w gminie Sicienکو



Referat Inwestycji i Rozwoju

*Urząd Gminy w Sicienکو
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienکو*



Wstęp

Z przyjemnością przedstawiam opracowanie – krótką dokumentację w zakresie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i remontowych oraz innych działań Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienku zrealizowanych, na terenie gminy Sicienko w roku 2014.

Rok 2014, podobnie jak rok poprzedni zapisze się w historii jako: po pierwsze, skuteczne aplikowanie i wykorzystanie środków unijnych na realizację zadań własnych gminy. Po drugie, konsekwencja w działaniu organów gminy tzn. konsekwentne, na miarę możliwości technicznych, ekonomicznych i społecznych realizowanie wcześniej określonych planów, programów i studiów. Po trzecie to inwestycje, które zostały zrealizowane w tym okresie. Bez wątpienia był to rok kilku ważnych i potrzebnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Był to czas wykorzystanych szans, jakie dają środki finansowe z UE. W zakresie zrealizowanych inwestycji był to okres bardzo dobry w naszej gminie. Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów w omawianym okresie stanowi kwotę ponad 7,7 mln zł (tj. ok. 0,9 mln zł więcej niż w roku, 2013) z czego 46,7% to środki własne gminy, a 53,3% tj. kwota ponad 4,1 mln zł to środki pozyskane z różnych programów i instytucji.

Struktura wydatków inwestycyjnych wskazuje, że najwięcej środków, bo aż 4,5 mln zł. (2,3 mln środki własne, a 2,2 mln środki zewnętrzne z różnych źródeł) tj. 58,4 % wszystkich wydatków inwestycyjno-remontowych przeznaczyliśmy na budowę i remonty dróg w tym na długo oczekiwany kapitalny remont przepięknego mostu nad Kanałem Bydgoskim w Kruszyńcu. Warto zauważyć, że w roku 2014 przybyło nam nowych wodociągów i sieci kanalizacyjnej, m.in. kanalizacja sanitarna z Teresina do Kazina. Spełniło się, więc w ten sposób marzenie naszej „opozycji”, aby ścieki z gminy Sicienko wysłać do oczyszczalni w Nakle. Rozsądnych pragnę uspokoić i zapewnić, że działanie to nie było podyktowane chęcią przypodobania się „opozycji” w roku wyborczym. Przetłaczanie ścieków z Teresina do istniejącej przepompowni w Kazinie jest po prostu rozwiązaniem optymalnym i w pełni uzasadnionym zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W minionym roku wybudowaliśmy 21 nowych punktów świetlnych. Lokalizację nowych latarni ulicznych wskazali sami mieszkańcy w ramach funduszu sołeckiego. Remontowaliśmy obiekty oświatowe, za kwotę ponad 1 mln zł doposażyliśmy oddziały przedszkolne we wszystkich naszych szkołach. Powstały nowe boiska sportowe i place zabaw, a kolejne obiekty i budowle są projektowane.

Podsumowując rok 2014 nie można nie zauważyć faktu znacznego spadku zadłużenia gminy, które na koniec roku 2014 stanowiło 12,84%. Bardzo ważnym i niesłychanie cennym jest, że zmniejszenie zadłużenia gminy nie ograniczyło wydatków inwestycyjnych i nie spowolniło systematycznego, przemyślanego i zrównoważonego rozwoju gminy. Spoglądając na geografię realizowanych zadań nie ma białych plam. Po raz kolejny przypomnę, że zrównoważony rozwój nie oznacza wszystkim po równo. Zrównoważony rozwój to taki, który zaspokaja podstawowe potrzeby obecne poszczególnych społeczności lub obywateli, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Należy również pamiętać, że zrównoważony rozwój opiera się na dwóch podstawowych pojęciach: pojęciu potrzeb i pojęciu ograniczeń.

Pragnę również zwrócić uwagę na działania typowo administracyjne będące w obszarze działania Referatu Inwestycji i Rozwoju. To pracownicy tegoż referatu przygotowują aplikacje o środki pozabudżetowe w tym środki unijne. Realizują te zadania, prowadząc procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych, monitorowaniem procesów inwestycyjnych oraz wspólnie z pracownikami referatu finansów rozliczają

zrealizowane inwestycje. Kolejnym działaniem referatu jest planowanie przestrzenne oraz nadawanie numerów nieruchomości. Ich analiza potwierdza systematyczny rozwój naszej gminy. Ilość nowo oddanych do użytku budynków mieszkalnych, ilość wydanych decyzji (przez Starostę) na budowę oraz ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy, na budowę kolejnych jest dobrym i mocnym fundamentem dalszego systematycznego rozwoju gminy Sicienko. Rok 2014 zapisze się także w pamięci, jako rok nadania nazw ulic w Zielonczynie oraz czas przystąpienia oraz przygotowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko oraz Strategii rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015-2020+. Przygotowane projekty dokumentów po etapie uzgodnień i konsultacji zostaną przekazane Radzie Gminy celem uchwalenia.

Rok 2014, był rokiem wyborczym, ale nie miało to wpływu na zakres i miejsce realizowanych zadań. Osobiście uważam, że miało to jednak wymiar typowo „polityczny”, co w naszej gminie jest mało istotne. Wybory nie wywarły presji na wymiar „gospodarczy” tego roku. W mojej ocenie niniejsze opracowanie jest tego niezbitym dowodem. Dowodzi ono, że realizowane w roku wyborczym zadania, były kontynuacją przyjętych znacznie wcześniej przez organy gminy założeń i strategii rozwoju. Nie ma w nich przypadkowych działań spełniających populistyczne oczekiwania określonych grup lobbystycznych, które nie zawsze służą zaspokojeniu oczekiwanych i powszechnych potrzeb społecznych. Myślę też, że właśnie to, przemyślane i konsekwentne od lat działanie miało znaczący wpływ na sukces wyborczy wójta i radnych go wspierających.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do lektury niniejszego opracowania.

Krzysztof Kula

Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Sicienko, luty 2015r.

Skład osobowy Referatu Inwestycji i Rozwoju w roku 2014:

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| 1. Krzysztof | Kula | - Kierownik Referatu |
| 2. Aurelia | Buzalska | - Inspektor ds. planowania przestrzennego |
| 3. Katarzyna | Pinkowska | - Inspektor ds. planowania przestrzennego |
| 4. Iwona | Ościak | - Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju |
| 5. Marcin | Szczepański | - Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji |
| 6. Małgorzata | Lisewska | - Pomoc administracyjna (przez okres 6 m-cy) |


Bardzo dziękuję koleżankom i koledze-kierownikom jednostek organizacyjnych gminy za przekazane informacje umożliwiające przygotowanie niniejszego opracowania.

Spis Treści

Lp	Tytuł	str.
1	Miejsca realizowanych inwestycji i remontów w 2014 roku	6
2	Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i remontowych poniesionych w roku 2014	7 - 13
3	Spis inwestycji realizowanych w roku 2014	14 - 20
4	Rozdział 1. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej	21-24
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłókwu	21
6	Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszyńie	22
7	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu	23
8	Wykonanie dokumentacji projektowej na przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszyńie	24
9	Rozdział 2. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury kanalizacyjnej	25-30
10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Notecią	27
11	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku w ul. Jesionowej, Klonowej, Jaworowej, Grabowej i Lipowej	28
12	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie	29
13	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacyjnej w Strzelewie	30
14	Rozdział 3. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy i remontu dróg	31-52
15	Remonty cząstkowe dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni bitumicznej	33
16	Przebudowa drogi gminnej nr 50303C w Kruszyńie - ul. Leśna - II etap	34
17	Budowa drogi gminnej Kruszyń - Zielonczyn - ul. Morenowa w Zielonczynie	36
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Tryszczyn - Strzelce Dolne w miejscowości Wojnowo	38
19	Przebudowa dróg gminnych w Sicienku - ul. Lipowa - I etap	39
20	Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243) opracowanie dokumentacji	41
21	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w Dąbrówce Nowej - I etap	42
22	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz	43
23	Wykonanie nakładok bitumicznych na drogach powiatowych	44
24	Remont mostu na Kanale Bydgoskim w miejscowości Kruszyńiec	46
25	Zakup kruszywa do remontu dróg	48
26	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchucinek	49
27	Budowa zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej w miejscowości Trzemiętowo	50
28	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goncarzewy	51
29	Naprawa chodnika przy drodze powiatowej w Sicienku	52
30	Rozdział 4. Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie obiektów kubaturowych	53-55
31	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	54
32	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłókwu (dokumentacja techniczna)	55
33	Rozdział 5. Inwestycyjne w zakresie sportu, turystyki i rekreacji	56-60
34	Budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej	57
35	Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie	59
36	Ogrodzenie boiska sportowego w Samsiecznie	60

37	Rozdział 6. Zakupy inwestycyjne	61-64
38	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej dla mieszkańców Gminy Sicienko	62
39	Zakup nieruchomości w Dąbrówce Nowej z przeznaczeniem na świetlice wiejską	63
40	Zakup nieruchomości w Teresinie pod budowę świetlicy wiejskiej	63
41	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	64
42	Rozdział 7. Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego	65-74
43	Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu ul. Przy Lesie	67
44	Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku	68
45	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówczynie	69
46	Budowa oświetlenia ulicznego w Kruszynie - ul. Kościelna	70
47	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Rudzie	71
48	Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu - w ul. Poziomkowej, Malinowej i Jagodowej	72
49	Budowa oświetlenia ulicznego w Kasprowie	73
50	Budowa oświetlenia ulicznego w Szczutkach	74
51	Rozdział 8. Zadania w zakresie podniesienia standardu oświetlenia ulicznego	75-78
52	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kruszynie - ul. Ogrodowa	76
53	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łukowcu	77
54	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie	78
55	Rozdział 9. Podsumowanie - Struktura finansowania inwestycji i remontów zrealizowanych w Gminie Sicienko w 2014 roku	79
56	Rozdział 10. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	80-91
57	Zestawienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rok 2014	81
58	Zestawienie decyzji o warunkach zabudowy - rok 2014	84

Miejsca Realizowanych Inwestycji i Remontów w 2014 Roku na TERENIE GMININY SICIENKO

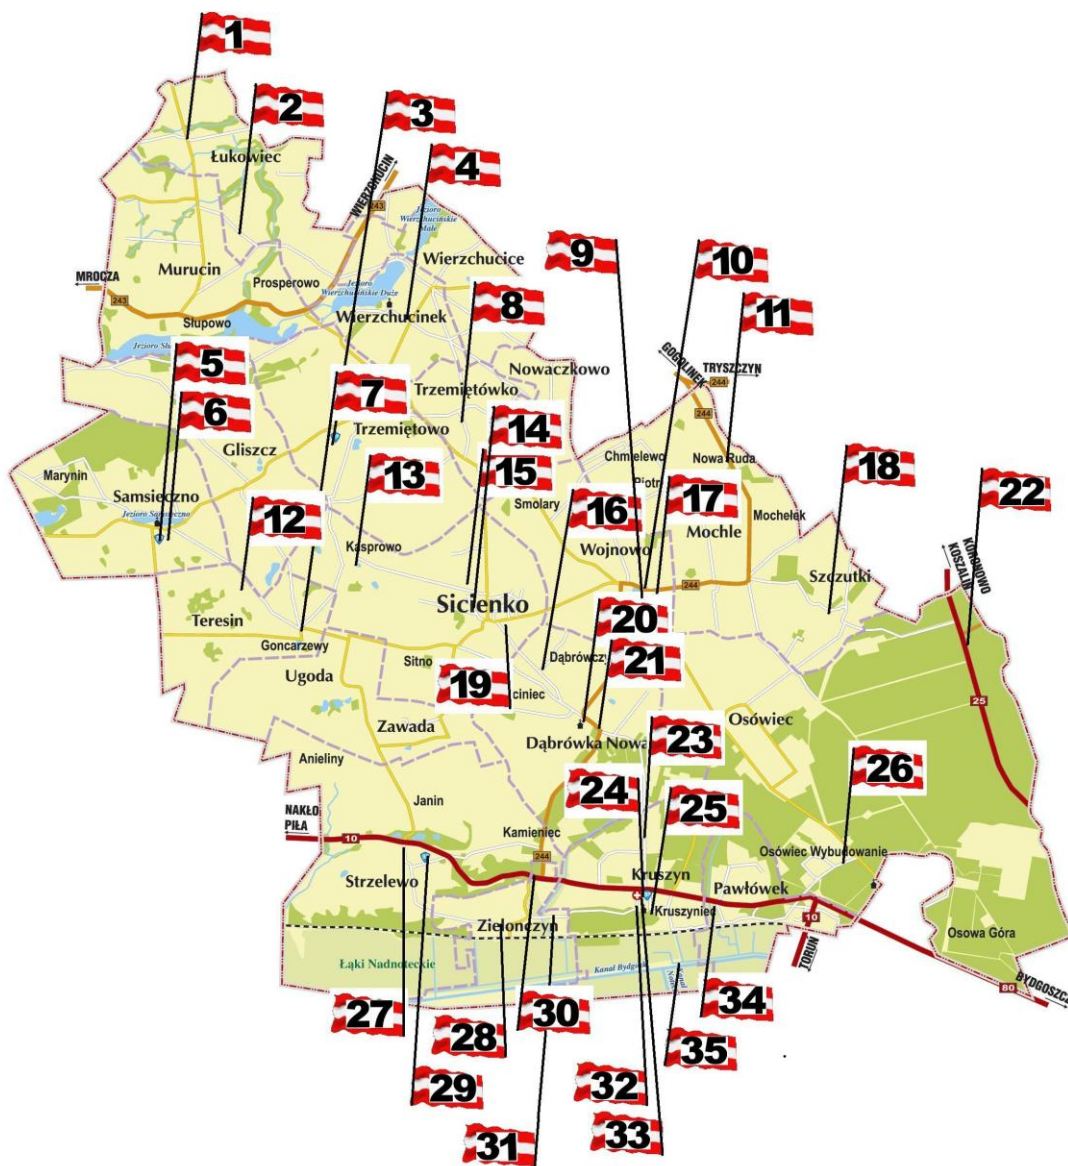

1. Oświetlenie uliczne w Łukowcu	13. Oświetlenie uliczne w Kasprowie	25. Oświetlenie uliczne - ul. Kościelna w Kruszynie
2. Oświetlenie uliczne w Łukowcu	14. Przebudowana ul. Lipowa w Sicieniu	26. Oświetlenie uliczne - ul. Przy Lesie w Osówcu
3. Termomodernizacja szkoły w Trzemiętowie	15. Kanalizacja sanitarna w Sicieniu	27. Projekt kanalizacji sanitarnej w Strzelewie
4. Droga do kościoła w Wierzchucinku	16. Oświetlenie uliczne w Dąbrówczynie	28. Oświetlenie drogowe w Zielonczynie
5. Nawierzchnia bezp. na placu zabaw w Samsiecznie	17. Renowacja płyty boiska w Wojnowie	29. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie
6. Ogrodzenie boiska w Samsiecznie	18. Oświetlenie drogowe w Szczutkach	30. Skrzyżowanie na drodze nr 10 w Zielonczynie
7. Chodnik w miejscowości Goncarzewy	19. Nawierzchnia bezp. na placu zabaw w Sicieniu	31. Przebudowana droga Zielonczyn - Kruszyn
8. Oświetlenie uliczne w Trzemiętówku	20. Boisko wraz z ogrodzeniem w Dąbrówce Nowej	32. Sieć wodociągowa w ul. leśnej w Kuszynie
9. Zakup wyposażenia do ZS w Wojnowie	21. Chodnik w Dąbrówce Nowej	33. Plac zabaw i wyposażenie szkoły w Kruszynie
10. Droga wojewódzka nr 244 w Wojnowie	22. Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 25	34. Sieć wodociągowa w PawłóWKu
11. Oświetlenie uliczne w Nowej Rudzie	23. Oświetlenie uliczne w Kruszynie na ul. Ogrodowej	35. Wyremontowany most w Kruszycu
12. Kanalizacja sanitarna Teresin - Kazin	24. Przebudowana ul. Leśna w Kruszynie	

Rozliczenie Wydatków Inwestycyjno - Remontowych Poniesionych w Roku 2014

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nr karty	Wartość całkowita (Na koniec 2014r.) (zł)	Koszt poniesiony w roku 2014 (zł)		Uwagi
					Budżet Gminy	Środki pozabudżet.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE						
1.	Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez	-	-	214.258,13	206.218,76	0,00	Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny w Sicienku (dotacja)
	a) Rozbudowa sieci wodociągowej w PawłóWKu	2013-2014	I – 1/13	46.341,99	43.416,68	0,00	Inwestycja zakończona
	b) Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu (opracowanie dokumentacji)	2014	I - 1/14	17.381,00	17.381,00	0,00	Inwestycja przeniesiona na rok 2015
	c) Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszyńie	2013-2014	I – 1/13	140.535,14	135.421,08	0,00	Inwestycja zakończona
2.	Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszyńie (opracowanie dokumentacji)	2014		10.000,00	10.000,00	0,00	Inwestycja przeniesiona na lata kolejne
3.	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienka – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:	-	-	689.675,11	405.511,21	225.926,00	-
	a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Notecią	2013-2014	I – 11/12	279.440,63	35.310,63	225.926,00 Dotacja z PROW	Inwestycja zakończona
	b) Budowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku w ul. Jesionowej, Klonowej, Jaworowej, Grabowej i Lipowej	2013-2014	I – 16/13	197.170,94	186.605,24	0,00	Zakończono I etap Inwestycja przeniesiona na lata kolejne w zakresie II etapu
	c) Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszyńie (opracowanie dokumentacji projektowej)	2013-2014	I – 13/13	15.744,00	0,00	0,00	Inwestycja przeniesiona na rok 2015

	d) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie (opracowanie dokumentacji technicznej)	2013-2014	I – 9/13	180.987,60	167.263,40	0,00	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na rok 2015
	e) Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Strzelewie (opracowanie dokumentacji)	2014	I – 3/14	16.331,94	16.331,94	0,00	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na rok 2015
Razem inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne				903.933,24	611.729,97	225.926,00	
II	INWESTYCJE i REMONTY DROGOWE						
1.	Remont cząstkowy dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni bitumicznej	2014	ZN-1/14	94.587,00	56.752,20	37.834,80 Powiat Bydgoski	Powiat Bydgoski Zadanie zakończone
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 50303C w Kruszyńce – ulica Leśna II etap	2011-2013	I – 2/11	654.678,07	545.708,37	0,00	Inwestycja zakończona
3.	Przebudowa drogi gminnej Zielonczyn – Kruszyń	2013-2014	I – 3/13	729.783,69	327.336,96	0,00	Inwestycja zakończona
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Trzyszczyń – Strzelce Dolne w miejscowości Wojnowo	2012-2014	I-10/12	1.042.420,25	145.643,00	879.579,25 ZDW w Bydgoszczy	Inwestycja zakończona
5.	Przebudowa dróg gminnych w Sicieniu ul. Lipowa - I etap	2013-2014	I – 15/13	463.783,80	461.045,82	0,00	Zakończono I etap Inwestycja przeniesiona na rok 2015
6.	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbuchach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243) – opracowanie dokumentacji	2013-2014	I – 11/13	33.113,00	23.179,10	0,00	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 244 w Dąbrówce Nowej	2013-2014	I – 19/13	94.106,81	86.431,61	0,00	Zakończono I etap Inwestycja przeniesiona na lata następne
8.	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz	2013-2014	I – 22/13	783.356,45	60.078,07	694.004,38	Powiat Bydgoski Inwestycja zakończona
9.	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach	2014	ZN-8/14	390.180,06	0,00	390.180,06	Powiat Bydgoski

	powiatowych						Zadanie zakończone
10.	Remont mostu na Kanale Bydgoskim w miejscowości Kruszyniec	2013-2014	ZN-8/13	240.127,73	227.458,73	0,00	Zadanie zakończone
11.	Zakup kruszywa do remontu dróg - 2900 ton	2014	NP	206.209,50	206.209,50	0,00	Zadanie zakończone
12.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchucinek	2014	ZN - 5/14	139.917,00	111.317,00	28.600,00 Dotacja z FOGR	Zadanie zakończone
13.	Budowa zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej 1527C w Trzemiętowie	2014	ZN - 3/14	82.999,17	30.000,00	52.999,17 Powiat Bydgoski	Powiat Bydgoski Inwestycja zakończona
14.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goncarzewy	2013-2014	ZN - 4/14	122.494,35	46.350,00	76.144,35 Powiat Bydgoski	Powiat Bydgoski Inwestycja zakończona
15.	Naprawa chodnika przy drodze powiatowej w Sicienku	2014	ZN - 7/14	39.174,04	0,00	39.174,04 Powiat Bydgoski	Powiat Bydgoski Inwestycja zakończona
Razem inwestycje drogowe				5.116.930,92	2.327.510,36	2.198.516,05	
III	INWESTYCJE KUBATUROWE						
1.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2012-2014	I-3/12	383.911,78	78.419,70	284.336,08 Dotacja z UE RPO	Inwestycja zakończona
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w PawłóWKu (opracowanie dokumentacji technicznej)	2014	I - 4/14	10.391,20	10.391,20	0,00	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
Razem inwestycje kubaturowe				394.302,98	88.810,90	284.336,08	
IV	INWESTYCJE W ZAKRESIE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI						
1.	Budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej	2013-2014	I-8/13	115.002,80	109.972,10	0,00	Inwestycja zakończona
2.	Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie	2013-2014	I-18/13	311.139,57	108.772,57	202.367,00 Dotacja z PROW	Inwestycja zakończona
3.	Ogrodzenie boiska sportowego w Samsiecznie	2014	ZN - 6/14	14.760,00	14.760,00	0,00	Inwestycja zakończona
Razem inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji				440.902,37	233.504,67	202.367,00	

ZAKUPY INWESTYCYJE

1.	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej dla mieszkańców Gminy Sicienko	2014	I - 5/14	286.078,32	58.146,00	174.438,00 Dotacja z PROW 53.494,32 Zakład Komunalny	Inwestycja zakończona
2.	Zakup nieruchomości w Dąbrówce Nowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2014	I - 6/14	127.035,88	127.035,88	0,00	Inwestycja przeniesiona na lata kolejne
3.	Zakup nieruchomości w Teresinie pod budowę świetlicy wiejskiej	2014	I - 7/14	26.071,80	26.071,80	0,00	Inwestycja przeniesiona na lata kolejne
4.	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	2014	I - 8/14	1.000.192,79	7.995,00	992.197,79 Dotacja z UE/EFS	Inwestycja przeniesiona na rok 2015
Razem zakupy inwestycyjne				1.439.378,79	219.248,68	1.220.130,11	
VI	OŚWIETLENIE ULICZNE						
1.	Budowa oświetlenia ulicznego – rozpoczętego w 2011 roku	2011 - 2014	I – 7/11	-	-	-	Inwestycja zakończona
	Oświetlenie w Osówcu ul. Przy Lesie			65.757,00	5.200,00	0,00	
	Razem:			65.757,00	5.200,00	0,00	
2.	Budowa oświetlenia w 2014 roku	2014	I – 7a/13 I – 5a/14 I – 5b/14 I – 5c/14 I – 5d/14 I – 5e/14	-	-	-	Inwestycja zakończona
	Oświetlenie w Trzemiętówku			9.266,73	6.430,33	0,00	
	Oświetlenie w Dąbrówczynie			10.143,44	10.143,44	0,00	
	Oświetlenie w Kruszynie - ul. Kościelna			12.827,40	12.827,40	0,00	
	Oświetlenie w Nowej Rudzie			27.362,92	27.362,92	0,00	
	Oświetlenie w Osówcu - osiedle ul. Malinowa			8.288,97	8.288,97	0,00	
	Oświetlenie w Kasprowie			13.630,24	13.630,24	0,00	

	Oświetlenie w Szczutkach		I – 5f/14	29.655,87	29.655,87	0,00	
	Razem:		a-f	111.175,57	108.339,17	0,00	
3.	Oświetlenie uliczne – podwieszenia w 2014			-	-	-	
	Oświetlenie w Kruszyńcu - ul. Ogrodowa	2014	ZN –	7.167,01	7.167,01	0,00	Zadanie zakończone
	Oświetlenie w Łukowcu		2/14	10.202,89	10.202,89	0,00	
	Oświetlenie w Zielonczynie - ul. Spacerowa			5.576,92	5.576,92	0,00	
	Razem:			22.946,82	22.946,82	0,00	
Razem oświetlenie uliczne				199.879,39	136.485,99	0,00	
RAZEM INWESTYCJE W 2014 ROKU				8.495.327,69	3.617.290,57	4.131.275,24	-

URZĄD GMINY SICIENKO
BUDŻET U.G.
Rok obrotowy: 2014
KB 2014.2.140.123.210

Zestawienie sald - roboczy

Data od: 2014-01-01 do: 2014-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 080 do: 080

Konto	Saldo na początek okresu		Obroty za podany okres		Saldo na koniec okresu	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
080-1 Świetlica wiejska Pawłówek	0,00	0,00	10 391,20	0,00	10 391,20	0,00
080-2 OCZYSZCZ.ŚCIEKÓW WOJNOWO	13 724,20	0,00	167 263,40	0,00	180 987,60	0,00
080-4 Termomoder. SP Trzemiętowo	21 156,00	0,00	362 755,78	383 911,78	0,00	0,00
080-6 Przeb.drogi.Zielonczyn-Kruszyn	11 537,40	0,00	718 246,29	729 783,69	0,00	0,00
080-7 PRZEB DR.-KRUSZYN ul.Strażacka	0,00	0,00	545 708,37	545 708,37	0,00	0,00
080-8 Boisko Wojnowo	0,00	0,00	311 139,57	311 139,57	0,00	0,00
080-9 Wykup sieci wodociągowej	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
080-10 ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	32 764,00	32 764,00	0,00	0,00
080-11 Zakup serwera UG Sicienko	0,00	0,00	12 448,83	12 448,83	0,00	0,00
080-12 Zakup nieruch. Dąbrówce Nowej	0,00	0,00	127 035,88	127 035,88	0,00	0,00
080-20 Oświetlenie Kruszyn	0,00	0,00	12 827,40	12 827,40	0,00	0,00
080-23 budowa kanal. Teresin-Kazin	18 204,00	0,00	261 236,63	279 440,63	0,00	0,00
080-24 Przebudowa mostu w Kruszyńcu	0,00	0,00	227 458,73	227 458,73	0,00	0,00
080-25 Przebudowa drogi wojewódzkiej	0,00	0,00	86 431,61	86 431,61	0,00	0,00
080-26 Rozb.kan.- ul.Poziomkowa	5 252,10	0,00	0,00	0,00	5 252,10	0,00
080-27 Rozb.kan.-ul.Mrotecka, Wiklin.	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00
080-28 Rozb. kan. - ul.Jawor., Grab.	10 565,70	0,00	186 605,24	197 170,94	0,00	0,00
080-33 boisko Dąbrówka Nowa	5 030,70	0,00	109 972,10	115 002,80	0,00	0,00
080-44 kanalizacja sołectwo Kruszyn	15 744,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	0,00
080-45 przebudowa drogi Wierzhucice	9 933,90	0,00	23 179,10	0,00	33 113,00	0,00
080-46 przebud.dróg gminnych Pawłówek	28 178,93	0,00	0,00	0,00	28 178,93	0,00
080-47 Przebud.dróg gm. w Sicieniu	2 737,98	0,00	461 045,82	463 783,80	0,00	0,00
080-48 oświetlenie w Trzemiętówku	2 836,40	0,00	6 430,33	9 266,73	0,00	0,00
080-49 Przebud.dróg gm. w Sicieniu	6 027,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00
080-58 Sieć wodociągowa Kruszyn	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
080-61 wykonanie szamba Głiszcz	1 968,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00
080-64 INWEST - ZAKUP DRÓG	2 377,80	0,00	76 792,98	76 912,98	2 257,80	0,00
080-86 oświetlenie ulic Osowiec	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
080-92 Oświetlenie Dąbrówka Nowa	0,00	0,00	10 143,44	10 143,44	0,00	0,00
Do przeniesienia	0,00	0,00	3 773 576,70	3 634 931,18	0,00	0,00

Strona 1

2015-01-01 08:35:54

Konto	Saldo na początek okresu		Obroty za podany okres		Saldo na koniec okresu	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	0,00	0,00	3 773 576,70	3 634 931,18	0,00	0,00
080-93 Oświetlenie Szczutki	0,00	0,00	29 655,87	29 655,87	0,00	0,00
080-95 Oświetlenie Kasprowo	0,00	0,00	13 630,24	13 630,24	0,00	0,00
080-96 Oświetlenie Osówiec	0,00	0,00	8 288,97	0,00	8 288,97	0,00
080-97 Oświetlenie Nowa Ruda	0,00	0,00	27 362,92	27 362,92	0,00	0,00
080-98 Zakup dz. 14/5 Teresin	0,00	0,00	26 071,80	26 071,80	0,00	0,00
080-99 Przebud. kanaliz.Strzelewo	0,00	0,00	16 331,94	0,00	16 331,94	0,00
080-101 "Przedszkole przy szkole"	0,00	0,00	629 397,80	629 397,80	0,00	0,00
080 INWESTYCJE	172 494,11	0,00	4 524 316,24	4 361 049,81	335 760,54	0,00
RAZEM	172 494,11	0,00	4 524 316,24	4 361 049,81	335 760,54	0,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (11) Edyta Deja

Spis inwestycji realizowanych w roku 2014

Lp.	Nr inwestycji	Nazwa Inwestycji	Podstawa rozpoczęcia	Czas realizacji		Wartość końcowa /zł/	Nr Karty	Uwagi
				Rozp.	Zak.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE								
1.	2226 – 10/09	Przebudowa budynku komunalnego w Sicienku ul. Sportowa 2 dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku	Uchwała Nr XXVII/165/08 RG Sicienko z dnia 03.12.2008r. z póź. zm..	2009 2010 2011 2012 2013 2014	-	549.808,97 3.416,00 154.476,72 0,00 0,00 0,00 Razem: 707.701,69	I – 11/09	Projekt techniczny Adaptacja pomieszczeń GOK na przedszkole Rok 2010: Studium wykonalności W 2011 roku został wykonany II etap przebudowy budynku. Inwestycja - III etap (kuchnia) przeniesiona na lata następne.
2.	7014.5.2011	Przebudowa drogi gminnej w Kruszynie ul. Leśna i Strażacka	Uchwała NR IV/17/11 RG Sicienko z dnia 23.02.2011r. z póź. zm.	2011 2012 2013 2014	2014	16.143,75 0,00 92.825,95 545.708,37 Razem: 654.678,07	I – 2/11	Dokumentacja techniczna Przebudowana ul. Strażacka Przebudowana ul. Leśna Inwestycja zakończona
3.	7014.2.2011	Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu ul. Piaskowa i Przy Lesie – kontynuacja z roku 2011	Uchwała NR IV/17/11 RG Sicienko z dnia 23.02.2011r. z póź. zm.	2011 2012 2013 2014	-	5.458,13 46.298,87 8.800,00 5.200,00 Razem: 65.757,00	I – 7/11	Oświetlenie Osówek I etap II etap III etap Inwestycja przeniesiona na lata następne

4.	7014.7.2012	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	Uchwała NR XIII/95/12 RG Sicienko z dnia 29 lutego 2012r.	2012 2013 2014	2014	16.359,00 4.797,00 362.755,78 Razem: 383.911,78	I – 3/12	Dokumentacja techniczna Studium wykonalności Roboty budowlano - montażowe Inwestycja zakończona
5.	7014.17.2012	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Trzuszczyn – Strzelce Dolne w miejscowości Wojnowo	Uchwała NR XII/89/11 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2011r.	2012 2013 2014	2014	17.198,00 0,00 1.025.222,25 Razem: 1.042.420,25	I-10/12	Dokumentacja techniczna Roboty budowlano - montażowe Inwestycja zakończona
6.	7014.3.2013	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Notecią	Uchwała NR XXI/169/12 RG Sicienko z dnia 05 grudnia 2012r	2012 2013 2014	2014	9.594,00 8.610,00 261.236,63 Razem: 279.440,63	I-11/12	Mapa do celów projektowych Dokumentacja techniczna Roboty budowlano - montażowe Inwestycja zakończona
7.	7014.2.2013	Przebudowa drogi gminnej Zielonczyn – Kruszyn	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r.	2013 2014 2015	2013 2014 2015	11.537,40 327.336,96 390.909,33 Razem: 729.783,69	I – 3/13	Dokumentacja techniczna Roboty budowlano - montażowe Inwestycja zakończona
8.	7014.15.2013	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku – ul. Poziomkowa	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r.	2013 2014	-	5.252,10 0,00 Razem: 5.252,10	I – 5/13	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
9.	7014.4.2013	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzemiętówko	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r.	2013 2014	2014	2.836,40 6.430,33 Razem: 9.266,73	I – 7/13	Dokumentacja techniczna Roboty budowlano - montażowe Inwestycja zakończona

10.	7014.7.2013	Budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r.	2013 2014	2014	5.030,70 109.972,10 Razem: 115.002,80	I – 8/13	Dokumentacja techniczna Roboty budowlano - montażowe Inwestycja zakończona
11.	7014.9.2013	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r.	2013 2014	2014	13.724,20 167.263,40 Razem: 180.987,60	I – 9/13	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na rok 2015
12.	7014.23.2013	Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul. Klonowa	Uchwała NR XXVII/203/13 RG Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r.	2013 2014	-	6.027,00 0,00 Razem: 6.027,00	I – 10/13	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
13.	7011.11.2013	Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul. Lipowa-Kasztanowa	Uchwała NR XXVII/203/13 RG Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r.	2013 2014	-	2.737,98 461.045,82 Razem: 463.783,80	I – 15/13	Dokumentacja techniczna Zakończono w 2014 roku I- etap Inwestycja przeniesiona na rok 2015
14.	7014.12.2013	Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243) –opracowanie dokumentacji	Uchwała NR XXVII/203/13 RG Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r.	2013 2014	-	9.933,90 23.179,10 Razem: 33.113,00	I – 11/13	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
15.	7014.10.2013	Przebudowa dróg gminnych w Pawłówku ul. Orzechowa, ul. Akacyjowa, cz. ul. Leśnej – opracowanie dokumentacji	Uchwała NR XXVII/203/13 RG Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r.	2013 2014	-	28.178,93 0,00 Razem: 28.178,93	I – 12/13	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
16.	7011.22.2013	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie – (opracowanie dokumentacji projektowej)	Uchwała NR XXVII/203/13 RG Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r.	2013 2014	-	15.744,00 0,00 Razem: 15.744,00	I – 13/13	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne

17.	7011.19.2013	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku w ul. Jesionowej, Klonowej, Jaworowej, Grabowej i Lipowej	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r.	2013 2014	-	10.565,70 186.605,24 Razem: 197.170,94	I – 16/13	Dokumentacja techniczna Zakończono - I etap Inwestycja w zakresie II etapu przeniesiona na lata kolejne
18.	7011.17.2013	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku – ul. Wiklinowa	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r.	2013 2014	-	17.220,00 0,00 Razem: 17.220,00	I – 17/13	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
19.	7011.16.2013	Renowacja płyty i ogrodzenie boiska w Wojnowie	DT została zamówiona i sfinansowana przez GR w Wojnowie	2013 2014	-	0,00 311.139,57 Razem: 311.139,57	I – 18/13	Dokumentacja techniczna Inwestycja zakończona
20.	7011.20.2013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w Dąbrówce Nowej	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r	2013 2014	-	7.675,20 86.431,61 Razem: 94.106,81	I – 19/13	Dokumentacja techniczna Zakończono I etap Inwestycja przeniesiona na lata następne
21.	7011.18.2013	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r	2013 2014	-	29.274,00 754.082,45 Razem: 783.356,45	I – 22/13	Dokumentacja techniczna Inwestycja zakończona
22.	7014.2.2013	Rozbudowa sieci wodociągowej: a) Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszynie b) Rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłótku na dz. nr 40	1. Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r.	2013 2014	2014	8.039,37 178.837,76 Razem: 186.877,13	I - 1/13	Dokumentacja techniczna Roboty budowlane Inwestycja zakończona

Zadania inwestycyjne w roku 2014

1.	Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny w Sicieniu	Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	-	17.381,00	I – 1/14	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
2.	7011.32.2014	Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	-	10.000,00	I – 2/14	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
3.	7011.21.2014	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelewie	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	-	16.331,94	I – 3/14	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
4.	7011.18.2014	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłówku	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	-	10.391,20	I – 4/14	Dokumentacja techniczna Inwestycja przeniesiona na lata następne
5.	Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny w Sicieniu	Zakup koparko-ladowarki na potrzeby gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej dla mieszkańców Gminy Sicienko	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	2014	286.078,32	I – 5/14	Inwestycja zakończona
6.	Zadanie realizowane przez referat GKOŚiR	Zakup nieruchomości w Dąbrówce Nowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	-	127.035,88	I – 6/14	Inwestycja przeniesiona na lata następne
7.	Zadanie realizowane przez referat GKOŚiR	Zakup nieruchomości w Teresinie pod budowę świetlicy wiejskiej	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	-	26.071,80	I – 7/14	Inwestycja przeniesiona na lata następne

8.	7011.12.2014	Budowa oświetlenia ulicznego - realizowanego w roku 2014	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	2014	101.908,84	I - 5/14 a - f	Inwestycja zakończona
9.	Zadanie realizowane przez BOSS	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	2014	1.000.192,79	NP	Inwestycja przeniesiona na rok 2015
Zadania nieinwestycyjne wykonane w roku 2014								
1.	Zadanie realizowane przez Referat GKOŚiR	Remont cząstkowy dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni bitumicznej.	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	2014	94.587,00	ZN – 1/14	Zadanie zakończone
2.	Zadanie realizowane przez Referat IR	Budowa oświetlenia ulicznego – podwieszenia	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	2014	22.946,82	ZN – 2/12	Zadanie zakończone
3.	Zadanie realizowane przez Powiat Bydgoski	Budowa zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej nr 1527C w Trzemiętowie	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	2014	82.999,17	ZN – 3/14	Zadanie zakończone
4.	Zadanie realizowane przez Powiat Bydgoski	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goncarzewy	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	2014	122.494,35	ZN – 4/14	Zadanie zakończone

5.	7011.17.2014	Remont poprzez powierzchniowe utwardzenie odcinka drogi nr 50318C w Wierzchucinku	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienka z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	2014	139.917,00	ZN – 5/14	Zadanie zakończone
6.	7011.20.2014	Budowa ogrodzenia wokół boiska w Samsiecznie	Uchwała NR XXXII/257/13 RG Sicienka z dnia 30 grudnia 2013r.	2014	2014	14.760,00	ZN – 6/14	Zadanie zakończone
7.	7011.2.2014	Remont mostu na Kanale Bydgoskim w Kruszyńcu	Uchwała NR XXII/176/12 RG Sicienka z dnia 28 grudnia 2012r	2013	2014	12.669,00 227.458,73 Razem: 240.127,73	ZN – 8/13	Dokumentacja techniczna Zadanie zakończone
8.	Zadanie realizowane przez powiat bydgoski	Remont chodnika w Sicienku	Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego	2014	2014	39.174,04	ZN – 7/14	Zadanie zakończone
9.	Zadanie realizowane przez powiat bydgoski	Wykonanie nakładek bitumicznych z mieszanki mineralno – asfaltowej na drogach powiatowych na terenie gminy Sicienka	Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego	2014	2014	390.180,06	ZN – 8/14	Zadanie zakończone

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

INWESTYCJE PRZENIESIONE NA ROK 2015

INWESTYCJE NIE REALIZOWANE w roku 2014

ZADANIA NIEINWESTYCYJNE w roku 2014

Rozdział 1. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej.

1. Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez:

1.1 Rozbudowę sieci wodociągowej w PawłóWKu

1.2 Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszyńie

1.3 Wykonanie dokumentacji projektowej na:

1.1.1 Budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu

1.1.2 Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszyńie

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Sieć wodociągowa Ø 116 mm	mb	437,30
2.	Sieć wodociągowa Ø 110 mm	mb	128,15
3.	Sieć wodociągowa Ø 90 mm	mb	191,90
4.	Sieć wodociągowa Ø 63 mm	mb	4,00
5.	Przylączy wodociągowe	mb	168,30
5.	Dokumentacja techniczna	kpl.	2

3. Wartość całkowita zakończonych inwestycji

- 214.258,13 zł

3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2014

- 206.218,76 zł

3.1.1 Środki finansowe z budżetu Gminy

- 206.218,76 zł

3.1.2 Środki pozabudżetowe

- 0,00 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

<i>Budżet Gminy</i>	<i>Środki pozabudżetowe</i>
206.218,76 zł	0,00 zł
100 %	0,0 %

1.1 Rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłówku i Kruszynie**Rozbudowa sieci wodociągowej poprzez:**

- ❖ Rozbudowę sieci wodociągowej w Pawłówku,
- ❖ Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszynie.

Wykonawcą robót był:

Zakład Komunalny
w Sicienku
ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienko

**Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe
178.837,76 zł**



Przełożenie sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Kruszynie

Efekt rzeczowy inwestycji**1. Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ulicy Leśnej w Kruszynie:**

- sieć wodociągowa o śr. Ø 160 mm - 437,30 mb.
- sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm - 89,05 mb.
- sieć wodociągowa o śr. Ø 63 mm - 4,00 mb.
- przyłącze wodociągowe o śr. Ø 50 mm - 25,55 mb.
- przyłącze wodociągowe o śr. Ø 40mm - 60,55 mb.
- przyłącze wodociągowe o śr. Ø32 mm - 82,20 mb.

2. Sieć wodociągowa na działkach nr 32 (ul. Orzechowa), 40/2 i 40/27 (ul. Dębowa) w miejscowości Pawłówek:

- sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm - 128,15 mb.
- sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm - 102,85 mb.

1.3 Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszyńnie

Założenia przedprojektowe Założeniem przedprojektowym jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, która będzie obsługiwać ulice Ogrodową, Zbożową i Bratkową w Kruszyńnie. Budowa sieci wodociągowej umożliwi zaopatrzenie w wodę mieszkańców posesji zlokalizowanych wzdłuż w/w ulic. Inwestycja ma na celu wyeliminowanie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej azbestowo cementowej, a także połączenie sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej z siecią wodociagową w ul. Leśnej w Kruszyńnie oraz dzięki zwiększenia średnicy rurociągu poprawi zaopatrzenie w wodę południowej części Kruszyńna.	Przebieg inwestycji <u>Autor dokumentacji projektowej:</u> APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła Wartość końcowa zadania 10.000,00 zł
Efekt rzeczowy inwestycji Dokumentacja techniczna i kosztorys inwestorski	

Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita	Budżet Gminy	Środki pozabudżetowe
10.000,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

APIS 	Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej ul. Kondratowicza 6, 64-920 PIŁA tel. (67) 212-00-88 fax: (67) 353-30-54 NIP: 754-040-47-31 REGON 302055891
--	--

Piła, listopad 2014 r.

PROJEKT BUDOWLANY
branży sanitarnej

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyń

INWESTOR:
Nazwa: Gmina Sicienko
Adres: ul. Mrońska 9, 88-014 Sicienko

OBIEKT BUDOWLANY:
Nazwa: Sieć wodociągowa rozdzielcza
Adres: ulice Ogrodowa, Zbożowa, Bratkowa w Kruszyńnie;
działki ewidencyjne nr 36, 86, 280/14, 281 obręb Kruszyń;
Jednostka ewidencyjna – Sicienko

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
Funkcja	Nazwisko i imię	Numer i zakres uprawnień budowlanych	Data i podpis
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Rodziewicz	Upoważnienie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i sanitarnych nr WKPS 143/PO05/12	listopad 2014 r.
Sprawdzający:	mgr inż. Helena Rodziewicz	Upoważnienie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i sanitarnych nr WKPS 114/PO05/06	listopad 2014 r.

Rozdział 2. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury kanalizacyjnej.

1. Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienka – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Notecią

1.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku w ul. Jesionowej, Klonowej, Jaworowej, Grabowej i Lipowej

1.3 Wykonanie dokumentacji technicznej na:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

1.1.2 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Strzelewie

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych w 2014r. inwestycji:

Lp.	Efekt rzeczowy inwestycji	Jedn.	Ilość
1.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV o śr. 315 mm	mb	5,00
2.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV o śr. 200 mm	mb	588,50
3.	Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o śr. 75 mm	mb	1626,00
4.	Przykanaliki sanitarne z rur PCV o śr. 160/4,7 mm	mb/ szt.	156,00/ 29
5.	Studnie rewizyjne betonowe Ø 1200	szt.	23
6.	Przepompownia ścieków Ø 1500	kpl.	1
7.	Przepływomierz ścieków Ø 1500	kpl.	1
8.	Linia kablowa zasilająca przepompownię ścieków	kpl.	1

3. Wartość całkowita zakończonych w 2014 roku inwestycji - **689.675,11 zł**

3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2014 - 631.437,21 zł

3.1.1 Środki finansowe z budżetu gminy 2014 - 405.511,21 zł

3.1.2 Środki pozabudżetowe w roku 2014 - 225.926,00 zł


w tym:

- dotacja z UE / PROW - 225.926,00 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji w roku 2014:

<i>War. całkowita</i>	<i>Koszty w roku 2014</i>		
	<i>Całkowita</i>	<i>Budżet Gminy</i>	<i>Dotacja z UE/PROW</i>
689.675,11	631.437,21	405.511,21	225.926,00
100 %	100 %	64,20 %	35,80 %

Wykres przedstawiający procentowy udział finansowy w roku 2014:

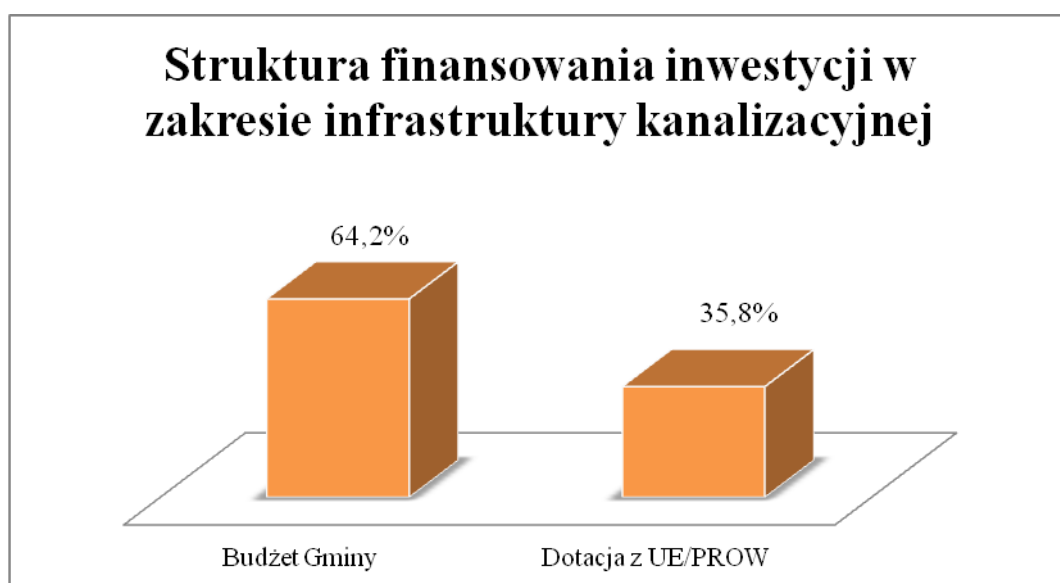

2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Notecią

<u>Wykonawca robót:</u> Zakład Robót Inżynieryjno-Hyrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna ul. Gnieźnieńska 51; 62-100 Wągrowiec	Wartość końcowa zadania 279.440,63 zł
 Sieć kanalizacji sanitarnej w Teresinie (Przepompownia ścieków)	
Wybudowano: ❖ Kanalizację sanitarną tłoczną PE80 PN8 SDR17 Ø 75 mm - 1626 mb. ❖ Kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC Ø 315 mm - 5 mb. ❖ Studnie pomiarową Ø 1500 mm wraz z elektromagnetycznym przepływomierzem - 1 kpl. ❖ Przepompownie ścieków Ø 1500 mm - 1 kpl. ❖ Zasilanie elektryczne do obiektu przepompowni i studni pomiarowej - 1 kpl.	 Studnia pomiarowa

Struktura finansowania inwestycji:


Wartość całkowita	Budżet Gminy	Dofinansowanie z UE/PROW
279.440,63 zł	53.511,63 zł	225.929,00 zł
100 %	19,1 %	80,9 %

2.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w Sicienکو w ul. Jesionowej, Klonowej, Jaworowej, Grabowej i Lipowej

<u>Wykonawca robót :</u> Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j. ul. Szosa Kotomierska 17 86-010 Koronowo	Wartość końcowa zadania 197.170,94 zł
Sieć kanalizacji grawitacyjnej w Sicienکو	
Kanalizacja sanitarna w Sicienکو w ul. Jesionowej, Klonowej, Jaworowej, Grabowej i Lipowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości – I etap, w skład której wchodzi: ❖ Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm - 588,5 mb. ❖ Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC 160 mm - 156 mb - 29 szt. ❖ Studnie rewizyjne z kręgów betowych śred. 1200 mm - 23 szt.	Sieć kanalizacji grawitacyjnej w Sicienکو na ul. Grabowej

Struktura finansowania inwestycji:

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
197.170,94 zł	186.605,24 zł
100 %	100 %



2.3.2 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Strzelewie

Miejscowość jest na dzisiaj skanalizowana. Jednak istniejąca kanalizacja sanitarna (wybudowana na początku lat 70 tych XX wieku) jest już zużyta, nieszczelna, częściowo niedrożna i wymaga ciągłych napraw. Ścieki sanitarne systemem grawitacyjnym spływają do istniejącej przepompowni ścieków (wybudowanej w roku 2006) skąd kolektorem tłoczonym odprowadzane są do oczyszczalni ścieków. Założeniem Gminy jest wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej przy założeniu, że: zostaną do niej przyłączone wszystkie istniejące budynki, obecnie przyłączone do sieci kanalizacyjnej, wszystkie ścieki tak jak obecnie - grawitacyjnie zostaną sprowadzone do istniejącej przepompowni ścieków, w miarę możliwości zostaną wykorzystane istniejące odcinki sieci kanalizacyjnej.	Przebieg inwestycji Autor dokumentacji projektowej: HYDROTERM ul. Skalarowa 16/13 85-436 Bydgoszcz Założenia przedprojektowe Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Strzelewo gmina Sicienko”	
Efekt rzeczowy inwestycji Dokumentacja techniczna i kosztorys inwestorski	Wartość końcowa zadania 16.331,94 zł	
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita	Budżet Gminy	Środki pozabudżetowe
16.331,94 zł	16.331,94 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

Rozdział 3. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy i remontu dróg.

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

- 1.1 Remont częściowy dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni bitumicznej
- 1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 50303C w Kruszynie - ul. Leśnej - II etap
- 1.3 Przebudowa drogi gminnej Zielonczyn - Kruszyn
- 1.4 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Tryszczyn - Strzelce Dolne w miejscowości Wojnowo
- 1.5 Przebudowa dróg gminnych w Sicienku - ul. Lipowa - I etap
- 1.6 Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach (opracowanie dokumentacji)
- 1.7 Budowa chodnika w ciągu drogi nr wojewódzkiej nr 244 w Dąbrówce Nowej
- 1.8 Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz.
- 1.9 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych
- 1.10 Remont mostu na Kanale Bydgoskim w miejscowości Kruszyniec
- 1.11 Zakup kruszywa do remontu dróg
- 1.12 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchucinek
- 1.13 Budowa zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej w miejscowości Goncarzewy
- 1.14 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goncarzewy
- 1.15 Naprawa chodnika przy drodze powiatowej w Sicienku

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Nowe odcinki dróg o nawierzchni twardej	mb	2956,60
2.	Chodniki z brukowej kostki betonowej	m ²	3856,15
3.	Remonty częściowe dróg gminnych	kpl.	1
4.	Remonty częściowe dróg powiatowych	kpl.	1
5.	Wyremontowany most	kpl.	1
6.	Ścieżka rowerowa	km	4,82
7.	Wiąta autobusowa wraz z zatoką autobusową	szt.	1
8.	Dokumentacja techniczna	kpl.	1
9.	Zakup kruszywa	tona	2 900,00


3. Wartość zakończonych inwestycji: - 5.116.930,92 zł

- | | |
|--|-------------------|
| 3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2014 | - 4.526.026,41 zł |
| 3.1.1 Środki finansowe z Budżetu gminy | - 2.327.510,36 zł |
| 3.1.2 Środki pozabudżetowe | - 2.198.516,05 zł |
| - środki powiatu bydgoskiego | - 1.290.336,80 zł |
| - środki Marszałka Województwa w ramach FOGR | - 28.600,00 zł |
| - środki Zarządu Dróg Wojewódzkich | - 879.579,25 zł |

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie remontu i budowy dróg w roku 2014			
<i>Budżet Gminy</i>	<i>Powiat Bydgoski</i>	<i>Marszałek Województwa</i>	<i>ZDW w Bydgoszczy</i>
2.327.510,36 zł	1.290.336,80 zł	28.600,00 zł	879.579,25 zł
51,4 %	28,5 %	0,6 %	19,5 %

Wykres przedstawiający procentowy udział finansowy:

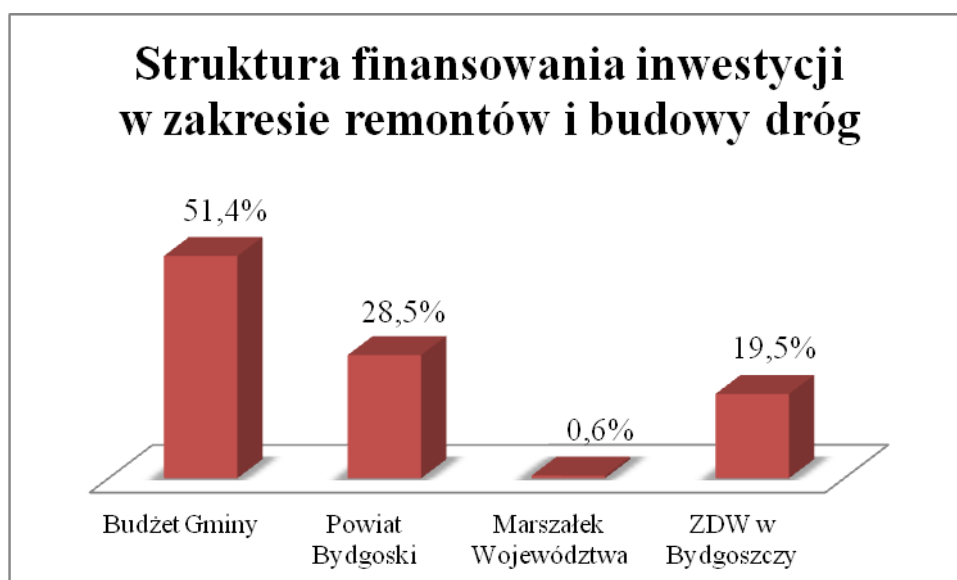

3.1 Remonty cząstkowe dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni bitumicznej

Wykonano:

Remont cząstkowy techniką sprysku lepiszczem i posypania kruszywem wyboje do głębokości:

- 2 cm - o pow. **200 m²**,
- 3 cm - o pow. **500 m²**
- Razem: 700 m².**

Remont masą z otaczarki z frezowaniem i zagęszczeniem, wyboje o głębokości:

- powyżej 3 cm - o pow. **1000 m²**.

Razem: 1700 m².

Wykonawcą robót był:

Zakład Usług Drogowych

Marek Smorczyński

Olsza 3, 88-300 Mogilno



Wartość końcowa zadania – 94.587,00 zł

Struktura finansowa zadania

Wartość całkowita	Powiat Bydgoski	Budżet Gminy
94.587,00	56.752,20	37.834,80
100 %	60 %	40 %

3.2 Przebudowa drogi gminnej nr 50303C w Kruszynie - ul. Leśna - II etap

Wykonawca robót:

EURO-SYSTEM Łukasz Rosochowicz
ul. Mickiewicza 100
87-100 Toruń



Stan drogi przed przebudową

Zakres przebudowy obejmuje:

- ✚ wykonanie robót ziemnych,
- ✚ wykonanie nawierzchni,
- ✚ wykonanie zjazdów,
- ✚ wykonanie pobocza,
- ✚ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wartość końcowa zadania

654.678,07 zł

Efekt rzeczowy inwestycji

- ✚ Nawierzchnia drogi z brukowej kostki beton. 8 cm – 2 937 m².
- ✚ Ściek korytkowy z brukowej kostki beton. gr. 6 cm – 165 m².
- ✚ Próg zwalniający z brukowej kostki beton. gr. 8 cm wraz z słupkami przeszkodowymi U-12c – 74/5 m²/szt.
- ✚ Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 380 m².
- ✚ Humusowanie wraz z obsianiem trawą – 1 111 m².
- ✚ Oznakowanie pionowe – 31 szt.
- ✚ Oznakowanie poziome – 11,6 kpl.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
654.678,07 zł	545.708,37 zł
100 %	100 %



Przebudowana droga gminna ul. Leśna w Kruszynie



Przebudowana droga gminna ul. Leśna w Kruszynie

3.3 Przebudowa drogi gminnej Kruszyn-Zielonczyn - ul. Morenowa w Zielonczynie**Założenia przedprojektowe**

Przedsięwzięcie realizowane jest ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi. Deformacja drogi powoduje wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, degradację nawierzchni, pogorszenie klimatu akustycznego poprzez uderzenia kołami pojazdów o nierówności nawierzchni oraz pylenie nawierzchni.

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„AFFABRE” Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 1
85-727 Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji

- ✚ Nawierzchnia drogi z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - 2 886 m²,
- ✚ Ściek korytkowy z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm - 153 m²,
- ✚ Próg zwalniający z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z słupkami przeszkodowymi U-12c - 63/6 m²/szt.
- ✚ Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - 345 m²,
- ✚ Ściana oporowa typu L - 30 mb,
- ✚ Brukowanie skarp, przekopów i nasypów - 1 kpl.,
- ✚ Poręcze ochronne - 12 mb,
- ✚ Studzienka ściekowa uliczna - 1 szt.
- ✚ Rów chłonny - 1 kpl.
- ✚ Humusowanie wraz z obsianiem trawą - 1 kpl.
- ✚ Oznakowanie pionowe - 43 szt.
- ✚ Oznakowanie poziome - 10,672 m².
- ✚ Bariery drogowe ochronne o długości 68 mb.

Wartość końcowa zadania 729.783,69 zł

Struktura finansowania inwestycji:

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
729.783,96 zł	Zapłacono w 2014: 327.336,96 zł 718.246,29 zł
100 %	100 %



Droga w Zielonczynie przed przebudową - ul. Morenowa



Droga w Zielonczynie po przebudowie - ul. Morenowa

3.4 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Trzyczyn - Strzelce Dolne w miejscowości Wojnowo

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA S.A
Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

Efekt rzeczowy inwestycji

Przebudowana droga wojewódzka nr 244 Kamieniec-Trzyczyn-Strzelce Dolne w miejscowości Wojnowo od km 6+274 do km 6+960 o długości 0,686 km, w skład której wchodzi:

- ✚ Nawierzchnia bitumiczna - 5258,8 m²,
- ✚ Chodniki z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm - 2709,3 m²,
- ✚ Nawierzchnie z brukowca, kamień obrobiony - 35 m²,
- ✚ Azyle z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm - 46 m²,
- ✚ Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - 225,3 m²,
- ✚ Zatoki autobusowe - 2 szt.
- ✚ Humusowanie wraz z obsianiem trawą - 1 kpl.
- ✚ Oznakowanie pionowe - 74 szt.
- ✚ Oznakowanie poziome - 351,20 m².
- ✚ Kanalizacja deszczowa - 1 kpl.

Wartość końcowa zadania

1.042.420,25 zł



Przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 244 w Wojnowie

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita całej inwestycji	Budżet Gminy w 2014r.	Zarząd Dróg Wojewódzkich
1.042.420,25 zł	145.643,00 zł	879.579,25 zł
100 %	14,20 %	85,80 %

3.5 Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa w Sicieniu - I etap

Wartość końcowa zadania w roku 2014: 461.045,82 zł Wykonane przy udziale środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sicienko w kwocie 10.000,00 zł	<u>Wykonawca robót:</u> DROMAKS Piotr Myszkier ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz
Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
463.783,80 zł	461.045,82 zł
100 %	100 %



Przebudowana droga gminna ul. Lipowa w Sicieniu

Efekt rzeczowy inwestycji:

Przebudowano odcinek ul. Lipowej od km 0+000 do km 0+475, w skład którego wchodzi:

- ✚ Nowa nawierzchnia drogi z brukowej kostki beton. 8 cm – 2 551 m².
- ✚ Ściek korytkowy z brukowej kostki beton. gr. 6 cm – 67 – m².
- ✚ Próg zwalniający z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z słupkami przeszkodowymi U12c - 44/3 m²/szt.
- ✚ Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 286 m².
- ✚ Humusowanie wraz z obsianiem trawą – 1 442,5 m².
- ✚ Oznakowanie pionowe – 9 szt.
- ✚ Oznakowanie poziome – 6,96 m².



Nowa nawierzchnia na ul. Lipowej w Sicienku

3.6 Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243)

Wykonawca dokumentacji technicznej:

Doradztwo i projektowanie drogowe
Kazimierz Chojnacki
ul. Wyspowa 15, 85-435 Bydgoszcz

Wartość końcowa zadania

33.113,00 zł

Efekt rzeczowy zadania

Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim, podział nieruchomości oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Struktura finansowa zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014	Środki pozabudżetowe
33.113,00	23.179,10	0,00
100 %	100 %	0,0 %

STAROSTWO
WN.673.21.2014

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11a ust. 1 i 3, art. 11f, art. 11i, 12 ust. 1-4, 4e-f, art. 16 i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 i 14), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 i 14.)

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Sicienka z dnia 10.09.2014r., wpływ do Starostwa Bydgoskiego w dniu 15.09.2014r., skierowanego w dniu 16.10.2014r.,

semp. w dniu 9.12.2014

zawierającym projekt budowlany, podział nieruchomości

i zezwolenie

Wójta Gminy Sicienka

na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Wierzchucinek-Dąbrowice nr 503001 C, na odcinku od km 0+600 do km 2+013,96 gmina Sicienka

Inwestycja będzie realizowana w obszarze ewidencyjnym Wierzchucinek, w jednostce ewidencyjnej Sicienka na działkach:

- nr 34 o pow. 2,6700 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 23558, stanowiącej własność Gminy Sicienka (wg ewidencji gruntów i budynków),
- nr 19 o pow. 1,3400 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 23558, stanowiącej własność Gminy Sicienka (wg ewidencji gruntów i budynków),
- nr 16/8 o pow. 0,0439 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 24525, stanowiącej własność Gminy Sicienka (wg ewidencji gruntów i budynków),
- nr 16/6 o pow. 0,0174 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 14478, stanowiącej własność Pani Zuzanny Pochowskiej i Pana Piotra Pochowskiego (wg ewidencji gruntów i budynków),
- nr 25 o pow. 0,1100 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 12516, Gmina Sicienka władająca na zasadach samostanowienia (wg ewidencji gruntów i budynków),
- nr 15 o pow. 0,0500 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 23558, stanowiącej własność Gminy Sicienka (wg ewidencji gruntów i budynków),
- nr 17/1 o pow. 0,0157 ha, wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 17 o pow. 0,1111 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 15015, stanowiącej własność Pana Henryka Borowicza i Pani Marii Borowicz (wg ewidencji gruntów i budynków),
- nr 16/10 o pow. 0,0982 ha, wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 16/9 o pow. 1,688 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 16716, stanowiącej własność Pana Grzegorza Pochowskiego i Pani Anny Pochowskiej (wg ewidencji gruntów i budynków),
- nr 27/12 o pow. 0,0440 ha, wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 27/11 o pow. 2,2127 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 14066, stanowiącej własność Pana Jana Pochowskiego (wg ewidencji gruntów i budynków),
- nr 16/12 o pow. 0,0121 ha, wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 16/1 o pow. 0,4340 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 14479, stanowiącej własność Pani Joanny Wysockiej (wg ewidencji gruntów i budynków),
- nr 16/14 o pow. 0,0027 ha, wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 16/1 o pow. 1,7593 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 16397, stanowiącej własność Pani Stanisławy Granki i Pana Piotra Granki (wg ewidencji gruntów i budynków),
- nr 14/1 o pow. 0,0925 ha, wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 14 o pow. 1,0516 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 20042, stanowiącej własność Pana Józefa Zimnickiego i Pani Renaty Zimnickiej (wg ewidencji gruntów i budynków),
- nr 22/8 o pow. 0,0185 ha, wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 22/1 o pow. 0,8746 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 20042, stanowiącej własność Pana Józefa Zimnickiego i Pani Renaty Zimnickiej (wg ewidencji gruntów i budynków),

administracyjnego wyniku, że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wnioskodawcy lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.



Z up. Starosty Bydgoskiego
[Podpis]
(początek i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)

POUCZENIE:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta gwarantującego należyte nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
 - oświadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzające opłacenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierownika budowy (robotami budowlаными), a także zastrzeżenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
 - w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pilnowania nadzoru inwestorskiego nad dziełami robotami budowlаными, a także zastrzeżenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
 - informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane
2. Inwestor może przysiąc do użytkownika obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkownika obiektu można przysiąc po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wyznaczenie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

OTRZYMUJĄ:

1. Wójt Gminy Sicienka
 2. ul. Mosteczka 9, 85-014 Sicienka - 2 egz. decyzji (zał. 2 egz. proj. bud., projekty podziału)
 3. a/s (zał. 1 egz. proj. bud. + proj. podziału)
- DO WŁAŚCICIELI:
1. PNI ul. Żygmunt Augusta 16, 85-002 Bydgoszcz (zał. 1 egz. - proj. bud.)
 2. Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (1 egz. decyzji)
 3. Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
 4. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GRUNTMIAR” s.c.
 5. Z. Łaniecki, K. Górski
 6. ul. Sobieskiego 6, 85-060 Bydgoszcz
 7. Sąd Rejonowy w Nale i Noteciu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 8. ul. Sadowa 3, 85-100 Nakło nad Notecią
 9. B.R. i M.W.

Decyzja niniejsza jest ostateczna
z dnia 10.12.2014
Bydgoszcz, dnia 10.12.2014

10

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

3.7 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w Dąbrówce Nowej - I etap

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 244 przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Brak utwardzonego chodnika stanowi duże zagrożenie dla pieszych. Na wymienionym odcinku piesi poruszają się po jezdni lub po poboczu gruntowym, które posiada liczne deformacje w przekroju poprzecznym i podłużnym. Brak nawierzchni utwardzonej powoduje trudności w poruszaniu się pieszych

Wykonawcą robót było:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX
Kamilla Smolińska
ul. Żeglarska 123; 85-545 Bydgoszcz

Wartość końcowa zadania – 94.106,81 zł

Struktura finansowa zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w 2014r.	Środki pozabudżetowe
94.106,81	86.431,61	0,00
100 %	100 %	0,0 %

Efekt rzeczowy inwestycji:

-  Chodnik z brukowej kostki betonowej szarej gr. 6 cm - 297 m²,
-  Zjazdy z brukowej kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm - 170 m²,
-  Humusowanie skarp z obsianiem trawą - 152 m²,
-  Oznakowanie pionowe - 4 szt.
-  Oznakowanie poziome - 10 m².



Chodnik w Dąbrowce Nowej



Chodnik w Dąbrowce Nowej

3.8 Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz

Efekt rzeczowy inwestycji:



Ścieżka rowerowa w granicach administracyjnych gminy Sicienko: od granicy administracyjnej Miasta Bydgoszcz wzdłuż drogi krajowej nr 25 do drogi gruntowej prowadzącej do ulicy Meysnera i na odcinku 579 metrów wzdłuż drogi gruntowej - łączna długość **2,85 km**.

Ścieżka rowerowa w granicach administracyjnych gminy Sicienko wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku od drogi gruntowej prowadzącej do ulicy Meysnera do granicy Gminy Koronowo - łączna długość **1,97 km**.

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne
„KOMPLEX-BUD”
Tadeusz Radwan
Droga do Różany, 86-010 Koronowo

Wartość końcowa zadania
783.356,45 zł.

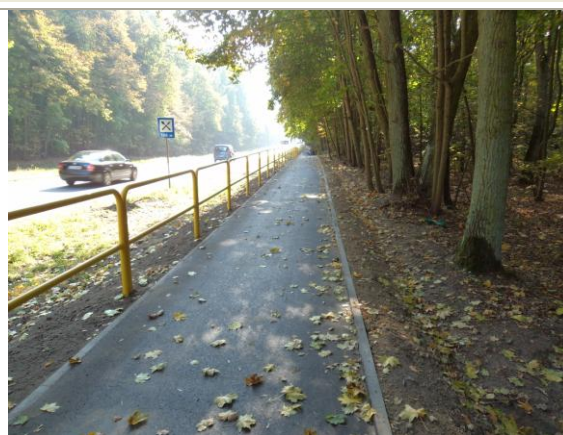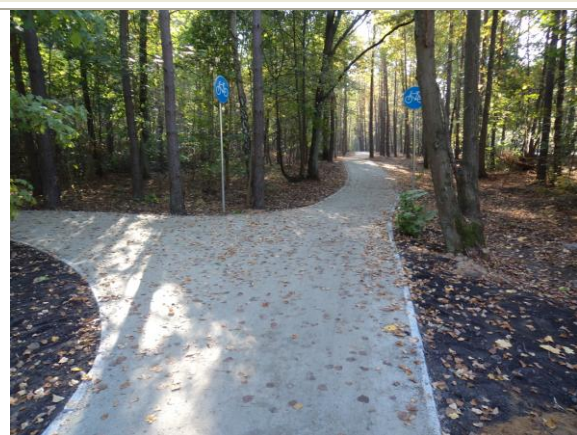

Struktura finansowa zadania

Wartość całkowita zadania	Koszty przedsięwzięcia w zakresie roku 2014		
	Wartość zadania w 2014r.	Gmina	Powiat
783.356,45 zł	754.082,45 zł	60.078,07 zł	694.004,38 zł
100 %	100 %	8,0 %	92 %

3.9 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych



Nakładka bitumiczna na odcinku drogi powiatowej
Ugoda - Strzelewo

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

**Zadanie realizowane przez Wydział
Dróg Powiatowych Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy**

Efekt rzeczowy inwestycji

Wykonano nakładki bitumiczne na drogach:

- ✚ Droga powiatowa nr 1504 C Popielewo - Słupowo - 540 mb.
- ✚ Droga powiatowa nr 1532 C Ugoda - Strzelewo - 840 mb.
- ✚ Droga powiatowa nr 1533 C Sitno - Zawada - 180 mb

**Wartość końcowa zadania
390.180,06 zł**



Nakładka bitumiczna na odcinku drogi powiatowej
Ugoda - Strzelewo



Nakładka bitumiczna na odcinku drogi
powiatowej Sitno - Zawada

Wartość całkowita	Powiat
390.180,06 zł	390.180,06 zł
100 %	100 %

Struktura finansowa zadania

3.10 Remont mostu na Kanale Bydgoskim w Kruszyńcu

Założenia przedprojektowe	Przebieg inwestycji
Most na kanale Bydgoskim w Kruszyńcu znajdujący w ciągu drogi gminnej z Kruszyńca na łąki jest w złym stanie technicznym. Została zarwana drewniana jezdnia co uniemożliwia korzystanie z tego obiektu i został on wyłączony z ruchu. Z tego względu podjęto decyzję wykonania remontu mostu.	<u>Wykonawca robót:</u> INWESTYCJA, Adam Humienny Grabowiec ul. Dębowa 2, 87-162 Lubicz
Efekt rzeczowy inwestycji Przeprowadzono remont mostu w następującym zakresie: ✚ Wykonano nowe powłoki antykorozyjne na wszystkich elementach stalowych mostu, ✚ Wykonano nowe elementy drewniane pomostu z drewna litego iglastego, ✚ Wykonano renowację ceglanych ścian przyczółków, ✚ Zamontowano brakujące poręcze ochronne mostu w strefie przyczółków mostu, ✚ Uzupełniono umocnienia brzegowe z płyt betonowych o grubości 20 cm w miejscach brakujących umocnień, ✚ Umocniono brukiem kamiennym strefy za ścianą przyczółka, ✚ Wykonano nawierzchnie z kostki kamiennej na dojazdach do mostu, ✚ Wykonano nawierzchnie nieulepszoną z kruszyna łamanego na dojazdach do mostu, ✚ Wykonano oznakowanie pionowe i wprowadzono stałą organizację ruchu.	Wartość końcowa zadania 240.127,73 zł.
	 Wyremontowany most
	 Przyczółki i umocniony brzeg kanału

Struktura finansowa zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
240.127,73 zł	227.458,73 zł
100 %	100 %



Wyremontowany most na Kanale Bydgoskim



Wyremontowany most na Kanale Bydgoskim

3.11 Zakup kruszywa do remontu dróg

Cel zadania

Celem działania jest dokonanie zakupu kruszywa kamiennego w ilości niezbędnej (z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy) do bieżącego na przestrzeni roku remontu dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy. Tłuczeń na drogi dowożony jest transportem samochodowym gdzie następnie Zakład Komunalny z wykorzystaniem równiarki drogowej i walca dokonuje jego rozłożenia na nawierzchni drogi.



Wartość zakupu kruszywa w 2014r.

206.209,50 zł.

Efekt rzeczowy przedsięwzięcia

- ❖ Zakup kruszywa granitowego – 2400 ton,
- ❖ Zakup rozdrobnionego gruzu ceglano - budowlanego – 500 ton.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkow.	Budżet Gminy
206.209,50	206.209,50
100 %	100 %



Gruz ceglano-budowlany

3.12 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchucinek



Przebudowana droga w Wierzchucinku

Wykonawca robót:

Zakład Usług Drogowych
Marek Smorczyński
Olsza 3
88-300 Mogilno

Wartość końcowa zadania
139.917,00 zł.

Założenia przedprojektowe


Odcinek drogi przebiega przez tereny rolne w terenie niezabudowanym. Na drodze występuje ruch lokalny o małym natężeniu. Przedmiotowy odcinek jest w pełni dostępny z przyległego terenu poprzez zjazdy na pola i do posesji. Obecnie droga posiada nawierzchnię ulepszoną kruszywem niezwiązanym o szerokości 4,00 - 5,00 m w złym stanie technicznym wymagającym wykonania systematycznych napraw. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni ulepszonej o szerokości 5,00 m i ulepszenie zjazdów istniejących.



Przebudowana droga w Wierzchucinku

Efekt rzeczowy inwestycji

- ✚ Powierzchniowe podwójne utwardzenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysem kamiennym - 2.308 m².
- ✚ Oznakowanie pionowe - 6 szt.

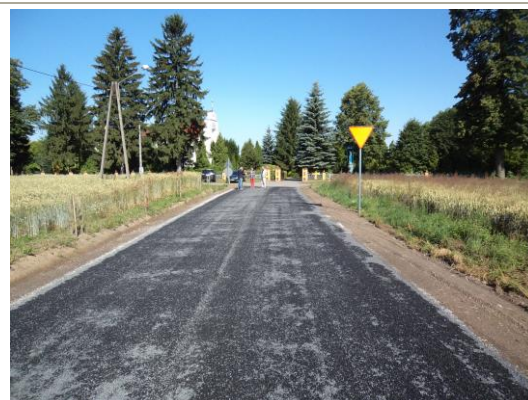

Przebudowana droga w Wierzchucinku

Struktura finansowa zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy	FOGR
139.917,00 zł	111.317,00 zł	28.600,00
100 %	79,6 %	20,4 %

3.13 Budowa zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej nr 1527C w Trzemiętowie

Założenia przedprojektowe

Projektowana zatoka autobusowa zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr 1527C Prosperowo – Wojnowo w Trzemiętowie, gmina Sicienکو, pomiędzy skrzyżowaniami do miejscowości Trzemiętówکو. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną, podobnie jak ścieżka rowerowa zlokalizowana po przeciwnej stronie zatoki. Rozpatrywany odcinek znajduje się poza terenem zabudowanym. Szerokość zatoki wynosić ma 3,0 m a peronu 2,0 m. Wiatą wykonaną ma być ze stali malowanej podkładem i lakierowaną na kolor niebieski. Pokrycie dachu o wymiarach 3350x1400 mm. Ławeczka na długości wiaty z białego laminatu (lub listew drewnianych) na konstrukcji stalowej mocowana do wiaty. Osłony pionowe ze szkła hartowanego.

Wykonawca robót:

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Spółka z o.o.
ul. Glinki 148
85-861 Bydgoszcz

Wartość zadania na koniec roku 2014
82.999,17 zł



Zatoka przystankowa wraz z wiatą w Trzemiętowie

Efekt rzeczowy inwestycji

- ✚ Zatoka autobusowa wykonana z betonu cementowego C40/50 zbrojona włóknem o szerokości 3,0 m - pow. **114 m²**,
- ✚ Peron z brukowej kostki betonowej o gr. 6 cm i szerokości 2,0 m - pow. **46 m²**,
- ✚ Wiatą autobusową wykonaną ze stali malowanej podkładem i lakierowaną na kolor niebieski. Pokrycie dachu o wymiarach 3350x1400 mm wykonany z przyciemnionego poliwęglanu komórkowego. Ławeczka na całej długości wiaty z białego laminatu na konstrukcji stalowej mocowana do wiaty. Osłony pionowe ze szkła hartowanego gr. 8 mm.

**Zadanie realizowane przez Wydział
Dróg Powiatowych w Starostwie
Powiatowym w Bydgoszczy**

Struktura finansowa zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy - dotacja dla powiatu	Powiat Bydgoski
82.999,17 zł	30.000,00 zł	52.999,17 zł
100 %	36,1 %	63,9 %

3.14 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goncarzewy**Założenia przedprojektowe**

Wykonanie chodnika w m. Goncarzewy w granicach pasa drogowego od km 7+300 do km 7+628,61, o szerokości 1,40 - 2,00m, z 6 cm brukowej kostki betonowej, na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i 10 cm warstwie podsypki piaskowej z kruszywa naturalnego.



Chodnik w miejscowości Goncarzewy

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX
Kamila Smolińska
ul. Żeglarska 123, 85-545 Bydgoszcz

**Wartość zadania na koniec 2014r.
122.494,35 zł.**



Chodnik w miejscowości Goncarzewy

Efekt rzeczowy inwestycji

- ✚ Chodnik o długości 328,61 mb z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm - 475 m²,
- ✚ Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - 48 m²,
- ✚ Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą – 389 m²,
- ✚ Poręczce ochronne - 33 mb.

Struktura finansowa zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy	Powiat Bydgoski
122.494,35 zł.	46.350,00 zł.	76.144,35zł.
100 %	37,8 %	62,2 %

3.15 Naprawa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sicienko**Założenia przedprojektowe**

Wykonanie remontu chodnika na drodze powiatowej 1910C w granicach istniejącego pasa drogowego przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 1528C Trzemiętówko - Sicienko.

Przewidywany do przebudowy chodnik o szerokości 1,2-1,5m ma długość 120 m. Na odcinku 100m posiada nawierzchnię z płytek betonowych, natomiast pozostała część chodnika jest gruntowa.



Nowy chodnik

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX
Kamila Smolińska
ul. Żeglarska 123, 85-545 Bydgoszcz

**Wartość zadania na koniec 2014r.
39.174,04 zł.**



Nowy chodnik

Efekt rzeczowy inwestycji

- ✚ Chodnik o długości 137 mb z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm - o pow. 141,51 m²,
- ✚ Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - 15,34 m²,
- ✚ Humusowanie wraz z obsianiem trawą – 60,90 m².

Struktura finansowa zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy	Powiat Bydgoski
39.174,04 zł.	0,00 zł.	39.174,04 zł.
100 %	0,0 %	100 %

Rozdział 4. Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie obiektów kubaturowych.

1. Spis zrealizowanych inwestycji i remontów:

- 1.1 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie
1.2 Budowa świetlicy wiejskiej w PawłóWKu (dokumentacja techniczna)

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:


LP.	Nazwa	Jed. miary	Ilość
1.	Termomodernizacja budynku dydaktycznego	kpl.	1
2.	Termomodernizacja sali gimnastycznej	kpl.	1
3.	Dokumentacja techniczna dla budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłówek	kpl.	1

3. Wartość zrealizowanych zadań w 2014 roku: - 373.146,98 zł

3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2014 - 373.146,98 zł
3.1.1 Środki finansowe z budżetu gminy - 88.810,90 zł
3.1.2 Środki pozabudżetowe - 284.336,08 zł
- dofinansowanie z UE/RPO - 284.336,08 zł

Struktura finansowania inwestycji w zakresie obiektów kubaturowych		
Wartość całkowita	Budżet Gminy	UE/RPO
373.146,98 zł	88.810,90 zł	284.336,08 zł
100 %	23,8 %	76,2 %

Wykres przedstawiający procentowy udział finansowy

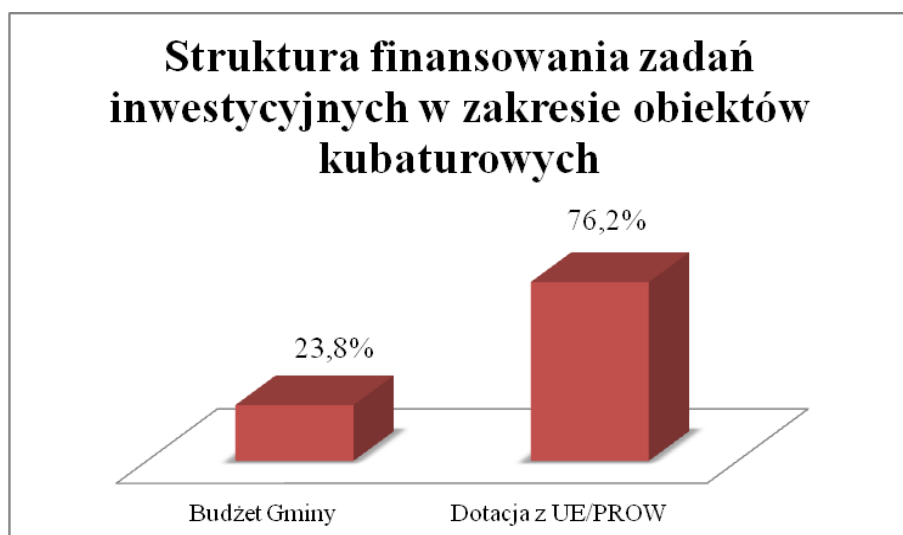

4.1 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie.

Termomodernizacja budynków Szkoły w Trzemiętowie polegać ma na:

- ✚ wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym i sali gimnastycznej,
- ✚ wykonanie termomodernizacji ścian budynków oświatowych,
- ✚ termomodernizacja stropu budynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastycznej.



W dniu 27 sierpnia 2013r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sicienko a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie zadania.

Wykonawca robót:

Firma AKORA Anita Urbańska
ul. Stawowa 7, 85-323 Bydgoszcz

**Budynek dydaktyczny****Sala gimnastyczna**

Efekt rzeczowy inwestycji w roku 2014
Termomodernizacja budynku
dydaktycznego.

Termomodernizacja sali gimnastycznej.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Koszt poniesiony w 2014r.	Dotacja z UE/RPO
383.911,78 zł	78.419,70 zł	284.336,08 zł
100 %	21,6 %	78,4 %

4.2 Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłóku

Założenia przedprojektowe

Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 107/1 w miejscowości Pawłówko - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Pawłówko

Wykonawca dokumentacji technicznej:


Projektowanie i Nadzór Budowlany
Adam Mueller Runowo Krajeńskie 2A
89-421 Runowo Krajeńskie

Wartość zadania

10.391,20 zł.

**Efekt rzeczowy inwestycji w roku 2014:**

Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim i pozwoleniem na budowę

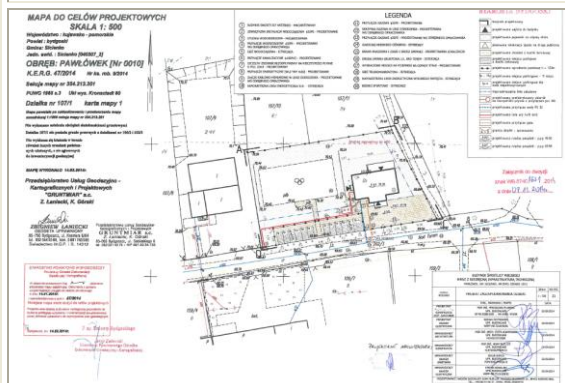**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy	Środki pozabudżetowe
10.391,20 zł	10.391,20 zł	0,00 zł
100 %	100 %	0,0 %

Rozdział 5. Inwestycyjne w zakresie sportu, turystyki i rekreacji

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

- 1.1 Budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej
- 1.2 Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie
- 1.3 Ogrodzenie boiska sportowego w Samsiecznie

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej	kpl.	1
2.	Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie	kpl.	1
3.	Ogrodzenie boiska sportowego w Samsiecznie	mb	132


3. Wartość zrealizowanych inwestycji: - 440.902,37 zł

- 3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2014 - 435.871,67 zł
 - 3.1.1 Środki finansowe z Budżetu gminy - 233.504,67 zł
 - 3.1.2 Środki pozabudżetowe - UE PROW - 202.367,00 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Wartość całkowita inwestycji	Koszty poniesione w roku 2014		
	Wartość całkowita	Budżet Gminy	Dotacja z -UE/PROW
440.902,37	435.871,67 zł	233.504,67 zł	202.367,00 zł
100 %	100 %	53,6 %	46,4 %

Wykres słupkowy obrazujący strukturę finansowania zrealizowanych zadań

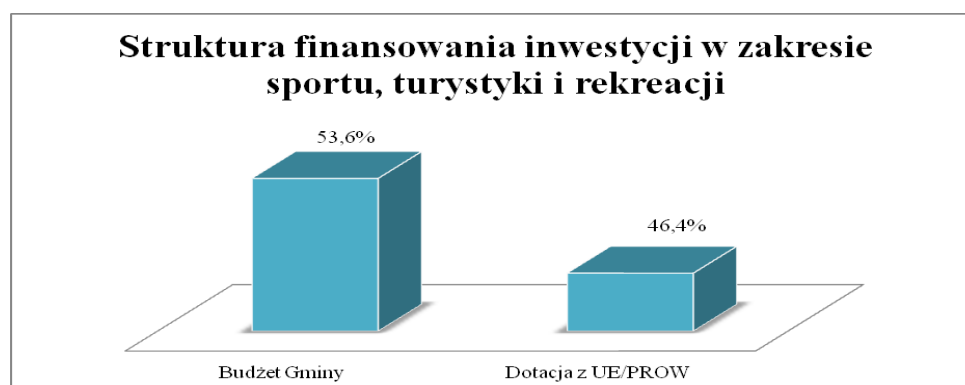

5.1 Budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej**Wykonawcą robót był:**

SPORTSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 21/23
10-508 Olsztyn

Wartość końcowa zadania**115.002,80 zł**

Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Nowej

Efekt rzeczowy inwestycji :

-  Boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 14x28 m o nawierzchni z kostki betonowej beżowej - 392 m².
-  Ogrodzenie wraz z bramą o łącznej długości 85,5 mb.
-  Bramkokozy - 1 kpl.
-  Słupki wraz z bramką do gry w siatkówkę - 1 kpl.
-  Piłkochwyty o długości 40,5 m i wysokości 4 m - 1 kpl.



Ogrodzenie boiska



Boisko wielofunkcyjne

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014	Środki pozabudżetowe
115.002,80 zł	109.972,10 zł	0,00
100 %	100 %	0,0 %

5.2 Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie

Wykonawcą robót:

Przedsiębiorstwo Usługowe, „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek
ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice

**Boisko przed renowacją****Boisko po renowacji****Efekt rzeczowy inwestycji**

- ✚ Płyta boiska o wymiarach 65,3 x 105 m o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej - 1 kpl.
- ✚ Ścieżka wzdłuż boiska o szerokości 5 m i łącznej długości 136 m oraz dojścia o szerokości 2,2 i 3,1 m i długości 6 m o nawierzchni z tłucznia granitowego - 1 kpl.
- ✚ Ogrodzenie panelowe o łącznej długości 318,2 mb na słupkach stalowych z podmurówką, o wysokości 1,5 m wraz z dwiema furtkami o szerokości 1 m - 1 kpl.
- ✚ Piłkochwyt w linii ogrodzenia o łącznej długości 132 m i wysokości 4 m - 1 kpl.
- ✚ Zestaw bramek wraz z siatkami do gry w piłkę nożną o wymiarach 7,32 x 2,44 m.

Wartość końcowa - 311.139,57 zł.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w 2014r.	Dofinansowanie z UE – PROW
311.139,57 zł	108.772,57 zł	202.367,00 zł
100 %	35,00 %	65,00 %

5.3 Ogrodzenie boiska sportowego w Samsiecznie

Założeniem przedprojektowym jest:

Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w miejscowości Samsieczno. Działka która ma zostać ogrodzona usytuowana jest obok szkoły i placu zabaw na skraju miejscowości. Działka jest ogrodzona żywopłotem od strony drogi powiatowej i częściowo od przyległej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, natomiast od strony pól uprawnych nie ma ogrodzenia. Na działce w 2013r. wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej, wyposażone w bramki i kosze do koszykówki, obok na działce szkolnej znajduje się plac zabaw. Ze względów bezpieczeństwa wymagane jest wykonanie ogrodzenia terenu boiska od strony pól.

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„EVELTOM” BIS Stefan Kokot
Perkowo ul. Wolsztyńska 16
64-234 Przemęt



Ogrodzenie boiska



Ogrodzenie boiska

Wartość końcowa zadania w 2014r.
14.760,00 zł

Zadanie finansowane w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Samsieczno w
kwocie 10.000,00 zł

Efekt rzeczowy inwestycji

Ogrodzenie systemowe - panelowe na słupkach stalowych i podmurówce. Panele ogrodzeniowe wykonane z prętów pionowych i poziomych o śr. 4 mm, oczka o wymiarze 50 x 200 mm, szerokość paneli 2500 mm o wysokości 1500 mm. Wykończenie: ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym - 132 mb.

Furtka szerokości 100 cm i wysokości 150 cm - 1 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
14.760,00 zł	14.760,00 zł
100 %	100 %

Rozdział 6 Zakupy inwestycyjne

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

- 1.1 Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej dla mieszkańców Gminy Sicienko
- 1.2 Zakup nieruchomości w Dąbrówce Nowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
- 1.3 Zakup nieruchomości w Teresinie pod budowę świetlicy wiejskiej
- 1.4 Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Ilość
1.	Koparko-ładowarka	1 kpl.
2.	Zakupiona nieruchomość w Dąbrówce Nowej z przeznaczeniem na świetlicę	198 m ²
3.	Zakupiona nieruchomość w Teresinie pod świetlicę wiejską	0,1834 ha
4.	Przygotowane oddziały przedszkolne przy szkołach podst. do świad. wysokiej jakości usług na rzecz dzieci wieku przedszkolnego	1 kpl.


3. Wartość zrealizowanych inwestycji: - 1.439.378,79 zł

- 3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2014 - 1.439.378,79 zł
 - 3.1.1 Środki finansowe z Budżetu gminy - 272.743,00 zł
 - 3.1.2 Środki pozabudżetowe - 1.166.635,79 zł
 - dotacja z UE/PROW - 174.438,00 zł
 - dotacja z UE/EFS - 992.197,79 zł

3.1.4 Struktura finansowania inwestycji:

Wartość całkowita	Budżet Gminy	UE/PROW	UE/EFS
1.439.378,79 zł	272.743,00 zł	174.438,00 zł	992.197,79
100 %	18,9 %	12,1 %	69,0 %

Wykres słupkowy obrazujący strukturę finansowania zrealizowanych zadań

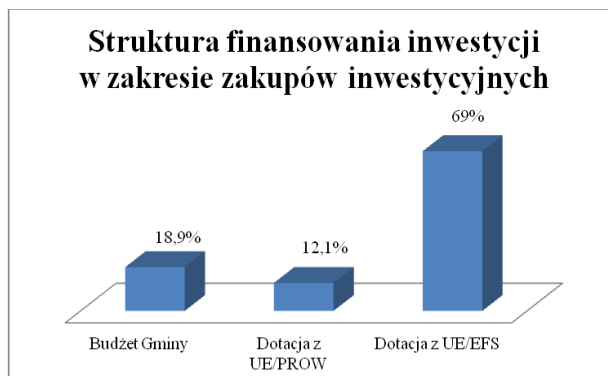

6.1 Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej dla mieszkańców Gminy Sicienko



Nowa koparko-ładowarka

Dostawca

VOLVO Maszyny Budowlane
Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 215
05-831 Młochów

Wartość końcowa zadania
286.078,32 zł

Efekt rzeczowy inwestycji:

Koparko-ładowarka na potrzeby gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej dla mieszkańców Gminy Sicienko:

Rok produkcji 2014 , wyposażona w:

- ✚ Łyżka koparkowa 300 mm z zębami,
- ✚ Łyżka koparkowa 600 mm z zębami,
- ✚ Łyżka koparkowa do skarpowania 1500 mm.



Nowa koparko-ładowarka

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w 2014 roku	Dotacja z UE/PROW	Zakład Komunalny
286.078,32 zł	58.146,00 zł	174.438,00 zł	53.494,32 zł
100 %	20,3 %	61,0 %	18,7 %

6.2 Zakup nieruchomości w Dąbrówce Nowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

<u>Sprzedawca nieruchomości:</u> Agnieszka Maria Cypress ul. Na Wzgórzu 24, 85-327 Bydgoszcz	Wartość końcowa zadania uwzględniająca koszt zakupu nieruchomości i koszty opłat sądowych i notarialnych 127.035,88 zł								
Zakup przez Gminę nieruchomości lokalowej nr 1 zlokalizowanej w budynku położonym w miejscowości Dąbrówka Nowa nr 21 na działce nr 76/1, z przeznaczeniem na powiększenie istniejącej w budynku świetlicy wiejskiej. Lokal mieści się na parterze budynku. Powierzchnia lokalu wynosi 79,7 m ² , przynależnego strychu wynosi 79,3 m ² , przynależnej piwnicy 39,0 m ² .									
Efekt rzeczowy inwestycji									
Nieruchomość lokalowa nr 1 zlokalizowana w budynku położonym w miejscowości Dąbrówka Nowa nr 21 na działce nr 76/1, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, piwnicy i strychu.  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego o pow. - 79,7 m ² .  Powierzchnia użytkowa piwnicy o pow. - 39,00 m ² .  Powierzchnia użytkowa strychu o pow. - 79,3 m ² .									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Struktura finansowania zadania</th></tr> <tr> <th>Wartość całkowita</th><th>Budżet Gminy w 2014 roku</th></tr> <tr> <td>127.035,88 zł</td><td>127.035,88 zł</td></tr> <tr> <td>100 %</td><td>100 %</td></tr> </table>		Struktura finansowania zadania		Wartość całkowita	Budżet Gminy w 2014 roku	127.035,88 zł	127.035,88 zł	100 %	100 %
Struktura finansowania zadania									
Wartość całkowita	Budżet Gminy w 2014 roku								
127.035,88 zł	127.035,88 zł								
100 %	100 %								

6.3 Zakup nieruchomości w Teresinie pod budowę świetlicy wiejskiej

<u>Sprzedawca nieruchomości:</u> Fundacja Potulicka w Wojnowie Wojnowo 5, 86-014 Sicienko	Wartość końcowa zadania uwzględniająca koszt zakupu nieruchomości i koszty opłat sądowych i notarialnych 26.071,80 zł	
Gmina Sicienko zakupiła od Fundacji Potulickiej w Wojnowie nieruchomość gruntową niezabudowaną o nr ewid. 14/5 o powierzchni 0,1834 ha położoną w miejscowości Teresin.	Struktura finansowania zadania	
	War. cał.	Budżet Gminy
	26.071,80 zł	26.071,80
	100 %	100 %
Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej, ma dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren płaski. Na działce znajdują się garaże blaszane. Nieruchomość zostanie przeznaczona pod budowę świetlicy wiejskiej.		

6.4 Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Założenia przedprojektowe Organizacja placu zabaw: 1) Zakup wyposażenia 2) Bezpieczna nawierzchnia Wyposażenie: 1) Wyposażenie utrzymania czystości w pomieszczeniach 2) Doposażenie kuchni 3) Meble i wyposażenie 4) Wyposażenie wypoczynkowe 5) Wyposażenie szatni 6) Zabawki 7) Pomoce dydaktyczne 8) Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo (apteczki, gaśnice) 9) ICT, tablice interaktywne, kserokopiarki, sprzęt audiowizualny	Wykonawca organizacji placów zabaw: AB FACTOR Andrzej Borowski Dostawca wyposażenia do utrzymania czystości: SK-MEDICO Sebastian Ilczuk Dostawca wyposażenia kuchni: INWEST HORECA Jacek Gargula Dostawca mebli i wyposażenia: JT MEBEL Sp. z o.o. i EUROSYSTEM Grzegorz Gaca Dostawca wyposażenia wypoczynkowego i szatni: JT MEBEL Sp. z o.o. Dostawca zabawek: PHPU ZUBER Andrzej ZUBER Dostawca Pomocy dydaktycznych: PHPU ZUBER Andrzej ZUBER i Grupa Edukacyjna S.A. Dostawca wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo: Grupa Edukacyjna S.A. ICT i sprzęt audiowizualny: COPYBOX Sp. z o.o.	
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita	Budżet Gminy	Dofinansowanie z UE/EFS
1.000.192,79 zł	7.995,00 zł	992.197,79
100 %	0,80 %	99,20 %

Place zabaw i nawierzchnie bezpieczne



Rozbudowany plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Sicieniu



Plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Kruszynie



Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw w Samsiecznie



Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw w Wojnowie



Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw w Trzemiętowie



Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw w Strzelewie

Rozdział 7. Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego.**1. Spis zrealizowanych inwestycji:**

- 1.1 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu ul. Przy Lesie
- 1.2 Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku
- 1.3 Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówczynie
- 1.4 Budowa oświetlenia ulicznego w Kruszyńce - ul. Kościelna
- 1.5 Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Rudzie
- 1.6 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu - w ul. Poziomkowej, Malinowej i Jgodowej
- 1.7 Budowa oświetlenia ulicznego w Kasprowie
- 1.8 Budowa oświetlenia ulicznego w Szczutkach

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość pkt.
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu ul. Przy Lesie	szt.	2
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku	szt.	1
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówczynie	szt.	1
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w Kruszyńce - ul. Kościelna	szt.	2
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Rudzie	szt.	3
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu - osiedle ul. Malinowa (dokumentacja techniczna)	kpl.	1
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w Kasprowie	szt.	1
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w Szczutkach	szt.	3

3. Wartość zakończonych inwestycji: - **176.932,57 zł**

3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2014 - 113.539,17 zł

3.1.1 Środki finansowe z budżetu gminy - 113.539,17 zł

3.1.2 Środki pozabudżetowe - 0,00 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego

Wartość całkowita zakończonych inwestycji	Wydatki w roku 2014		
	Łącznie	Budżet Gminy	Środki inne
176.932,57 zł	113.539,17 zł	113.539,17 zł	0,00 zł
100 %	100 %	100 %	0 %

7.1 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu - ul. Przy Lesie

Kontynuacja budowy oświetlenia w ulicy Przy Lesie w Osówcu poprzez:

- + ustawienie dwóch ośmiometrowych ocynkowanych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem na linii kablowej w miejscach pozostawionego zapasu kabla:
 - pierwszy słup oświetleniowy ustawiony w miejscu zaprojektowanej latarni oświetleniowej L202,
 - drugi słup oświetleniowy ustawiony w miejscu zaprojektowanej latarni oświetleniowej L105.
- + montaż na słupach opraw oświetleniowych typu SGS 103/70 SON-TPLUS 70 – 2 szt.

Wykonawcą oświetlenia był:

Sylwester Lis
P.W. „KALA”
Usługi Elektroinstalacyjne
Bartlewo 7
86-230 Lisewo

Efekt rzeczowy inwestycji

Słupy oświetleniowe stalowe wys. 8,0 m z wysięgnikiem wraz z oprawą typu SGS 103/70 SON-TPLUS 70 – 2 szt.



Oświetlenie uliczne na ul. Przy Lesie w Osówcu

Wartość końcowa zadania uwzględniająca wszystkie koszty księgowe

65.757,00 zł

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Osówek

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
65.757,00 zł	5.200,00 zł
100 %	100 %

7.2 Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku

Założenia przedprojektowe:

Budowa linii kablowej nn. 0,4 kV oświetlenia drogowego z przyłączem kablowym, złączem pomiarowym i szafką oświetleniową na dz. nr 135 w miejscowości Trzemiętówko

Wykonawcą oświetlenia był:

Sylwester Lis
P.W. „KALA”
Usługi Elektroinstalacyjne
Bartlewo 7, 86-230 Lisewo



Oświetlenie uliczne w miejscowości Trzemiętówko

W ramach inwestycji powstała:

- + Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 6 mb,
- + Linia kablowa YAKY 4x16 mm² – 10 mb,
- + Słup oświetleniowy stalowy wys. 7 m – 1 szt.,
- + Oprawa oświetleniowa z lampą 100 W – 1 szt.
- + Złącze pomiarowe ZP-1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl.

**Wartość końcowa zadania uwzględniająca
wszystkie koszty księgowe**

9.266,73 zł

Struktura finansowania zadania	
Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
9.266,73 zł	6.430,33 zł
100 %	100 %

7.3 Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówczynie

Założenia przedprojektowe:

Wykonanie oświetlenia - lampy ulicznej oświetlającej skrzyżowanie drogi gminnej Dąbrówka Nowa - Sicienko z drogą w kierunku Dąbrówczyna - w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka Nowa

Wykonawcą oświetlenia był:

Sylwester Lis
P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne
Bartlewo 7
86-230 Lisewo



Oświetlenie uliczne na skrzyżowaniu drogi do Dąbrówczyna

**Wartość końcowa zadania
uwzględniająca wszystkie koszty księgowe**
10.143,44 zł

Zadanie realizowane w ramach funduszu
sołectkiego sołectwa Dąbrówka Nowa

W ramach inwestycji powstał:

- ✚ Słup przelotowy typu ŻN-10 - 1 szt.
- ✚ Szafka oświetleniowa jednofazowa - 1 kpl.
- ✚ Kabel zasilający YAKY 2x35 mm² - 5 mb.
- ✚ Kabel oświetleniowy YKY 3x2,5 mm² - 5 mb.
- ✚ Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 150 W - 1 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
10.143,44 zł	10.143,44 zł
100 %	100 %

7.4 Budowa oświetlenia ulicznego w Kruszynie - ul. Kościelna

Założenia przedprojektowe:

Wykonanie oświetlenia drogowego skrzyżowania ul. Kościelnej i ul. Stawowej w Kruszynie - w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyn

Wykonawcą oświetlenia był:

Sylwester Lis
P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne
Bartlewo 7
86-230 Lisewo



Oświetlenie uliczne ul. Kościelnej w Kruszynie

**Wartość końcowa zadania uwzględniająca
wszystkie koszty księgowe**
12.827,40 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu
sołectkiego sołectwa Kruszyn

W ramach inwestycji powstała:

- ✚ Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 188 mb,
- ✚ Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 6 m – 2 szt.,
- ✚ Oprawa oświetleniowa z lampą typu parkowego - 2 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
12.827,40 zł	12.827,40 zł
100 %	100%

7.5 Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Rudzie

Założenia przedprojektowe:

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Ruda - w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Mochle

Wykonawcą oświetlenia był:

Sylwester Lis
P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne
Bartlewo 7
86-230 Lisewo



Oświetlenie uliczne w Nowej Rudzie

Wartość końcowa zadania
27.362,92 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu
sołectkiego sołectwa Mochle

W ramach inwestycji powstała:

- ✚ Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 157 mb,
- ✚ Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 3 szt.,
- ✚ Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W – 3 szt.
- ✚ Złącze pomiarowe ZP-1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
27.362,92 zł	27.362,92 zł
100 %	100 %


7.6 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu - w ul. Poziomkowej, Malinowej i Jagodowej

Założenia przedprojektowe:

Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Poziomkowej, Malinowej i Jagodowej w Osówcu - przy udziale środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Osówiec (Opracowanie dokumentacji technicznej)

Wykonawca dokumentacji:

Firma „VOLT-AMPER”
ul. Łomżyńska 49/27
85-863 Bydgoszcz

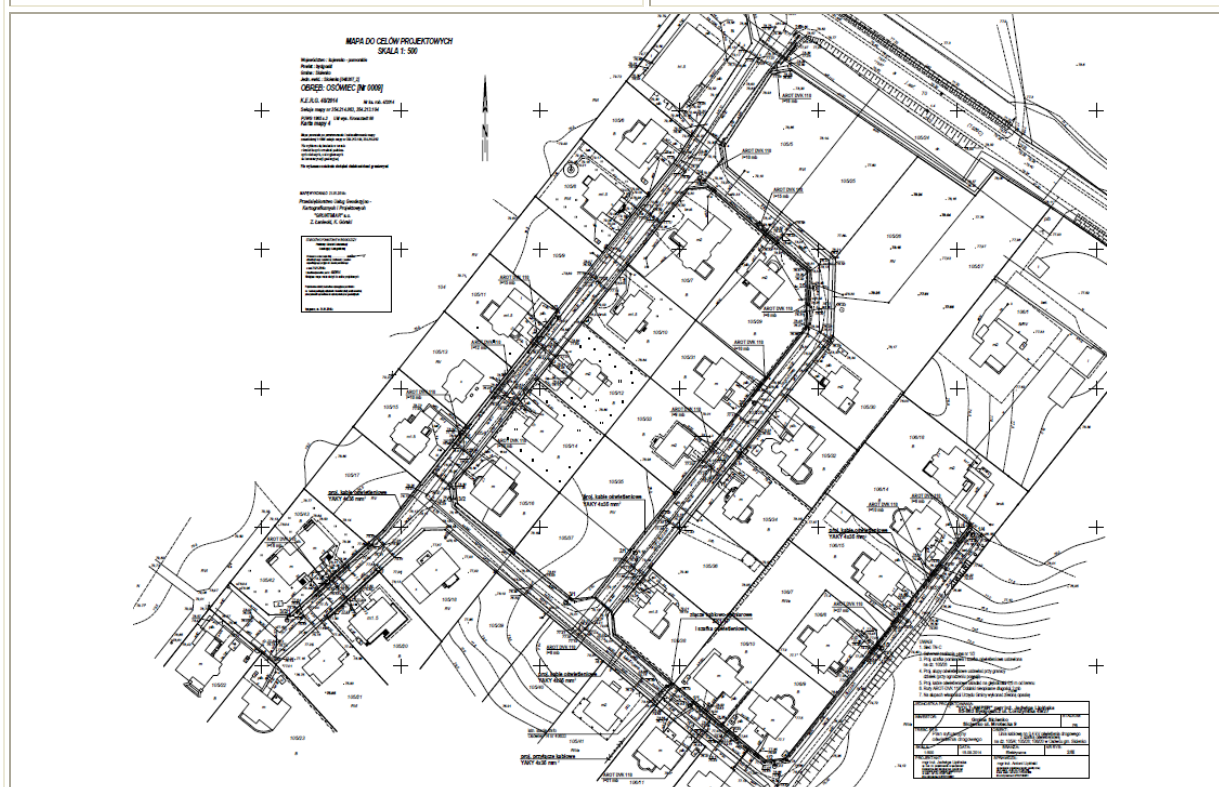

Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim i pozwoleniem na budowę

Wartość końcowa zadania
8.288,97 zł

Zadanie realizowane w ramach funduszu
sołectkiego sołectwa Osówiec

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
8.288,97 zł	8.288,97 zł
100 %	100 %

7.7 Budowa oświetlenia ulicznego w Kasprowie

Założenia przedprojektowe:

Wykonanie jednego punktu oświetleniowego w Kasprowie (lampa przy krzyżu na działce 47/1) - w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sicienka

Wykonawcą oświetlenia był:

Sylwester Lis
P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne
Bartlewo 7
86-230 Lisewo



Oświetlenie uliczne w Kasprowie

W ramach inwestycji powstała:

- ✚ Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 45 mb,
- ✚ Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 1 szt.,
- ✚ Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W – 1 szt.
- ✚ Złącze pomiarowe ZP-1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl.

Wartość końcowa zadania
13.630,24 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Sicienka

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
13.630,24 zł	13.630,24 zł
100 %	100 %

7.8 Budowa oświetlenia ulicznego w Szczutkach

Założenia przedprojektowe:

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczutki - w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Szczutki

Wykonawcą oświetlenia był:

Sylwester Lis
P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne
Bartlewo 7
86-230 Lisewo



Oświetlenie uliczne w Szczutkach

Wartość końcowa zadania
29.655,87 zł

Zadanie realizowane w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Szczutki

W ramach inwestycji powstała:

- ✚ Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 400 mb,
- ✚ Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 3 szt.,
- ✚ Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W – 3 szt.
- ✚ Złącze pomiarowe ZP-1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
29.655,87 zł	29.655,87 zł
100 %	100 %

Rozdział 8. Zadania w zakresie podniesienia standardu oświetlenia ulicznego.

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

- 1.1 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kruszynie
- 1.2 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łukowcu
- 1.3 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość pkt.
1.	Oświetlenie uliczne w Kruszynie - ul. Ogrodowa	szt.	2
2.	Oświetlenie uliczne w Łukowcu	szt.	3
3.	Oświetlenie uliczne w Zielonczynie - ul. Świerkowa i ul. Spacerowa	szt.	2

3. Wartość zakończonych inwestycji w 2014 roku: - 22.946,82 zł

3.1 Środki finansowe wydatkowane w roku 2014 - 22.946,82 zł

3.1.1 Środki finansowe z budżetu gminy - 22.946,82 zł

3.1.2 Środki pozabudżetowe - 0,00 zł

3.1.3 Struktura finansowania inwestycji:

Wartość całkowita zakończonych zadań	Wydatki w roku 2014		
	Łącznie	Budżet Gminy	Środki inne
22.946,82 zł.	22.946,82 zł.	22.946,82 zł.	0,00 zł.
100 %	100 %	100 %	0,0 %

8.1 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kruszynie - na ul. Ogrodowej

Zamontowanie opraw oświetleniowych i przewodu sterującego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Kruszyn w ul. Ogrodowej

Wykonawcą oświetlenia był:

Eneos sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań



Oświetlenie uliczne w Kruszynie - 2 nowe punkty świetlne na ul. Ogrodowej

W ramach zadania powstała:

- ✚ Oprawa oświetleniowa typu SGS 104/100 - 2 szt.
- ✚ Wysięgniki - 2 szt.
- ✚ Linka oświetleniowa AsXSn 2x25 mm² - 250 mb.

Wartość końcowa zadania
7.167,01 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kruszyn

Struktura finansowania zadania	
Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
7.167,01 zł	7.167,01 zł
100 %	100 %

8.2 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łukowcu

Zamontowanie opraw oświetleniowych na istniejących liniach energetycznych w miejscowości Łukowiec:

- ✚ montaż lampy przy drodze gminnej Dąbrowice-Murucin przy posesji P. Nitki,
- ✚ montaż 2 lamp (przy posesji P. Górskiego i byłej zlewni mleka) – 2 oprawy.

Wykonawcą oświetlenia był:

Eneos sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań



Oświetlenie przy drodze gminnej
Dąbrowice - Murucin



Oświetlenie drogi gminnej przy byłej
zlewni mleka

W ramach zadania powstało:

Oświetlenie w miejscowości Łukowiec - przy drodze gminnej Dąbrowice - Murucin, w skład którego wchodzi:

- ✚ Oprawa oświetleniowa SGS 104/100 - 1 szt.
- ✚ Wysięgnik - 1 szt.
- ✚ Linka oświetleniowa AsXS_n 2x25 mm² - 145 mb.

Oświetlenie w miejscowości Łukowiec - przy drodze gminnej i byłej zlewni mleka, w skład którego wchodzi:

- ✚ Oprawa oświetleniowa 104/100 - 1 szt.
- ✚ Oprawa oświetleniowa SGS 103/070 - 1 szt.
- ✚ Wysięgnik - 2 szt.
- ✚ Linka oświetleniowa - AsXS_n 2x25 mm² - 13 mb.

Wartość końcowa zadania
10.202,89 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Łukowiec

Struktura finansowania zadania	
Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
10.202,89 zł	10.202,89 zł
100 %	100 %

8.3 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - na ul. Świerkowej i ul. Spacerowej

Zamontowanie opraw oświetleniowych na istniejących liniach energetycznych w miejscowości Zielonczyn:

- ✚ montaż lampy przy drodze gminnej 50304 C Strzelewo - Zielonczyn,
- ✚ montaż lampy przy ul. Świerkowej w miejscowości Zielonczyn.

Wykonawcą oświetlenia był:

Eneos sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań



Oświetlenie uliczne - 1 pkt. świetlny na ulicy Spacerowej



Oświetlenie uliczne - 1 pkt. świetlny na ulicy Świerkowej

W ramach zadania powstała:

- ✚ Oprawa oświetleniowa typu SGS 103/070 - 2 szt.
- ✚ Wysięgnik - 2 szt.
- ✚ Linka oświetleniowa AsXSn 2x25 mm² - 80


Wartość końcowa zadania
5.576,92 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielonczyn

Struktura finansowania zadania	
Wartość całkowita	Budżet Gminy w roku 2014
5.576,92 zł	5.576,92 zł
100 %	100 %

Rozdział 9. Podsumowanie - Struktura finansowania inwestycji zrealizowanych w Gminie Sicienکو w 2014 roku

Struktura finansowania inwestycji		
Struktura finansowania	Wartość brutto (zł)	Udział (%)
Wartość całkowita	7.748.565,81	100
1. ŚRODKI GMINY SICIENKO	3.617.290,57	46,7
1.1 Urząd Gminy w Sicienکو	3.617.290,57	46,7
2. ŚRODKI POZABUDŻETOWE	4.131.275,24	53,3
2.1 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1.290.336,80	16,6
2.2 Dotacja z UE - PROW	602.731,00	7,8
2.3 Dotacja z UE - RPO	284.336,08	3,7
2.4 Dotacja z UE - EFS	992.197,79	12,8
2.5 Marszałek - FOGR	28.600,00	0,4
2.6 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	879.579,25	11,3
2.7 Zakład Komunalny w Sicienکو	53.494,32	0,7

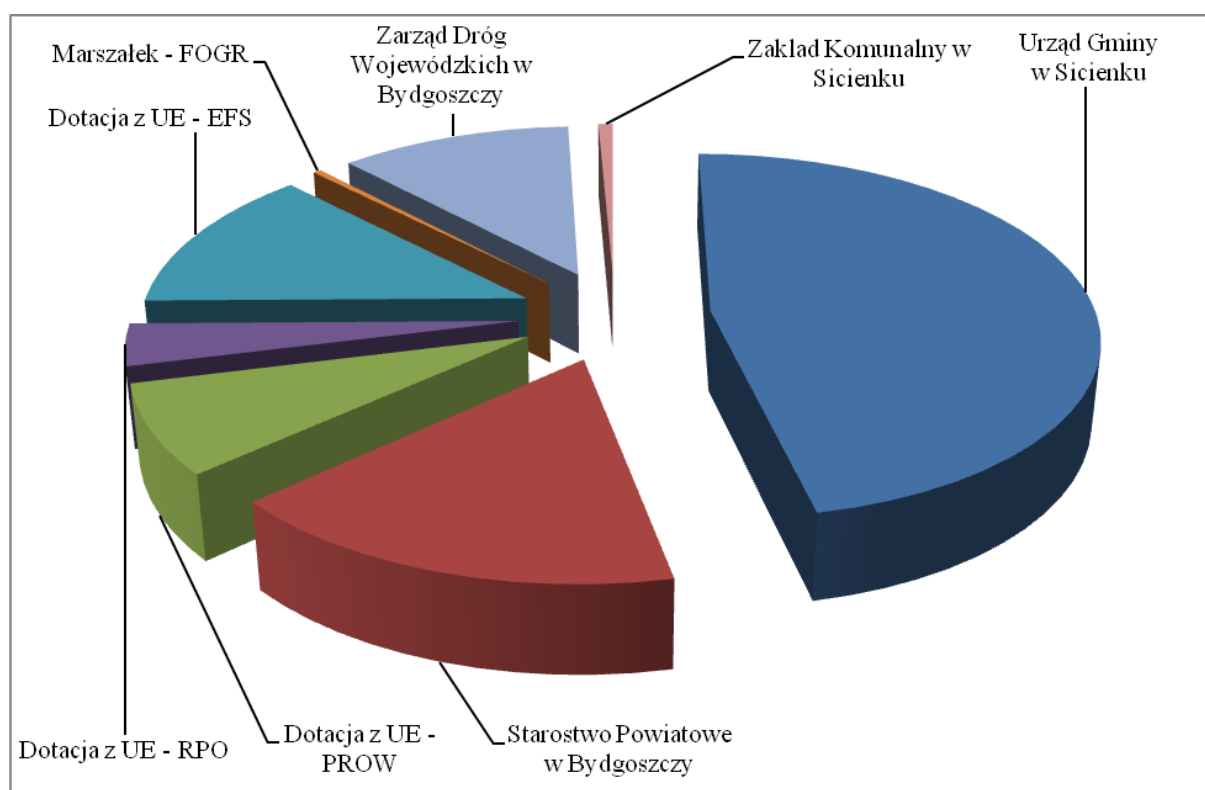

Działania administracyjne Referatu Inwestycji i Rozwoju w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju w roku 2014.

Lp.	Działanie	Ilość całkowita				Koszt przygotowania Decyzji (zł)	Wpływy do budżetu (zł)
		Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu	W tym				
			Lokalizacja celu publicznego	Warunki zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych	Ilość planowanych domów w decyzjach o warunkach zabudowy		
1	Wydawanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	157	41	74	106	25.510,20	2.517,00
2	Wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	27	-	-	-	-	1.380,00
3	Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy	215	-	-	-	-	2.907,00
4	Pozwolenia na budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych wydane przez Starostę Bydgoskiego	48					
5	Zawiadomienia PINB o dokonanych odbiorze końcowym i wydaniu decyzji na użytkowanie budynków mieszkalnych	57					
6	Nadanie numerów porządkowych dla nowych budynków mieszkalnych istniejących bądź będących w trakcie budowy	76					
7	Wydanie zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych dla nieruchomości z tytułu zmiany adresu (wprowadzenie nazw ulic)	173					

Zestawienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Rok 2014

Lp	Nr Decyzji	Przedmiot Decyzji	Lokalizacja planowanej inwestycji	Data wniosku	Ostateczny termin wydania decyzji	Data wydania decyzji	Czas postępowania (dni)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IR.6733.36/2013	Linia energetyczna nn	Pawłówek	20.11.2013	24.01.2014	21.01.2014	62	
2	37/2013/KP	Przebudowa drogi	Zielonczyn	5.12.2013	08.02.2014	29.01.2014	55	
3	38/2013/KP	Sieć Gazowa	Kruszyn 234, 238/18-20	17.12.2013	20.02.2014	14.02.2014	59	
4	1/2014/KP	Roz. oczyszczalni ścieków	Wojnowo 48/4	10.01.2014	16.03.2014	14.03.2014	63	
5	2/2014/KP	Infrastruktura energetyczna	Nowackowo/Witoldowo	12.02.2014	18.04.2014	04.04.2014	51	
6	3/2014/KP	Infrastruktura energetyczna	Trzemiętowo	26.02.2014	--	--	--	Wniosek został wycofany pismem z dnia 13.03.2014r.
7	4/2014/KP	Gazociąg śr. ciś.	Kruszyn	04.03.2014	08.05.2014	05.05.2014	62	W
8	5/2014/KP	Sieć wodociągowa	Siczenko	18.03.2014	22.05.2014	15.05.2014	58	
9	9/2014/KP	Sieć energetyczna-oświetlenia drogowego	Dąbrówka Nowa, 10, 21/2	01.04.2014	05.06.2014	04.06.2014	64	
10	10/2014/KP	Sieć energetyczna-oświetlenia drogowego	Kasprowo 47/1 i 45/15	01.04.2014	05.06.2014	03.06.2014	63	
11	11/2014/KP	Sieć gazowa	Zielonczyn 84/4,98/7,91	02.04.2014 09.05.2014 zm.	13.07.2015	09.07.2014	61	Postępowanie zawieszone na 29 dni. Czyli faktyczna ilość dni na decyzję =32 W
12	12/2014/KP	Sieć gazowa	Dąbrówka Nowa 237, 244/2	02.04.2014	06.06.2014	05.06.2014	64	
13	13/2014/KP	Linia energetyczna	Trzemiętowo 174/11,108,170,120/23,11 7/10	02.06.2014	06.06.2014	05.06.2014	64	
14	14/2014/KP	Sieć energetyczna-oświetlenia drogowego	Szczutki 93,92/1,42/14	08.04.2014	12.06.2014	05.06.2014	58	

15	15/2014/KP	Linia energetyczna	Mochle 163/2, 90/14,89/5,/89/6	10.04.2014	14.06.2014	12.06.2014	63	
16	16/2014/KP	Sieć wodociągowa	Wierzchucinek 54/52- 54/63, 60	11.04.2014	15.06.2014	13.06.2014	63	
17	17/2014/KP	Linia energetyczna	Pawłówek 47	15.04.2014	19.06.2014	16.06.2014	62	
18	18/2014/KP	Sieć energetyczna-oświetlenia drogowego	Kruszyn 79, 89	18.04.2014	22.06.2014	16.06.2014	59	
19	19/2014/KP	Sieć energetyczna-oświetlenia drogowego	Osówiec 106/20	18.04.2014	22.06.2014	17.06.2014	60	
20	20/2014/KP	Linia energetyczna	Kruszyn 37/...	09.05.2014	13.07.2014	24.07.2014	76	4 strony nie odbierały korespondencji.
21	21/2014/KP	Linia energetyczna SN	Kruszyn 281,268/10	09.05.2014	13.07.2014	10.07.2014	62	W
22	22/2014/KP	Oświetlenie uliczne	Nowa Ruda 163/2,92,89/11,93/1	13.05.2014	17.07.2014	15.07.2014	63	W
23	23/2014/KP	Linia energetyczna	Dąbrówka Nowa 75/2,218/1,86,268/12,268/ 10,268/8,268/6	15.05.2014	19.07.2014	18.07.2014	64	W
24	24/2014/KP	Linia energetyczna	Szczutki 76/81	16.05.2014	20.07.2014	18.07.2014	63	W
25	25/2014/KP	Linia energetyczna	Kruszyn 109/9,239/5 234,254	04.07.2014	07.09.2014	27.08.2014	54	
26	26/2014/KP	Kanalizacja	Sołectwo Kruszyn	Wniosek wycofany – decyzja o umorzeniu postępowania				
27	27/2014/KP	Zbiornik retencyjny	Łukowiec 175/1, 175/2	10.07.2014	13.09.2014	09.09.2014	61	
28	28/2014/KP	Linia energetyczna	Kruszyn 38/21,38/13,286/3,60	4.08.2014	08.10.2014	06.10.2014	63	
29	29/2014/KP	Linia energetyczna	Nowaczkowo 101/1,73/1,73/2,74/1,74/2	04.08.2014	18.09.2014	01.10.2014	58	
30	30/2014/KP	Sieć wodociągowa	Kruszyn 35;281;194/165	05.08.2014	09.10.2014	03.10.2014	59	
31	31/2014/KP	Linia energetyczna	Strzelewo 84/4	02.09.2014	19.12.2014	17.12.2014	63	Postępowanie zawieszone na 43 dni
32	32/2014/KP	Linia energetyczna	Trzęmiętowo 155/3,158,170,201/5	17.09.2014	21.11.2014	03.11.2014	47	
33	33/2014/KP	Sieć kanalizacji sanitarnej	Kruszyn	Wniosek wycofany				
34	34/2014/KP	Sieć gazowa	Dąbrówka Nowa-Trzciniec	19.09.2014	23.11.2014	14.11.2014	56	

35	35/2014/KP	Sieć gazowa	Dąbrówka Nowa 244/2,241/17	24.10.2014	28.12.2014	23.12.2014	60	
36	36/2014/KP	Sieć gazowa	Zielonczyn 114/1,120,132/..,130/.	24.10.2014	28.12.2014	17.12.2014	54	
37	37/2014/KP	Sieć gazowa	Zielonczyn 20/4,23/4,22/5,23/3,21/1,2 2/3,22/13,23/12,114/1	24.10.2014	23.01.2014	12.01.2015	80	Postępowanie zawieszone na 26 dni. Czyli faktyczna ilość dni na decyzję =54
38	38/2014/KP	Sieć gazowa	Mochle, Szczutki	30/10/2014	03.01.2015	02/01/2015	64	
39	39/2014/KP	Sieć kanalizacji sanitarnej	Strzelewo	24.11.2014	28.01.2015	16.01.2015	53	
40	40/2014/KP	Linia energetyczna	Wierzchucinek 63/2,63/1,161/3	30.12.2014	03.03.2015			
41	41/2014/KP	Linia energetyczna	Wojnowo 49/22,49/23,49/24,49/50	30.12.2014	03.03.2015			

Podsumowanie roku 2014:

Ilość prowadzonych postępowań administracyjnych ws. ustalenia lok. inwest. celu publ.	- szt.	41
Ilość wydanych decyzji administracyjnych o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	- szt.	33
Wnioski wycofane	- szt.	3
Postępowania wszczęte w 2014 r., ale decyzja zostanie wydana w roku 2015	- szt.	5

Zestawienie decyzji o warunkach zabudowy – Rok 2014

Lp	Nr Decyzji	Przedmiot Decyzji	Ilość plan. Obiek.	Lokalizacja planowanej inwestycji	Data wniosku	Data wydania decyzji	Czas postępowania (dni)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE W ROKU 2013 – ZAKOŃCZONE W ROKU 2014								
1	IR.6730. 147/2013/AB	Rozbudowa budynku gospodar.	1	Mchle 244/4	27.11.2013	15.01.2014	49	
2	146/2013/AB	Rozbudowa budynku gastrono.	1	Pawłówek 64/13	25.11.2013	16.01.2014	52	
3	144/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Mchle 161/49	20.11.2013	17.01.2014	58	
4	154/2013/AB	Budowa budynku Sali bankietowej	1	Strzelewo 74/19	5.12.2013	20.01.2014	46	
5	148/2013/AB	Budowa budynku magazynowo-handlowego	1	Osowiec 93/8	4.12.2013	21.01.2014	48	
6	142/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Dąbrówka Nowa 199/4	19.11.2013	27.01.2014	69	
7	157/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 268/8	10.12.2013	29.01.2014	50	
8	160/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 278/29	27.12.2013	06.02.2014	41	
9	149/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Szczutki 76/88	29.11.2013	13.02.2014	76	Termin przedłużono, dodatkowe uzgodnienie
10	150/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Szczutki 76/89	29.11.2013	13.02.2014	76	Termin przedłużono, dodatkowe uzgodnienie
11	151/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Szczutki 76/90	29.11.2013	13.02.2014	76	Termin przedłużono, dodatkowe uzgodnienie
12	152/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Szczutki 76/91	29.11.2013	13.02.2014	76	Termin przedłużono, dodatkowe uzgodnienie
13	155/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 268/6	10.12.2013	14.02.2014	66	Przedłużono termin
14	156/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 268/7	10.12.2013	14.02.2014	66	Przedłużono

								termin
15	143/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	4	Dąbrówka Nowa 199/6	19.11.2013	20.02.2014	93	
16	159/2013/KP	Zmiana spos. użyt. Na cele mieszkalne	1	Zielonczyn 115/6	19.12.2014	19.02.2014	62	
17	138/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Pawłówek 132	12.11.2013	05.03.2014	113	Przedłużo.termin spr. Bardzo skom.
18	139/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Pawłówek 151	12.11.2013	07.03.2014	115	Przedłużo.termin spr. Bardzo skom.
19	158/2013/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 268/9	19.12.2013	07.03.2014	78	Przedłużo.termin
POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE I ZAKOŃCZONE W ROKU 2014								
1	1/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Dąbrówka Nowa 100/9	31.12.2014	27.02.2014	58	
2	2/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Mochle 146/25	10.01.2014	26.02.2014	47	
3	3/2014/AB	Rozbud. Budynku mieszkalne.	1	Zawada 27/1	10.01.2014	07.03.2014	56	
4	4/2014/AB	Zmiana decyzji 39/2013	1	Mochle 152/13	13.01.2014	04.02.2014	22	
5	5/2014/KP	Budowa bud. gosp. Z wiatą	1	Wierzchucice 20/2	29.01.2014	24.03.2014	54	
6	6/2014/KP	Rozbudowa budynku mieszkal.	1	Wierzchucice 20/2	29.01.2014	24.03.2014	54	
7	7/2014/AB	Zmiana decyzji 99/2013	1	Mochle 159/4	16.01.2014	24.02.2014	39	ODMOWA
8	8/2014/AB	Przeniesienie decyzji nr 27/06	1	Zielonczyn 38/3	16.01.2014	27.01.2014	11	
9	9/2014/AB	Przeniesienie decyzji nr 154/11	1	Kruszyn 77/8	17.01.2014	27.01.2014	10	
10	10/2014/AB	Przeniesienie decyzji nr 153/11	1	Kruszyn 77/7	17.01.2014	27.01.2014	10	
11	11/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	3	Strzelewo 86/9	31.01.2014	05.05.2014	95 – 34=61	Postępowanie było zawieszone na 34 dni z uwagi na obszar NATURA 2000 W
12	12/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Wierzchucinek 54/48	20.01.2014	18.03.2014	57	
13	13/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Wierzchucinek 54/49	20.01.2014	18.03.2014	57	
14	14/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Wierzchucinek 54/50	20.01.2014	24.03.2014	63	

15	15/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Wierzhucinek 54/47	20.01.2014	18.03.2014	57	
16	16/2014/AB	Budynek inwentarski i szambo	1	Murucin 20	12.02.2014	15.04.2014	62	
17	17/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Pawłówek 124/9	03.02.2014	20.03.2014	45	
18	18/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	3	Trzciniec 155/6	20.02.2014	04.04.2014	43	
19	19/2014/AB	Przeniesienie decyzji 123/2013	1	Mochle 200/40	25.02.2014	28.02.2014	3	
20	20/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Trzemiętowo 69/38	26.02.2014	22.04.2014	55	
21	21/2014/AB	Budynek produkcyjno-magazynowy	1	Nowaczkowo 30	17.03.2014	05.05.2014	49	W
22	22/2014/AB	Silosy zbożowe	4	Trzemiętowo 174/11	28.02.2014	14.04.2014	45	
23	23/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Zielonczyn 20/13	04.03.2014	06.05.2014	63	W
24	24/2014/KP	Budowa garażu i bud. gospodar.	1	Osówek 106/7 i 106/8	12.03.2014	29.05.2014	78	Przedłużono termin, strona nie odbierała poczty.
25	25/2014/AB	Zmiana decyzji 74/2014	1	Kruszyn 39/8	13.03.2014			Wniosek wycofany
26	26/2014/KP	Przeniesienie decyzji 94/09	1	Zielonczyn 115/1	18.03.2014	19.03.2014	1	
27	27/2014/AB	Zmiana decyzji nr 80/2013	1	Zielonczyn 255/2	26.03.2014	14.04.2014	19	
28	28/2014/AB	Zmiana decyzji nr 33/2012	1	Zielonczyn 31/1	28.03.2014	17.04.2014	20	
29	29/2014/KP	Zmiana decyzji 58/11	1	Wojnowo 49/20	01.04.2014	06.05.2014	36	W
30	30/2014/AB	Budowa budynku gospodarcz.	1	Osówek 590	02.04.2014	02.06.2014	61	
31	31/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Kruszyn 39/8	08.04.2014	10.06.2014	63	
32	32/2014/AB	Budowa budynku inwentarskiego	1	Łukowiec 64	14.04.2014	17.06.2014	64	
33	33/2014/AB	Zmiana decyzji 19/2013	1	Pawłówek 107/9	15.04.2014	17.04.2014	2	Nie prowadzono postępowania. Udzielono pisemnej odpow.
34	34/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Wierzhucinek 54/52	15.04.2014	17.06.2014	63	
35	35/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Wierzhucinek 54/60	15.04.2014	17.06.2014	63	
36	36/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Wierzhucinek 54/59	15.04.2014	17.06.2014	63	
37	37/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Wierzhucinek 54/56	15.04.2014	23.06.2014	69	
38	38/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Wierzhucinek 54/55	15.04.2014	23.06.2014	69	
39	39/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Wierzhucinek 54/54	15.04.2014	17.06.2014	63	
40	40/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Wierzhucinek 54/53	15.04.2014	17.06.2014	63	
41	41/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Wierzhucinek 54/61	15.04.2014	17.06.2014	63	
42	42/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Wierzhucinek 54/62	15.04.2014	17.06.2014	63	
43	43/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Wierzhucinek 54/63	15.04.2014	17.06.2014	63	
44	44/2014/KP	Zmiana decyzji 149/2012	1	Gliszcz 39/9	17.04.2014	22.05.2014	35	W

45	45/2014/AB	Zmiana decyzji 155/11	1	Zielonczyn 135/6	22.04.2014	29.05.2014	37	
46	46/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	4	Trzemiętowo 78/1	09.05.2014	08.07.2014	60	W
47	47/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Osówek 26/53	25.04.2014	25.06.2014	61	
48	48/2014/AB	Zmiana decyzji 7/2018	1	Szczutki 76/50	28.04.2014	22.05.2014	24	Nie wydano decyzji. Pismo.
49	49/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	4	Zielonczyn 99/9	05.05.2014	21.07.2014	77	Postępowanie zawieszone z uwagi na obszar NATURA 2000
50	50/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	2	Zielonczyn	09.05.2014			Postępowanie zawieszone od dnia 12.06.2014r.
51	51/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Mochle 200/49	09.05.2014	08.07.2014	60	W
52	52/2014/KP	Budowa budynku gospodarcz – stodoła	1	Łukowiec 13	09.05.2014	04.07.2014	56	
53	53/2014/AB	Zmiana sposobu użytkowania	1	Murucin 106	16.05.2014	21.07.2014	66	
54	54/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Nowa Ruda 94/1	20.05.2014	25.07.2014	66	
55	55/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Nowa Ruda 121/1	20.05.2014	11.07.2014	52	W
56	56/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Nowa Ruda 94/3	20.05.2014	25.07.2014	66	
57	57/2014/KP	Przeniesienie decyzji 23/2014	1	Zielonczyn 20/13	15.05.2014	28.05.2014	13	
58	58/2014 AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Osówek 139/18	22.05.2014			Wniosek wycofany
59	59/2014/AB	Przebudowa budynku mieszk..	1	Dąbrówka Nowa 101/8	23.05.2014	21.07.2014	59	
60	60/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Osówek 134/1	26.05.2014	04.08.2014	70	Strony nie odbierały korespondencji
61	61/2014/AB	Zmiana decyzji 22/2014	1	Trzemiętowo 174/11	27.05.2014	18.07.2014	52	W
62	62/2014/KP	Zmiana decyzji nr 119/07	1	Łukowiec 117/1	30.05.2014	02.07.2014	33	
63	63/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 267/7	02.06.2014	28.07.2014	56	
64	64/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 267/8	02.06.2014	24.07.2014	52	
65	65/2014/AB	Przeniesienie decyzji 19/2014	1	Mochle 200/40	03.06.2014	11.06.2014	8	
66	66/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Osówek 139/18	04.06.2014	01/08.2014	58	
67	67/2014/AB	Budowa stawu	1	Trzciniec	05.06.2014	31.07.2014	56	
68	68/2014/AB	Adaptacja na cele mieszkalne	1	Łukowiec 101	24.06.2014	14.08.2014	51	

69	69/2014/AB	Budowa budynku świetlicy	1	Pawłówek 107/1	03.07.2014	22.08.2014	50	
70	70/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Trzemiętówko 17	03.07.2014	25.08.2014	53	
71	71/2014/AB	Przeniesienie decyzji 622011	1	Wojnowo 49/18	03.07.2014	07.07.2014	4	W
72	72/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Wierzchucinek 69/2	07.07.2014	22.09.2014	77	Przedłużono termin
73	73/2014/AB	Zmiana decyzji nr 47/2013	1	Kruszyn 280/19	09.07.2014	02.09.2014	55	
74	74/2014/AB	Zmiana decyzji 152/07	1	Osówiec 93/8	09.07.2014	11.09.2014	64	
75	75/2013/KP	Budowa budynku gospodarcze.	1	Kruszyn 257/19	24.07.2014	23.10.2014	91	Przedłużono termin
76	76/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyniec 92/3	15.07.2014	18.09.2014	65	
77	77/2014/KP	Budowa szamba	1	Gliszcz 45/20	15.07.2014	14.10.2014	92	
78	78/2014/AB	Zmiana decyzji nr 47/2014	1	Osówiec 26/53	18.07.2014	21.08.2014	34	
79	79/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Trzemiętowo 69/40	17.07.2014	23.09.2014	68	Przedłużono termin
80	80/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Trzemiętowo 69/41	17.07.2014	23.09.2014	68	Przedłużono termin
81	81/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	2	Trzemiętowo 69/43	17.07.2014	23.09.2014	68	Przedłużono termin
82	82/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Trzemiętowo 69/44	17.07.2014	23.09.2014	68	Przedłużono termin
83	83/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/5	18.07.2014	10.09.2014	54	
84	84/2014/AB	Rozbudowa budyn. Mieszkalne.	1	Osówiec 39/3	22.07.2014	11.09.2014	51	
85	85/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Chmielewo 72	29.07.2014	30.09.2014	63	
86	86/2014/KP	Budowa szamba	1	Słupowo 108/8	29.07.2014	29.10.2014	92	Przedłużono termin
87	87/2014/AB	Przeniesienie decyzji 156/2013	1	Kruszyn 268/7	30.07.2014	08.08.2014	9	
88	88/2014/AB	Przeniesienie decyzji 149/2013	1	Szczutki 76/88	31.07.2014	12.08.2014	12	
89	89/2014/AB	Rozbudo. budyn. garaż-gosp.	1	Osówiec 96/44	06.08.2014	06.10.2014	61	
90	90/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Słupowo 160/12	13.08.2014	08.10.2014	56	
91	91/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	3	Trzemiętowo 118/4	18.08.2014	27.10.2014	70	Przedłużono termin
92	92/2014/AB	Budowa zew. klatki schodowej	1	Pawłówek 109/2	19.08.2014	17.09.2014	29	Wniosek bez rozpoznania – nie uzupełniono
93	93/2014/AB	Przeniesienie decyzji 60/2014	1	Osówiec 134/1	25.08.2014	05.09.2014	11	
94	94/2014/AB	Budowa budynku gospodarcze.	1	Łukowiec 67	26.08.2014	24.10.2014	59	
95	95/2014/AB	Budowa budynku gosp. I silosu	1	Wierzchucice 23	27.08.2014	23.10.2014	57	
96	96/2014/KP	Adaptacja na budynek mieszka.	1	Goncarzewy 15/2	28.08.2014	31.10.2014	64	

97	97/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Trzemiętowo 3/49	02.09.2014	24.10.2014	52	
98	98/2014/AB	Budowa strzelnicy sportowej	1	Trzemiętówko 31/7	08.09.2014	03.11.2014	56	
99	99/2014/KP	Budowa budynku gospodarcz.	1	Osówiec 38	09.09.2014	05.11.2014	57	
100	100/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Sitno 55/6	16.09.2014	04.11.2014	49	
101	101/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Gliszcz 86/2; 87/1	22.09.2014	11.12.2014	81	Przedłużono termin
102	102/2014/AB	Budowa zew. klatki schodowej	1	Pawłówek 109/2	19.08.2014	17.09.2014	29	Wniosek bez rozpoznania – nie uzupełniono
103	103/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Szczutki 15/9	30.09.2014	14.11.2014	45	
104	104/2014/KP	Tablica reklamowa	1	Pawłówek 64/13	06.10.2014	27.11.2014	52	
105	105/2014/AB	Budowa kaplicy	1	Pawłówek 64/13	06.10.2014			Wniosek wycofany
106	106/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Szczutki 15/10	07.10.2014	02.12.2014	56	
107	107/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 15/6	8.10.2014	18.11.2014	41	
108	108/2014/AB	Przeniesienie decyzji 60/2011	1	Wojnowo 49/21	13.10.2014	17.10.2014	4	
109	109/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyniec 52/5	13.10.2014	03.12.2014	51	
110	110/2014/KP	Rozbudowa budynku mieszkal.	1	Pawłówek 109/2	14.10.2014	02.12.2014	49	
111	111/2014/KP	Rozbudowa budynku gospodar.	1	Pawłówek 68/7	20.10.2014	15.12.2014	57	
112	112/2014/AB	Budowa silosów zbożowych	2	Samsieczno 95/2	23.10.2014	12.12.2014	51	
113	113/2014/KP	Zmiana decyzji 60/2011	1	Wojnowo 49/21	03.11.2014	03.12.2014	30	Postępowanie umorzone
114	114/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Trzemiętowo 118/10	06.11.2014	29.12.2014	53	
POSTĘPOWANIA WSZCZĘT W ROKU 2014 – DO ZAKOŃCZENIA W ROKU 2015								
115	115/2014/KP	Budowa zew. klatki schodowej	1	Samsieczno	19.11.2014	16.01.2015	58	
116	116/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Piotrkówko 70	19.11.2014	07.01.2015	49	
117	117/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/23	24.11.2014	23.01.2015	60	
118	118/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/24	24.11.2014	23.01.2015	60	
119	119/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/25	24.11.2014	23.01.2015	60	
120	120/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/26	24.11.2014	23.01.2015	60	
121	121/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/27	24.11.2014	23.01.2015	60	
122	122/2014/AB	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/28	24.11.2014	23.01.2015	60	
123	123/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/38	24.11.2014	23.01.2015	60	
124	124/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/39	24.11.2014	23.01.2015	60	
125	125/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/40	24.11.2014	23.01.2015	60	
126	126/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/41	24.11.2014	23.01.2015	60	

127	127/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/42	24.11.2014	23.01.2015	60	
128	128/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	1	Kruszyn 38/43	24.11.2014	23.01.2015	60	
129	129/2014/KP	Budowa budynku mieszkalnego	4	Osówiec 12/6	25.11.2014	20.01.2015	56	
130	130/2014/	Budowa budynku mieszkalnego	2	Osówiec 17/30				
131	131/2014/	Budowa budynku mieszkalnego	3	Kruszyn 38/13	12.12.2014	03.02.2015	53	
132	132/2014/	Rozbudowa budynku mieszkalnego o pom. gosp. gar.	1	Osówiec 17/21				
133	133/2014/	Budowa budynku mieszkalnego	1	Trzemiętowo 69/34				
134	134/2014/	Budowa budynku mieszkalnego	1	Dąbrówka Nowa 241/11				
135	135/2014/	Budowa budynku mieszkalnego	1	Dąbrówka Nowa 243/9				
136	136/2014/	Budowa budynku mieszkalnego	1	Dąbrówka Nowa 243/10				
137	137/2014/	Budowa budynku mieszkalnego	2	Dąbrówka Nowa 268/7				
138	138/2014/	Budowa budynku mieszkalnego	1	Dąbrówka Nowa 241/25				

Legenda:

xx – sprawy wszczęte w roku 2013, a zakończone wydaniem decyzji w roku 2014

xx – przeniesienie decyzji

Xx – postępowanie związane ze zmianą decyzji

Xx – decyzje związane z budową budynków mieszkalnych

Xx – decyzje związane z budową budynków i obiektów nie mieszkalnych

xx – sprawy wszczęte w roku 2014, a planowane do zakończenia wydaniem decyzji w roku 2015

W - decyzje podpisane przez wójta

I. Podsumowanie roku 2014:

- | | | | |
|----|---|--------|--------------|
| 1. | Ilość prowadzonych postępowań administracyjnych ws. warunków zabudowy | - szt. | 157 (19+138) |
| 2. | Ilość postępowań wszczętych w roku 2014 i przeniesionych na rok 2015 | - szt. | 24 |
| 3. | Ilość spraw zakończonych w roku 2104 | - szt. | 133 |

w tym:

- | | | | |
|---|--|--------|-----|
| ➤ | Ilość wydanych decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy w roku 2014 | - szt. | 123 |
| ➤ | Ilość wydanych decyzji odmownych | - szt. | 1 |
| ➤ | Wnioski wycofane | - szt. | 3 |
| ➤ | Postępowania zawieszone | - szt. | 1 |
| ➤ | Wniosek pozostawiony bez rozpoznania (nie dokonano uzupełnienia na wezwanie) | - szt. | 2 |
| ➤ | Postępowanie umorzone z uwagi na jego bezzasadność | - szt. | 1 |
| ➤ | Na wniosek odpowiedziano pismem bez prowadzenia postępowania administracyjnego | - szt. | 2 |
| | | - szt. | 133 |

- | | | |
|--------------------------------|--------|---|
| 4. Decyzje zaskarżone do SKO | - szt. | 0 |
| 5. Decyzje zaskarżone do WSA | - szt. | 0 |
| 6. Postępowania prokuratorskie | - szt. | 0 |

II. Szczegółowa specyfikacja postępowań zakończonych w roku 2014

- | | | |
|--|--------|------------|
| ➤ Decyzje związane z budową budynków mieszkalnych | - szt. | 74 (15+59) |
| ➤ Decyzje związane z budową budynków i obiektów nie mieszkalnych | - szt. | 26 (4+22) |
| ➤ Postępowanie związane ze zmianą decyzji | - szt. | 12 |
| ➤ Przeniesienie decyzji | - szt. | 12 |

Razem - szt. 124

Lp.	Przedmiot Postępowania administracyjnego	Razem ilość spraw	Sposób zakończenia postępowania administracyjnego						
			Wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy	Wysłano pismo wyjaśniające, którym zakończono sprawę	Zawieszono postępowanie	Wniosek wycofany	Wniosek bez rozpoznania z uwagi na brak uzupełnienia	Decyzja o umorzeniu	Wydano decyzję odmowną
		szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
1	Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego	76	74	0	1	1	0	0	0
2	Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę obiektu nie mieszkalnego	29	26	0	0	1	2	0	0
3	Wniosek o przeniesienie decyzji wcześniej wydanej	12	12	0	0	0	0	0	0
4	Wniosek o zmianę decyzji wcześniej wydanej	16	11	2	0	1	0	1	1
RAZEM postępowania zakończone w roku 2014		133	123	2	0	3	2	1	1
5	Postępowania wszczęte w roku 2014, które zostaną zakończone w roku 2015	24							
6	Suma prowadzonych spraw roku 2014	157							

Uwaga: Sprawy o nr 115-138 (wszczęte w roku 2014 a nie zakończone) zostały przeniesione do pliku „Warunki Zabudowy 2015” i tam będą traktowane jako sprawy wszczęte w roku 2014, a zakończone w roku 2015.

Zestawienie sporządził:

Krzysztof Kula, Sicienko dn. 3.02.2015r.

**Opracowanie wykonano w Urzędzie Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
Referat Inwestycji i Rozwoju
Luty 2015 rok**

Opracował: Krzysztof Kula
Marcin Szczepański
