

Inwestycje i remonty zrealizowane w gminie Sicienko

2019

Wstęp

Z przyjemnością przedstawiamy opracowanie – krótką dokumentację w zakresie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i remontowych oraz innych działań Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienku zrealizowanych, na terenie gminy Sicienko w roku 2019.

Był to pierwszy rok pod rządami nowego wójta, któremu mieszkańcy naszej gminy w wyborach samorządowych, w październiku 2018 roku powierzyli mandat wóldarza gminy. W ciągu roku miała miejsce rotacja pracowników urzędu, oraz zmienił się regulamin organizacyjny. W roku 2019 udało się zrealizować zdecydowaną większość określonych planów, programów i studiów. Ich realizacja możliwa była dzięki otwartości i dobrej współpracy organu wykonawczego z organem stanowiącym gminy oraz z Sołtysami i Radami Sołeckimi poszczególnych sołectw. Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów w omawianym okresie stanowi kwotę prawie 12,7 mln zł, z czego 54,39 % to środki własne gminy, a 45,61% to środki pozyskane z różnych programów i instytucji zewnętrznych.

Już w styczniu 2019 r. wójt gminy określił cele strategiczne na rok 2019. Były to m.in:

1. Budowa, rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.
2. Gmina Sicienko miejscem naturalnego i czystego środowiska, promująca ekologiczny tryb życia.

Realizację tych celów potwierdza struktura poniesionych w 2019 r. wydatków inwestycyjnych, z której wynika, że najwięcej środków, bo aż ok. 7,4 mln zł. wszystkich wydatków inwestycyjno-remontowych przeznaczaliśmy na budowę i remonty dróg. Tak duże zaangażowanie środków na budowę i remonty dróg możliwe było m.in. dzięki dotacjom uzyskanym z rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych. Gmina złożyła 5 wniosków o dofinansowanie z tego programu i wszystkie zostały pozytywnie zweryfikowane, w wyniku czego zostały podpisane umowy o dofinansowaniu. Część z tych projektów została zrealizowana, a niektóre będą realizowane w roku 2020 i latach następnych.

W roku 2019 zostały sporządzone także nowe projekty techniczne na budowę kolejnych odcinków dróg, które będą realizowane w latach kolejnych, w miarę możliwości finansowych gminy.

Drugim co to wielkości zaangażowanych środków jest rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy, na którą wydatkowano w roku 2019 ponad 3,1 mln zł. Jest to działanie wpisujące się w drugi cel strategiczny. W tym zakresie najwięcej środków wydano na budowę kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wyb. Zadanie to realizowane było w dużej części ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. W ramach tego projektu rozpoczęto również budowę kanalizacji sanitarnej w Kruszynie – etap III.

Warto zauważyć, że w roku 2019 przybyło nam, aż 63 nowych punktów świetlnych. Koszt ich wybudowania to kwota ponad 0,4 mln zł. Lokalizację nowych latarni ulicznych wskazali sami mieszkańcy w ramach działań realizowanych z funduszu sołeckiego.

Podpisano również nowe, ważne umowy o dofinansowanie ze środków unijnych kolejnych projektów realizowanych w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przygotowano i złożono w LGD „Trzy Doliny” także nowe wnioski aplikacyjne do PROW na lata 2014-2020. Ich pozytywna weryfikacja pozwoli na dofinansowanie w roku 2020 budowy placów zabaw w Wojnowie i Sicienku oraz remont budynku komunalnego w Wojnowie.

Spoglądając na geografię realizowanych zadań nie ma białych plam. Należy przypomnieć, że zrównoważony rozwój nie oznacza wszystkim po równo. Zrównoważony rozwój, to rozwój który zaspokaja podstawowe potrzeby obecne poszczególnych społeczności lub obywateli, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

Należy również pamiętać, że zrównoważony rozwój opiera się na dwóch podstawowych pojęciach: pojęciu potrzeb i pojęciu ograniczeń.

Pragniemy również zwrócić uwagę na działania typowo administracyjne będące w obszarze działania Referatu Inwestycji i Rozwoju. To pracownicy tego referatu przygotowują aplikacje o środki pozabudżetowe w tym środki unijne. Realizują te zadania, prowadząc procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych, zajmują się monitorowaniem procesów inwestycyjnych oraz wspólnie z pracownikami referatu finansów rozliczają zrealizowane inwestycje.

Warto odnotować, że w roku 2019 została oddana do użytkowania wybudowana i przebiegająca przez część terenu gminy linia energetyczna wysokich napięć 2x400kV Bydgoszcz-Piła Krzewina. Linia ta, przede wszystkim stanowi zabezpieczenie energetyczne całego regionu. Umożliwia bowiem przesyłanie energii elektrycznej z dwóch niezależnie działających elektrowni, a należny gminie podatek od budowli (o dużej wartości) będzie zauważalnym w budżecie gminy dochodem własnym przez wiele następnych lat.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do lektury niniejszego opracowania.

Skład osobowy Referatu Inwestycji i Rozwoju w roku 2019:

- | | | |
|--------------|-------------|--|
| 1. Krzysztof | Kula | - Kierownik Referatu |
| 2. Iwona | Ościak | - Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju |
| 3. Marcin | Szczepański | - Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji (do 31.08.2019) |
| 4. Marika | Tabaczyńska | - Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju |
| 5. Łukasz | Cegielski | - Podinspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji (od 10.09.2019) |

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I.

A. Zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej.....	8
1.1 Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Panorama Wsi w Osówcu	9
1.2 Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzęmiętowie do działek nr 69/... ..	10
1.3 Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia na odcinku Mochle-Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle, opracowanie dokumentacji technicznej	11
1.4 Przebudowa wodociągu, skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Kolejowej w Sicienku, opracowanie dokumentacji technicznej.....	12
B. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.....	12
1.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie – etap III	12
1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wybudowanie z włączeniem do istniejącej kanalizacji Osówek-Bydgoszcz	15
1.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie	18
1.4 Wykonanie instalacji odprowadzania ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie.....	21

ROZDZIAŁ II.

Zadania inwestycyjne w zakresie budowy i remontu dróg	23
1.1 Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej	25
1.2 Budowa chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo	25
1.3 Przebudowa drogi powiatowej 1909C Krukówko-Witoldowo w miejscowości Gliszcz - pomoc finansowa	28
1.4 Budowa ul. Stawowej w Sicienku	29
1.5 Budowa ul. Grabowej w Sicienku- opracowanie dokumentacji technicznej	31
1.6 Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie - opracowanie dokumentacji technicznej	33
1.7 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowo od posesji 33 do 41- opracowanie dokumentacji technicznej.....	34
1.8 Budowa drogi gminnej w Mochlu	35
1.9 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - opracowanie dokumentacji technicznej.....	37
1.10 Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie – utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej w tym wykup gruntów	38
1.11 Rozbudowa drogi gminnej G50313C Osówek-Dąbrówka Nowa	40
1.12 Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku ul. Mała Góra	46
1.13 Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie dz. nr 20/2– opracowanie dokumentacji technicznej	49
1.14 Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu - opracowanie dokumentacji technicznej	50
1.15 Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko – Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji technicznej	52
1.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo – Mochle – pomoc finansowa na wykup gruntów	53
1.17 Remont drogi powiatowej 1528C Trzęmiętówko - Sicienko polegający na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienko przy ul. Mroteckiej do ul. Polnej, I etap - pomoc finansowa	54
1.18 Remont drogi gminnej na dz. nr 174/2 w Mochlu	55

1.19 Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicieniu – opracowanie dokumentacji technicznej	56
1.20 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych	58
1.21 Zakup kruszywa do remontu dróg	60
1.22 Budowa odcinka drogi gminnej nr G 50305C Samsieczno-Marynin – odcinek I od km 0+180 do km 0+603,60	61

ROZDZIAŁ III.

Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie komunalnych obiektów kubaturowych62

1) Obiekty komunalne:

1.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicieniu	63
1.2 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicieniu	64
1.3 Remont pomieszczeń w budynku na ul. Sportowej 2 z przeznaczeniem na pomieszczenia GOPS....	65
1.4 Remont budynku w Wojnowie 18 - opracowanie dokumentacji technicznej	67

2) Budynki dla GOK:

2.1 Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie	68
--	----

3) Budynki oświaty:

3.1 Przystosowanie budynku SP w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	71
---	----

ROZDZIAŁ IV.

Inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji 74

1.1 Budowa Placu zabaw w Sicieniu -opracowanie dokumentacji technicznej	74
1.2 Budowa Placu zabaw w Wojnowie -opracowanie dokumentacji technicznej	76

ROZDZIAŁ V.

Zakupy inwestycyjne77

1.1 Zakup samochodu dostawczego na potrzeby brygady gospodarczej	78
1.2 Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	78

ROZDZIAŁ VI.

Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego 80

1) Budowa nowego oświetlenia ulicznego:

1.1 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Lawendowej w Dąbrowce Nowej	82
1.2 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrowce Nowej	83
1.3 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dąbrowieckiej w Osówcu	84
1.4 Budowa oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia – I etap	85
1.5 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie - I etap	86
1.6 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa	87
1.7 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu na ul. Przy Lesie	88
1.8 Budowa oświetlenia przy części zamieszkałych działek nr 101/...w Osówcu - dokumentacja projektowa	89
1.9 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicieniu	90
1.10 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowej w Sicieniu	92
1.11 Montaż lamp wzdłuż drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca	93
1.12 Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki – Osowiec, między posesjami 41,48 i 68 - etap I	94

1.13 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w Trzemiętowo Kol. - opracowanie dokumentacji technicznej	95
1.14 Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23 w Trzemiętówku	96
1.15 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Pawłótku	97
1.16 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i Wrzosowej w Pawłótku – I etap	98
1.17 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Świerkowej w Pawłótku	100
1.18 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - ul. Krótka	101
1.19 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - ul. Wąska	102
1.20 Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłótku-przy przystanku autobusowym na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej.....	102
1.21 Rozbudowa oświetlenia ul. Dworska, Grodzka i Królewska w Dąbrówce Nowej – opracowanie dokumentacji i postawienie jednej lampy – I etap	104
1.22 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Malinowej w Osówcu	105
1.23 Rozbudowa oświetlenia na drodze do tartaku w Teresinie	106
2) Podniesienie standardu oświetlenia na istniejących liniach:	107
2.1 Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Starowiejskiej w Osówcu	107
2.2 Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Goncarzewy (blok nr 1)	108
2.3 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Wierzchucicach	109
2.4 Budowa punktu świetlnego w Ugodzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1532C Ugoda-Strzelewo i drogi gminnej w kierunku posesji nr 12	111
2.5 Budowa punktu świetlnego w Zawadzie, na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1533C Sitno-Zawada z drogą prowadzącą do posesji nr 21.....	112

ROZDZIAŁ VII.

Inne strategiczne, ponadlokalne inwestycje realizowane na terenie Gminy Sicienko w roku 2019.115

1.1 Budowa drogi ekspresowej S 5	114
1.2 Budowa drogi ekspresowej S 10 - opracowanie STEŚ	117
1.3 Budowa sieci gazowej Osowiec – Szczutki – Mochle – opracowanie dokumentacji technicznej....	118

ROZDZIAŁ VIII.

Struktura finansowania inwestycji zrealizowanych w Gminie Sicienko w 2019 roku119

1. Struktura wydatków na realizację zadań realizowanych w roku 2019	119
2. Źródła finansowania zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy Sicienko w 2019 r.	119
3. Struktura wydatków inwestycyjnych w roku 2019-wykres	120
4. Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2019 na realizację zadań gminy	121
5. Zakres rzeczowo-finansowy wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2019	123

INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE W 2019 ROKU NA TERENIE GMINY SICIENKO



1. Przygotowanie do budowy drogi w Łukowcu	11. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Osówcu	21. Budowa oświetl. drgow. w Goncarzewy
2. Dokum. tech. na budowę drogi w Słupowie	12. Przebudowa ul. Mała Góra w Pawłówku	22. Przebudowa dr. z kan. deszcz. w Gliszczu
3. Rozb. sieci wodociągowej w Trzemiętowie	13. Budowa oświetlenia drogowego w Pawłówku	23. Budowa oświetlenia dro. w Gliszcz Kol.
4. Rozbu. oświe. drogowego. w Wierzchucicach	14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie	24. Rozbudowa drogi Osówiec-Dąbrówka N.
5. Budowa oświe. drogowego w Trzemiętówku	15. Budowa oświe. na ul. Zbożowej w Kruszynie	25. Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrówce Nowej ul. Grodzka - Królewska
6. Budowa dróg w Mochlu	16. Budowa oświetlenia w Zielonczynie	26. Modernizacja SP. i dr. wew. w Wojnowie
7. Budowa oświetl. drogowego w Szczutkach	17. Budowa oświetlenia drogowego do Kamińca	27. Budowa ul. Stawowej w Sicienکو
8. Rozbud. sieci wodociągowej w Osówcu	18. Budowa oświetlenia w Ugodzie i Zawadzie	28. Budowa oświetlenia drogo. w Sicienکو
9. Budowa kanalizacji sanitar. w Osówiec Wyb.	19. Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Teresinie	29. Budowa chodnika przy ul. Mroteckiej w Sicienکو.
10. Budowa oświe. na ul. Malinowej w Osówcu	20. Budowa oświetlenia drogowego w Teresinie	

ROZLICZENIE WYDATKÓW INWESTYCYCJNO – REMONTOWYCH PONIESIONYCH W ROKU 2019

Rozdział I. Zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

A) Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez:

- 1.1 Rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu ul. Panorama Wsi do działek nr17/....
- 1.2 Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzemiętowie do działek. nr 69/...
- 1.3 Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia - Mochle- opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.4 Przebudowa wodociągu, skrzyżowanie ulic Kolejowa-Mrotecka - opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.5 Budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych przez Zakład Komunalny.
- 1.6 Wykonanie przez Zakład Komunalny sieci wodociągowych dla prywatnych inwestorów.

B) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko, w tym:

- 1.1 Rozwój infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w gminie Sicienko:
 - a. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III.
 - b. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wybudowanie z włączeniem do istniejącej kanalizacji Osowiec - Bydgoszcz (ul. Przy Lesie oraz ul. Gwarna wraz z przyległymi ulicami).
- 1.2 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie.
- 1.3 Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku SP w Kruszynie.
- 1.4 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja.
- 1.5 Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych przez Zakład Komunalny.

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Produkt	Ilość
1.	Sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm	208,40 m
2.	Sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm	422,90 m
3.	Przyłącza wodociągowe	1163,50/90 m/szt.
5.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 250	205,53 m
6.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200	3 115,77 m
7.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø110	1 297,35 m
8.	Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 mm do granicy działki	1 121/185 m/szt.
9.	Studnie z tworzywa o średnicy Ø 600 mm	24 szt.
10.	Studnie betonowe o średnicy Ø 1000 mm	112 sz.
11.	Studnia rozprężna betonowa o średnicy Ø 1200 mm	2 szt.
12.	Tłocznie ścieków	2 szt.
13.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków współfinansowane ze środków budżetu gminy na rok 2019	8 szt.

3. Struktura finansowania inwestycji w 2019 roku:

Struktura finansowania inwestycji wodociągowych		
<i>Wartość całkowita</i>	<i>Budżet Gminy</i>	<i>Inwestorzy prywatni</i>
466 415,92 zł	72 098,00 zł	394 317,92 zł

Struktura finansowania inwestycji kanalizacyjnych		
<i>Wartość całkowita</i>	<i>Budżet Gminy</i>	<i>Środki zewnętrzne</i>
2 719 047,90 zł	1 068 621,79 zł	1 650 426,11 zł

1.1 Rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcو, ul. Panorama Wsi.

Przebieg inwestycji	
Niewielkie zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej na ulicy Panorama Wsi w Osówcو. Sieć wodociągowa wymagała rozbudowy ponieważ w rejonie tym powstały nowe działki lub planowana jest budowa jednorodzinnych. Obszar bliskim sąsiedztwie budowanej. Dlatego przez ostatnie lata był Po tym jak wytyczono przebieg uaktywnił i można spodziewać zabudowany. Dlatego realizacja budowy wodociągu ma swoje uzasadnienie. W ramach zadania wykonano nową sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110 mm. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Komunalny w Sicienکو, w całości ze środków budżetu gminy.	
	
Efekt rzeczowy inwestycji	
• sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm	156,80 m
• sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm	2,40 m
Struktura finansowania zadania	
Wartość całkowita	Budżet Gminy
27 548,95 zł	27 548,95 zł




Fot.1. Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Panorama Wsi w Osówcu.

1.2 Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzęmiętowie.

Przebieg inwestycji

Niewielkie zadanie inwestycyjne, ale niezwykle istotne dla nowo powstających domów jednorodzinnych w Trzęmiętowie. Realizacja zadania polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej umożliwiającej przyłączenie nowych nieruchomości.

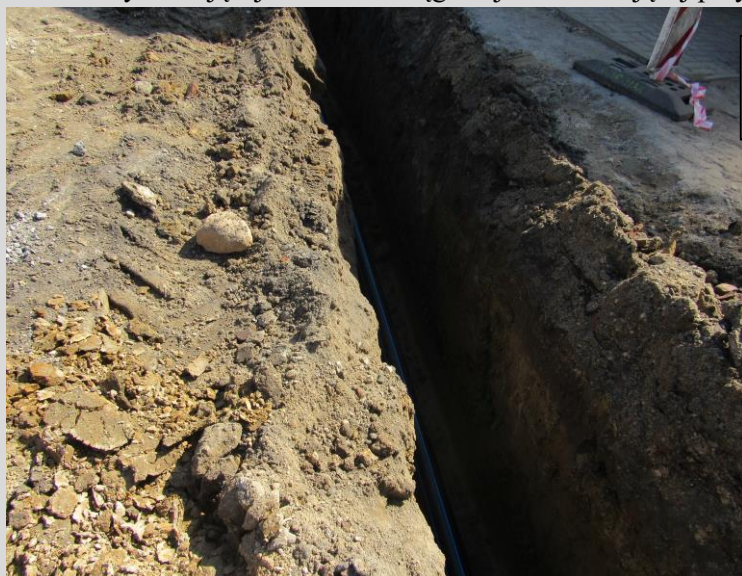

Fot.2. Budowa wodociągu w Trzęmiętowie.

W roku 2019 została wykonana dokumentacja techniczna oraz roboty budowlano-montażowe.

Całość inwestycji została sfinansowana ze środków budżetu gminy Sicienko. Prace budowlano-montażowe zostały wykonane przez pracowników Zakładu Komunalnego w Sicienku.

Efekt rzeczowy inwestycji

1	sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm	206 m
---	--------------------------------	-------

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
35 061,92 zł	35 061,92 zł

1.3 Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle - opracowanie dokumentacji.

Przebieg inwestycji

W okresach bardzo dużego rozbioru wody zauważalny jest jej chwilowy brak w części miejscowości Mochle i Nowa Ruda. Z tego względu w budżecie gminy na rok 2019 zostały zabezpieczone środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie elementów infrastruktury wodociągowej, które pozwoliłyby na poprawę obecnej sytuacji. W ramach wykonanych prac została sporządzona analiza możliwości i ewentualnego miejsca posadowienia zbiornika retencyjnego wody pitnej w miejscowości Mochle. Stwierdzono jednak, że szybciej i taniej zakładany cel możliwy będzie poprzez wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku od Szczutki Kolonia do Mochla. Dlatego została opracowana dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji tego zadania. Zadanie realizowane było przez Zakład Komunalny w Sicienku w ramach udzielonej dotacji.

Efekt rzeczowy inwestycji

1	Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia - Mochle	1 kpl.
2	Analiza możliwości i lokalizacji posadowienia i budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej	1 kpl.

Struktura finansowania zadania	
Wartość całkowita	Budżet Gminy
6 541,90 zł	6 541,90 zł

1.4. Przebudowa wodociągu, skrzyżowanie ulic Kolejowa - Mrotecka w Sicienku- opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji		
W celu poprawy jakości i ciśnienia wody na ul. Mroteckiej, szczególnie na końcówce obecnej sieci wodociągowej, wskazanym jest przebudowa istniejącej sieci i połączenie jej w układ pierścieniowy. Dlatego została opracowana dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji tego zadania i został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie realizowane było przez Zakład Komunalny w Sicienku w ramach udzielonej dotacji. W roku 2020 można będzie wykonać roboty budowlano-montażowe co rozwiąże problem.		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1	Dokumentacja techniczna na przebudowę sieci wodociągowej	1 kpl.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita	Budżet Gminy	
2 945,23 zł	2 945,23 zł	

B. Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

1.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III.

Przebieg inwestycji

Przedmiotowe zadanie jest kolejnym etapem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kruszyn. Inwestycja rozpoczęła się w roku 2017, kiedy to w ramach etapu I wybudowano kolektor przesyłowy od granicy Bydgoszczy do Kruszyna. W roku 2018 wykonano etap II, w ramach którego wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w południowej części miejscowości oraz stworzono możliwość przyłączenia się do sieci dla 140 nieruchomości z Kruszyna i Kruszyńca oraz przebudowano sieć wodociągową w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie. Przedmiotem obecnie realizowanego etapu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Świerkowej, częściowo w ul. Bydgoskiej i Szkolnej oraz w ciągu ul. Zbożowej i Ogrodowej wraz z ul. przyległymi do nich. Kanalizacja zostanie wybudowana również w części ul. Szlacheckiej w Dąbrówce Nowej. W ramach zadania zostanie wybudowanych, kolejnych 6 tłoczni ścieków. Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2019 r, a ich zakończenie planowane jest do dnia 30.09.2020 r. Wykonawca robót, firma WIMAR Sp. z o.o., został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Wartość rozpoczętego etapu inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim to kwota – 5 933 149,15 zł.

Zadanie zrealizowane jest w ramach Programu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”, współfinansowanym ze środków funduszu spójności UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. Od momentu rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 20 grudnia (do tego dnia trwały prace budowlane w tym roku) została ułożona sieć kanalizacyjna na: ul. Północnej, ul. Siewnej i częściowo na ul. Zbożowej.

Efekt rzeczowy inwestycji

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 mm	589,20 m
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160 mm	155,40 m
Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 110 mm	461,40 m

Struktura finansowania zadania

Wartość ca. zadania na koniec 2019 r.	Budżet gminy 2019 r.	UE – POIiŚ 2019 r.
5 670 225,76 zł	84 497,70 zł	93 500,00 zł



Fot.3. Na ul. Północnej kanalizacja jest wykonana.



Fot. 4. Prace kanalizacyjne na ul. Zbożowej w Kruszynie.

1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wybudowanie z włączeniem do istniejącej kanalizacji Osowiec - Bydgoszcz (ul. Przy Lesie oraz ul. Gwarna wraz z przyległymi ulicami).

Przebieg inwestycji

Przedmiotowe zadanie jest kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach Programu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”, współfinansowanym ze środków funduszu spójności UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji



powoduje systematyczną likwidację przydomowych szamb i przyłączanie się kolejnych nieruchomości do systemu kanalizacyjnego. W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną i tłoczną z przykanalikami do granicy każdej nieruchomości, która może przyłączyć się do systemu. Na ulicy Gwarnej i ulicy Przy Lesie wybudowano tłocznie ścieków, które przetłaczają ścieki do istniejącej pompowni przy ul. Bocznej, skąd ścieki tłoczone są do systemu kanalizacyjnego miasta Bydgoszczy (ul. M. Kolbego).

Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo WIMAR z Koronowa. Wszystkie prace budowlano-montażowe zostały wykonane w okresie od 7 stycznia do 3 lipca 2019 r.

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Efekt rzeczowy inwestycji

1	Kanalizacja sanitarna PVC Ø 250	205,53 m
2	Kanalizacja sanitarna PVC Ø 200	2 526,57 m
3	Kanalizacja tłoczna PE Ø 110	835,95 m
4	Przyłącza kanalizacyjne PVC Ø 160	565,40 m
5	Studnie PVC Ø 600	24 szt.
6	Studnie betonowe Ø 1000	112 szt.
7	Studnie rozprężne Ø 1200	2 szt.
8	Tłocznie ścieków Ø 2000 i Ø 2500	2 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita zadania	Budżet Gminy (Rok 2019)	UE - POIiŚ (Rok 2019)
2 288 434,67 zł	763 689,34 zł	1 485 418,72 zł



Fot. 5. Pierwszą łopatę wbito w ziemię w dniu 10.01.2019 r. na ul. Wesołej.



Fot. 6. Na ulicy Piaskowej było znacznie trudniej.



Fot. 7. Prace budowlano-montaż. na ul. Gwarnej.



Fot. 8. Ulica Gwarna po zakończeniu budowy kanalizacji.



Fot. 9. W obszarze realizowanej inwestycji napotkano na liczne uzbrojenie terenu.



Fot.10. ul. Spokojana.



Fot. 11. ul. Piaskowa.

Nawierzchnie dróg, w ciągu których prowadzone były prace kanalizacyjne zostały przywrócona do właściwego stanu.

1.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

Przebieg inwestycji

Systematyczny rozwój gminy rodzi nowe wyzwania w zakresie infrastruktury komunalnej. Jednym z najważniejszych jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Jest to jednak przedsięwzięcie bardzo kosztowne dlatego jego realizacja uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowa, a w roku 2017 uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT BTOF, a w dniu 29.12.2017 r., została podpisana umowa o dofinansowaniu. Niestety przeprowadzone dwa postępowania przetargowe nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy robót. Powodem tego były bardzo wysokie ceny złożonych ofert, które opiewały na ok. 150% wartości kosztorysowej inwestycji. Dlatego podjęto decyzję aby podzielić całe zadanie na dwa etapy, a w pierwszym z nich wykonać niezbędny technologicznie zakres prac, który pozwoli zwiększyć wydajność Wojnowskiej oczyszczalni i osiągnąć dobre parametry ścieków oczyszczonych. Z tego względu, w roku bieżącym firma projektowa WADIS z Bydgoszczy dokonała podzielenia dokumentacji technicznej na II etapy oraz zostało wykonane nowe studium wykonalności co pozwoliło złożyć nowy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania z RPO WK-P na lata 2014-2020, w ramach ogłoszonego konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w połowie grudnia, a w dniu 30 grudnia 2019 r. Zarząd WK-P podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania. Umowa o dofinansowaniu zostanie podpisana w roku 2020. Realizacja robót budowlano-montażowych planowana jest w latach 2020-2021.

Efekt rzeczowy inwestycji

Rok 2015 - została opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim.

Rok 2017- opracowano Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz podpisano umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia z funduszy UE.

Rok 2019 – podzielono zadanie na dwa etap, opracowano nowe studium wykonalności oraz złożono nowy wniosek o dofinansowanie z RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT BTOF.



Fot.12. Istniejący reaktor biologiczny w OŚ w Wojnowie.

Struktura finansowania zadania


Wartość całkowita na koniec 2019	Budżet Gminy (2019)
228 342,60 zł	31 365,00 zł

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na działce nr 48/4, położonej w południowej części miejscowości Wojnowo. Działka ta stanowi własność gminy. Powierzchnia działki wynosi 2,5270 ha. Od strony zachodniej oczyszczalnia przylega do drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Trzyczyn-Strzelce Dolne (dz. Nr 28/1). Od strony południowej teren oczyszczalni graniczy z działką nr 22369/3, należącą do lasów państwowych. Od strony wschodniej graniczy z rowem nr dz.54/1 i działką nr 55/1. Od strony północnej graniczy z działką 48/10.




Fot.13. Teren istniejącej Oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

Realizacja inwestycji pozwoli na uzyskanie efektów oczyszczania ścieków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi. Osady ściekowe powstające w wyniku oczyszczania ścieków spełniać będą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz Ustawy o odpadach. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają na ograniczenie uciążliwego oddziaływania oczyszczalni, nie przekraczającego granic obiektu; bezpośredni kontakt pracowników obsługujących oczyszczalnię ze ściekami, osadami oraz zanieczyszczeniami stałymi znajdującymi się w ściekach będzie wyeliminowany podczas bezawaryjnych warunków pracy i ograniczony maksymalnie dla stanów awaryjnych.

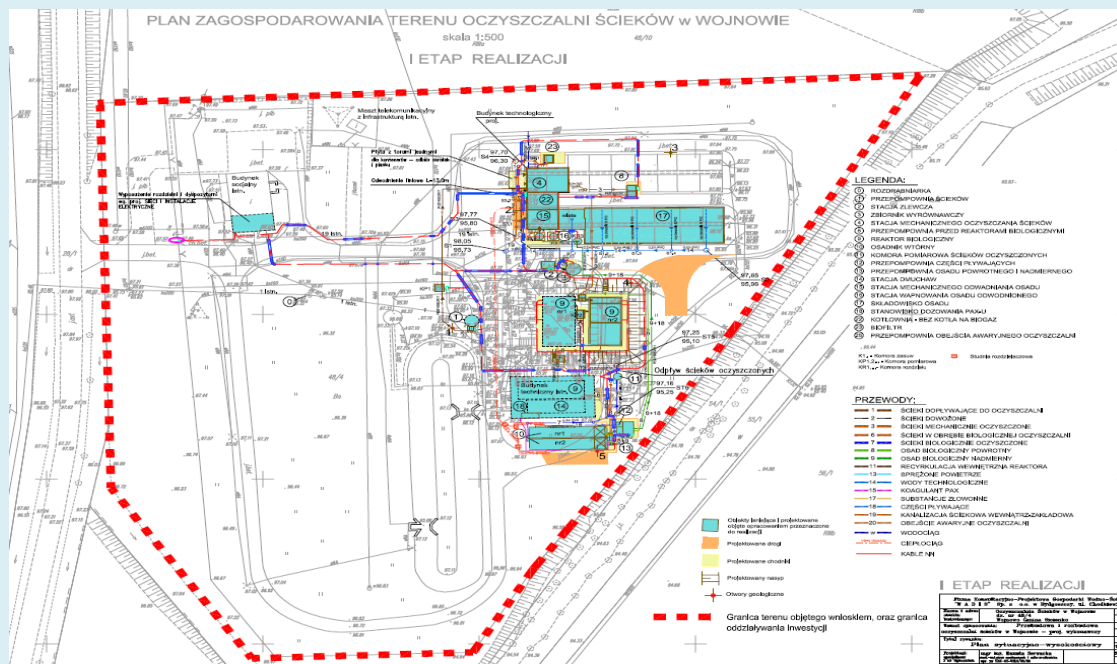

Fot.14. Plan zagospodarowania terenu dla I etapu inwestycji.

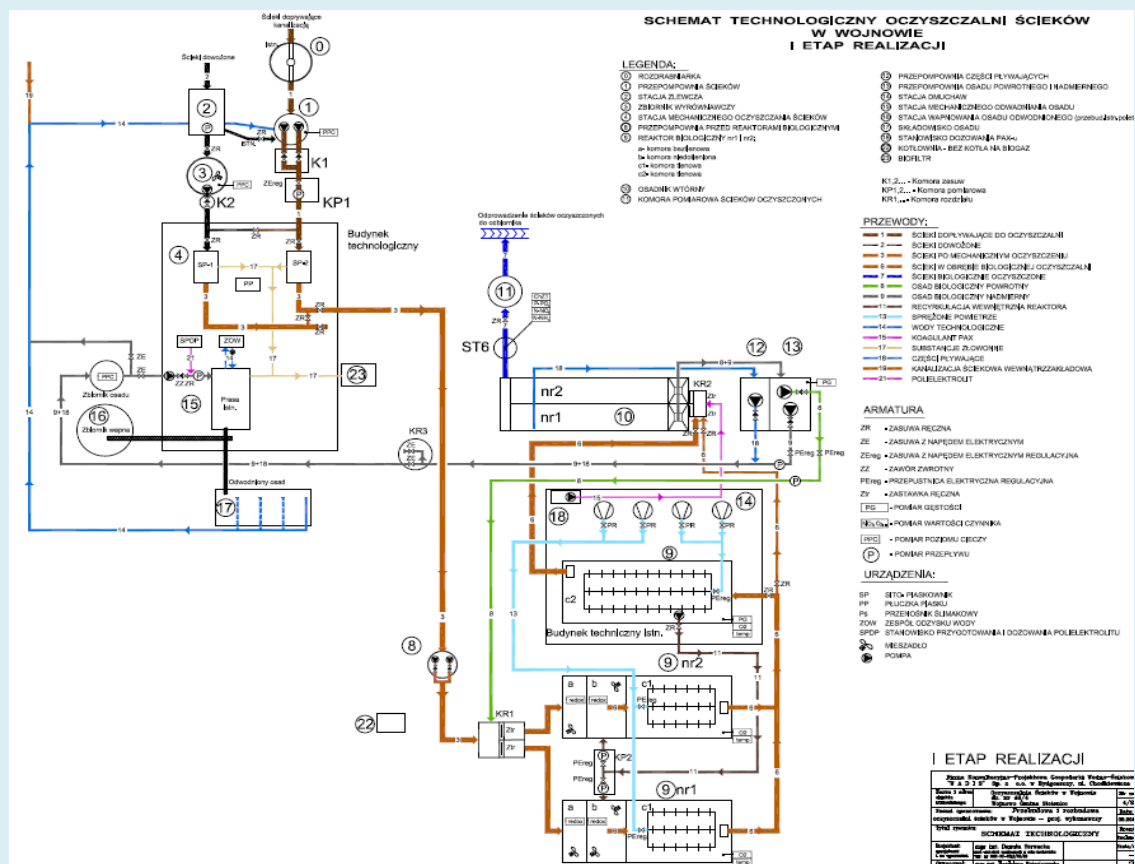

Fot. 15. Schemat technologiczny oczyszczalni dla I etapu inwestycji.

1.4 Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.

Przebieg inwestycji

W ramach wybudowanej w roku 2018 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn zostało wykonane przyłącze kanalizacyjne do zbiornika przy Sali gimnastycznej, skąd ścieki odprowadzane są do systemu kanalizacyjnego. Ścieki z głównego budynku szkoły odprowadzane dotychczas do starego szamba, mogą być włączone do systemu kanalizacyjnego poprzez inne przyłącze kanalizacyjne. Aby to zrobić należało w ramach odrębnego opracowania przebudować instalację wewnętrzną w pomieszczeniu kuchni oraz wybudować przewód zewnętrzny do ul. Leśnej.

Właśnie dlatego celem tegorocznego zadania była budowa przyłącza i przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji technologicznej z kuchni dla budynku głównego w SP w Kruszynie. Po wykonaniu zadania ścieki z budynku szkoły odbierane są kanalizacją sanitarną, która prowadzona jest pod posadzką piwnic z rur o podwyższonej odporności na temperaturę i wyprowadzona poza budynek. Na wyprowadzonym poza budynek odcinku sieci zainstalowane są: osadnik substancji łatwo opadających i separator tłuszczów. Dalej sieć jest włączona do nowej studni włączeniowej DN 600. Pomiędzy separatorem a studnią zainstalowana jest studzienka pobiercza Dn 425 do pobierania próbek do badania jakości odprowadzanych ścieków. Przewody kanalizacji wykonane są z rur kielichowych PVC-HT łączonych na kielichy z uszczelką gumową okrągłą. Wszystkie prace zostały wykonane przez firmę HYDRAFBUD Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Po wykonaniu robót montażowych, przywrócono utwardzenie terenu wokół szkoły.

Efekt rzeczowy inwestycji

1	Przebudowana instalacja technologiczna wewnętrzna w pomieszczeniu kuchni	1 kpl.
2	Przebudowana wewnętrzna instalacja wody zimnej w pomieszczeniu kuchni	1 kpl.
3	Przebudowana instalacja technologiczna zewnętrzna z pomieszczenia kuchni PVC Ø 160	17 m
4	Przyłącze kanalizacyjne PVC Ø 160 x 4,7	98,5 m

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
169 069,75 zł	169 069,75 zł



Fot. 16. Prace budowlano – montażowe przy budowie kanalizacji na terenie SP w Kruszynie.

Rozdział II. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy i remontu dróg.**1. Spis zrealizowanych inwestycji:**

- 1.1 Remont cząstkowy dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni bitumicznej.
- 1.2 Budowa chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) - pomoc finansowa.
- 1.3 Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C w miejscowości Gliszcz - pomoc finansowa.
- 1.4 Budowa ul. Stawowej w Sicienku.
- 1.5 Budowa ul. Grabowej w Sicienku- opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.6 Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie - opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.7 Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od posesji 33 do 41- opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.8 Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219).
- 1.9 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.10 Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej w tym wykup gruntów.
- 1.11 Rozbudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa – Osówiec.
- 1.12 Przebudowa drogi gminnej w PawłóWKu ul. Mała Góra.
- 1.13 Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2 – opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.14 Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu- opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.15 Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko - Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo – Mochle – pomoc finansowa na wykup gruntów.
- 1.17 Remont drogi powiatowej 1528C Trzęmiętówko - Sicienko polegający na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienko przy ul. Mroteckiej do ul. Polnej, I etap - pomoc finansowa.
- 1.18 Remont drogi gminnej na dz. nr 174/2 w Mochlu.
- 1.19 Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienku.
- 1.20 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych.
- 1.21 Zakup Kruszywa do remontu dróg.
- 1.22 Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km 2+ 547, w tym wykup gruntów zajętych pod drogę.
- 1.23 Przebudowa drogi gminnej w Łukowcu od km 0+000 do km 1+217.
- 1.24 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki drogowej.
- 1.25 Wykonanie i dostawa znaków do oznakowania dróg gminnych.

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Ilość
1.	Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej	2 134,58 m ²
2.	Budowa chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej	564 m

	Krukówko-Witoldowo	
3.	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych	1 396 m
4.	Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C w miejscowości Gliszcz - nawierzchnia, kanalizacja deszczowa	600 m
5.	Zakup Kruszywa do remontu dróg	5 000 ton
6.	Budowa ul. Stawowej w Sicienku	177 m
7.	Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219)	541 m
8.	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie - ul. Poziomkowa, Jagodowa i Malinowa - oświetlenie	linia kablowa oświetlenia drogowego + 4 latarnie
9.	Przebudowa drogi gminnej w Pawłótku ul. Mała Góra	416 m
10.	Rozbudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osówek	1 607 m
11.	Remont drogi powiatowej 1528C Trzęmiętówko - Sicienko polegający na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienko przy ul. Mroteckiej – I etap	285 m
12.	Remont drogi gminnej na dz. nr 174/2 w Mochlu- nawierzchnia utwardzona	35 m
13.	Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki	1 kpl.
14.	Wykonanie i dostawa znaków do oznakowania dróg gminnych	1 kpl.
Opracowane dokumentacje techniczne dla zadań:		
1	Budowa ul Grabowej w Sicienku	1 kpl.
2	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie	1 kpl.
3	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od posesji 33 do 41	1 kpl.
4	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki	1 kpl.
5	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2	1 kpl.
6	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu	1 kpl.
7	Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko - Dąbrówka Nowa	1 kpl.
8.	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienku	1 kpl.

3. Struktura finansowania zadań w 2019 roku:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie budowy i remontu dróg w roku 2019				
<i>Wartość całkowita</i>	<i>Budżet Gminy</i>	<i>Budżet Państwa</i>	<i>Zarząd WK-P</i>	<i>Powiat Bydgoski</i>
7 377 540,20	3 861 912,93	1 902 667,00	81 000,00	1 531 960,27

1.1 Remont częściowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej.

Przebieg inwestycji		
Każdego roku po okresie zimowym drogi o nawierzchni bitumicznej wymagają naprawy dziur, spękań, uszkodzonych poboczy etc. Również w roku 2019, pomimo bardzo łagodnej zimy, takie działania były niezbędne. Remonty przeprowadzono na wszystkich drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej wymagających tego typu napraw. Prace remontowe wykonane były w okresie od 14.05.2019 do 10.06.2019 r. przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę tj. Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z Nakła n/Not.		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową z otaczarki, grubość powyżej 4 cm	492,89 m ²
2	Remont częściowy grysem i emulsją asfaltową nawierzchni – głębokość wyboju do 2 cm	989,37 m ²
3	Remont częściowy grysem i emulsją asfaltową nawierzchni – głębokość wyboju do 3 cm	652,32 m ²
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy
135 289,91 zł		135 289,91 zł

1.2 Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo.

Przebieg inwestycji
Pomimo faktu, że zadanie to należy do kompetencji powiatu, jego realizacja na prośbę mieszkańców Trzemiętowa rozpoczęła się z inicjatywy gminy Sicienko w roku 2018. Po uzgodnieniu ze Starostą Bydgoskim, Gmina zleciła i sfinansowała w roku 2018 opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika. Wartość tego opracowania to kwota 14 985,09 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę kompletną dokumentację techniczną przekazano do Powiatu Bydgoskiego. Jesienią 2018 roku został wyłoniony wykonawca robót. Prace budowlane zostały rozpoczęte w IV kwartale roku 2018, a zakończone w kwietniu roku 2019. Zgodnie z zawartą umową koszty robót budowlanych zostały poniesione w 50% przez gminę i w 50% przez powiat. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy

Trzemiętowa mogą bezpiecznie poruszać się po ładnym i bezpiecznym chodniku, wcześniej oświetlonym, na odcinku od szkoły do przystanku autobusowego, usytuowanego przy drodze Prosperowo – Wojnowo.

Efekt rzeczowy inwestycji

Rok 2018 – dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, rozpoczęcie robót.

Rok 2019 – zakończenie robót budowlanych:

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej,
- długość chodnika – 564 m,
- szerokość chodnika – 1,5 m
- bariery ochronne w miejscach niebezpiecznych.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2018-2019) <i>dotacja dla powiatu</i>	Budżet Gminy 2019 <i>dotacja dla powiatu</i>	Powiat Bydgoski
409 946,50 zł	212 465,09 zł	197 480,00 zł	197 481,41zł



Fot.17. Nowy chodnik w Trzemiętowie.



Fot.18. Chodnik w Trzemiętowie.



Fot. 19. Chodnik w Trzemiętowie.

1.3 Przebudowa drogi powiatowej 1909 C Krukówko-Witoldowo w miejscowości Gliszcz – pomoc finansowa.

Przebieg inwestycji

Z uwagi na liczne wnioski radnych, Rady Gminy Sicienko oraz mieszkańców Gliszcz o podjęcie działań mających na celu wykonanie odwodnienia drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Gliszcz, gmina Sicienko wraz z Powiatem Bydgoskim przystąpiła do wspólnej realizacji zadania mającego na celu odwodnienie drogi powiatowej. Gmina Sicienko w roku 2017 zleciła opracowanie koncepcji technicznej, która została przekazana Powiatowi Bydgoskiemu. Na jej podstawie Powiat Bydgoski opracował dokumentację techniczną, a w roku 2019 przy wsparciu finansowym gminy wykonał roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi i wybudowaniu kanalizacji deszczowej o długości ok. 600 m, dla odprowadzania wód opadowych z drogi i terenu przyległego. Efektem przedsięwzięcia jest prawidłowo odwodniony przebudowany odcinek drogi przebiegający przez całą wieś.

Efekt rzeczowy inwestycji



Rok 2017 – gmina opracowała i przekazała jako pomoc rzeczową dla Powiatu koncepcję odwodnienia drogi powiatowej przebiegającej przez Gliszcz.

Rok 2019 – gmina wspólnie z powiatem sfinansowała przebudowę odcinka drogi i budowę kanalizacji deszczowej.

Fot. 20. Droga powiatowa w miejscowości Gliszcz przed modernizacją.



Fot. 21. Nowa nawierzchnia i kanalizacja deszczowa na drodze w Gliszczu.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2019)	Powiat bydgoski (Rok 2019)
1 067 020,20 zł	220 000,00 zł	846 405,20 zł

1.4 Budowa ul. Stawowej w Sicienکو.

Przebieg inwestycji

Wykonana ponad 20 lat temu ceglana nawierzchnia ul. Stawowej w Sicienکو na tyle się zużyła, że jej użytkowanie stało się kłopotliwe. Dlatego mieszkańcy miejscowości podczas zebrania wiejskiego w roku 2018 uznali przebudowę tej ulicy za zadanie priorytetowe i podjęli uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołectkiego na rok 2019 w kwocie 10 tys. zł na wykonanie przebudowy ulicy. W roku 2019 została opracowana dokumentacja techniczna, uzyskano pozwolenie na budowę, a w drugiej połowie roku wykonano roboty budowlane. Wynikiem wykonanych prac jest nowa nawierzchnia ulicy wykonana z brukowej kostki betonowej oraz zjazdy do posesji. W ciągu ulicy w okolicy Przedszkola zostały wykonane miejsca parkingowe. Pobocza drogi zostały wyhumusowane i obsiane trawą. Zamontowano nowe oznakowanie pionowe. Na rok 2020 zaplanowano wykonanie nowego oświetlenia ulicy.

Efekt rzeczowy inwestycji

1	Droga o nawierzchni z brukowej kostki betonowej	176,92 m
2	Plac parkingowy o nawierzchni z kruszywa	226 m ²
3	Zjazdy o nawierzchni z brukowej kostki betonowej	27 m ²
4	Oznakowanie pionowe (nowe znaki drogowe)	8 szt
5	Bariery drogowe	2 m
6	Kształtowanie terenów zielonych (humusowanie i obsianie trawą)	50 m ²



Fot. 22. Ulica Stawowa w czasie prac.



Fot. 23. Ulica Stawowa obecnie.



Fot. 24. Ulica Stawowa w Sicienku po przebudowie.



Fot. 25. Nowe oblicze ulicy Stawowej w Sicienکو, brakuje tylko oświetlenia.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
198 545,81zł	198 545,81zł

1.5 Budowa ul. Grabowej w Sicienکو- opracowanie dokumentacji technicznej.


Przebieg inwestycji

Potrzebę budowy drogi – ul. Grabowej w Sicienکو zgłaszali mieszkańcy tej części miejscowości podczas zebrań wiejskich. Jest to droga, przy której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W ciągu drogi wybudowana jest pełna infrastruktura techniczna. Mieszkańcy sołectwa podczas zebrania wiejskiego w roku 2018 uznali budowę tej ulicy za zadanie priorytetowe i podjęli uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołectwa na rok 2019 w kwocie 9 tys. zł na wykonanie w roku 2019 dokumentacji technicznej na budowę ulicy. W ramach prac nad projektem w br. została wykonana mapa do celów projektowych oraz została opracowana dokumentacja projektowa i

kosztorysowa na budowę drogi. Dokumentacja techniczna zakłada wykonanie nowej konstrukcji drogi dla ruchu KR1 oraz nawierzchni i zjazdów do posesji z brukowej kostki betonowej. Projekt zakłada również odwodnienie drogi częściowo do nowej kanalizacji deszczowej, a w części na teren przyległy. Z uwagi na wysoki koszt planowanego do realizacji zadania, zostało ono podzielone do wykonania w II etapach. Pierwszy z nich obejmuje odcinek od ul. Klonowej do ostatniego istniejącego zabudowania. Etap II to odcinek od ostatniego zabudowania do ul. Lipowej.

Efekt rzeczowy inwestycji

1	Dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim	kpl. 1
2	Został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	kpl. 1

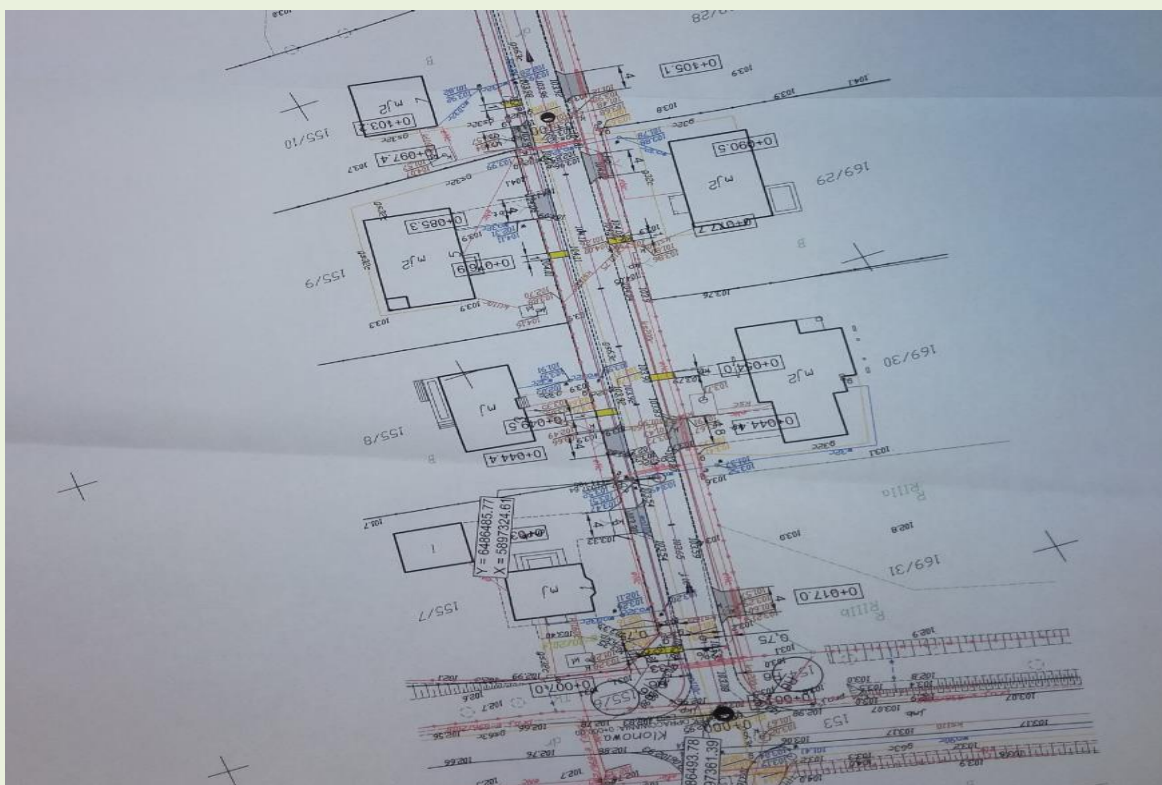

Fot. 26. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę ul. Grabowej w Sicienku.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
23 464,71 zł	23 464,71 zł

Struktura finansowania zadania


Wartość całkowita	Budżet Gminy
14 551,43 zł	14 551,43 zł

1.7 Przebudowa drogi gminnej w Słupowie opracowanie dokumentacji technicznej.**Przebieg inwestycji**

Droga będąca celem planowanego przedsięwzięcia przebiega przez teren zabudowy siedliskowej w miejscowości Słupowo. Obecnie droga jest o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej o nierównej nawierzchni. O budowę drogi wnioskowali mieszkańcy sołectwa Murucin podczas zebrań wiejskich i w roku 2018 uznali budowę drogi za zadanie priorytetowe i podjęli uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołectkiego na rok 2019 w kwocie 10 tys. zł na wykonanie w roku 2019 dokumentacji technicznej na budowę drogi. W ciągu roku został wyłoniony wykonawca dokumentacji technicznej, który jednak z powodu opóźnień w przygotowaniu mapy syt.-wys. do celów projektowych nie był w stanie dokończyć prac projektowych. Dlatego Rada Gminy Sicienka podczas sesji w dniu 28 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę o przeniesieniu zadania w tzw. środki niewygasające. Daje to gwarancję dokończenia prac projektowych do połowy roku 2020. W założeniach przedprojektowych przyjęto, że planowana droga o długości ok. 660 m, będzie miała konstrukcję dla ruchu KR1, szerokość 5 m i nawierzchnię bitumiczną.

Efekt rzeczowy inwestycji

1. Została wykonana mapa do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi.
2. Zadanie zostało przeniesione jako środki niewygasające do wykorzystania do 30.06.2020 r.

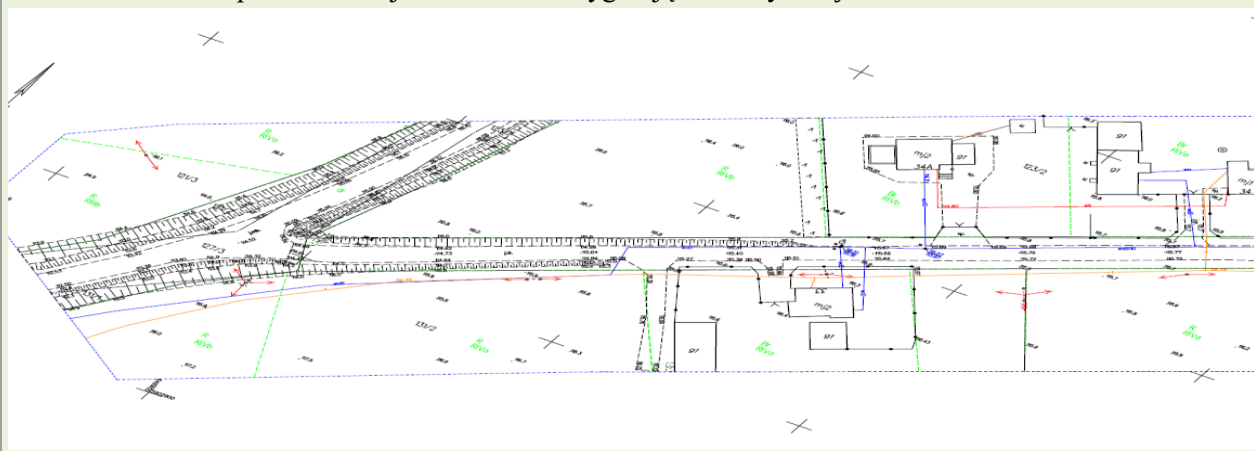

Fot. 28. Wyrys z mapy syt.-wys. do celu wykonania dokumentacji technicznej na budowę drogi w Słupowie.

Struktura finansowania zadania	
Wartość całkowita	Budżet Gminy
16 937,10 zł	16 937,10 zł

1.8 Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz część działek nr 190 i 219).

Przebieg inwestycji			
W roku 2018 została opracowana dokumentacja techniczna i kosztorysowa na budowę drogi w Mochlu. Uzyskano również zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W ramach funduszu sołectkiego na rok 2019 mieszkańcy sołectwa przeznaczyci kwotę 15 tys. zł na wykonanie zadania w roku 2019. Realizacja zadania uwarunkowana była pozyskaniem środków zewnętrznych. Dlatego został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków Samorządu Województwa w ramach Funduszu ochrony gruntów rolnych. Obydwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie co pozwoliło na sprawne i kompletne zrealizowanie przedsięwzięcia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia. Efektem projektu jest droga dla ruchu KR1 o długości 541 m, szerokości 5 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. W ramach zadania wykonano zjazdy do posesji z kostki betonowej oraz rowy i przepusty odwadniające. Na poboczach wykonano humusowanie i obsiano je trawą.			
Efekt rzeczowy inwestycji			
1	Droga o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m		541 m
2	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		2 767 m ²
3	Zjazdy z brukowej kostki betonowej		286,9 m ²
4	Łuki z koski kamiennej		24,1 m ²
5	Kształtowanie terenów zielonych (humusowanie skarp z obsianiem trawą)		1 560 m ²
6	Nowe oznakowanie pionowe		4 szt.
Struktura finansowania zadania			
Wartość całkowita	Rok 2019		
	Budżet gminy	BP-FDS	UM -BOGR
871 258,58 zł	350 296,34 zł	422 880,00 zł	81 000,00 zł



Fot. 29 i 30. Wykonywanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi w Mochlu.



Fot. 31 i 32. Nowa nawierzchnia drogi, zjazdy do posesji i rowy odwadniające.



Fot. 33. Tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania budowy drogi z FDS.



Fot. 34. Droga w Mochlu po przebudowie.

1.9 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - opracowanie dokumentacji technicznej.


Przebieg inwestycji

Zadanie inwestycyjne rozpoczęło się w roku 2018, kiedy za środki z funduszu sołectkiego sołectwa Szczutki na rok 2018 została wykonana mapa do celów projektowych. Następnie długi czas, kilka miesięcy trwała dyskusja publiczna na temat wyboru optymalnego przebiegu planowanej drogi. Przedstawione dwa warianty przebiegu drogi nie uzyskały poparcia większości mieszkańców. Ostatecznie podczas zebrania wiejskiego zdecydowano, że przebieg nowej drogi będzie po śladzie drogi istniejącej. Droga będzie poszerzona do 5,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m. W trakcie trwania prac projektowych władze gminy zasugerowały, aby prace projektowe, a w konsekwencji całe planowane przedsięwzięcie poszerzyć o zaprojektowanie i wybudowanie nowego odcinka sieci wodociągowej oraz oświetlenia drogowego w ciągu projektowanej drogi. Projekt drogi obejmuje również odcinek kanalizacji deszczowej, która zbierze i odprowadzi wodę opadową. Powiększenie zakresu projektu oraz

zawirowania z wyborem przebiegu drogi sprawiły, że fazy projektowania nie udało zakończyć się do końca br. Dlatego Rada Gminy podjęła w dniu 28 grudnia 2019 r. uchwałę o przeniesieniu zadania w tzw. „środki niewygasające” co daje możliwość dokończenia prac projektowych do końca czerwca 2020 roku.

Efekt rzeczowy inwestycji

Została wykonana mapa do celów projektowych oraz sporządzono koncepcję przebiegu i rozbudowy drogi.

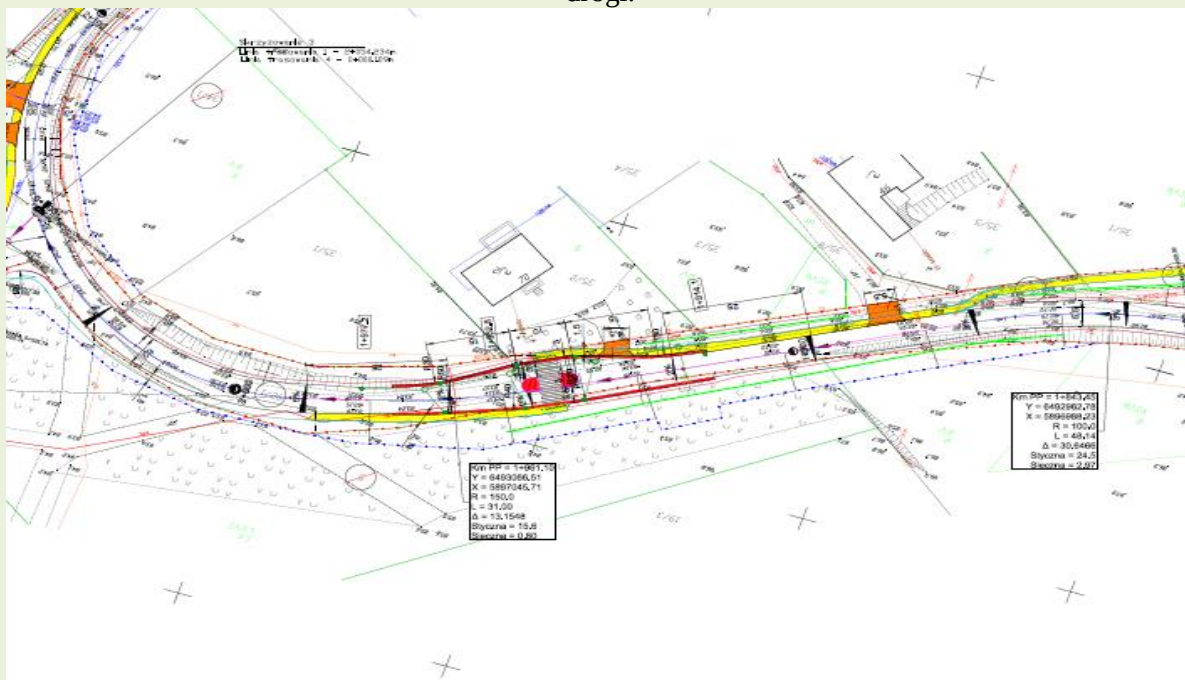

Fot. 35. Wyrys z projektu budowlanego na rozbudowę drogi w Szczutkach.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2019)
55 776,81zł	42 651,48 zł

1.10 Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie – utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej.

Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy tej drogi (tych ulic) na osiedlu mieszkaniowym w Osówcu Wyb. została wykonana w roku 2017. Projekt techniczny przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej na osiedlu, dokończenie budowy oświetlenia drogowego na części ul. Malinowej oraz

wykonanie nawierzchni dróg z brukowej kostki betonowej. Przewidziano elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań. Pobocza drogi zostaną wyhumusowane i obsiane trawą. Zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. W roku 2018 prace nad projektem nie były realizowane z powodu braku środków finansowych. Na początku roku 2019 został ogłoszony konkurs na dofinansowanie budowy dróg lokalnych z rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych. Złożony przez gminę wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów i został przyjęty do dofinansowania w wysokości 1 284 409,00 zł jednak nie więcej niż 50% wartości inwestycji co oznacza, że faktyczna kwota dofinansowania będzie niższa z uwagi na oszczędności przetargowe. W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca robót i podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Zgodnie z jej ustaleniami w listopadzie zostało wykonane oświetlenie drogowe na ul. Malinowej, a pozostałe prace objęte projektem zostaną wykonane w roku 2020.

Efekt rzeczowy inwestycji w 2019 r.

1	Linia kablowa oświetlenia drogowego	172 m
2	Latarnie uliczne z oprawami LED	4 szt.



Fot. 36 i 37. Nowe oświetlenie na ul. Malinowej w Osówcu.



Fot. 38. Nowe oświetlenie drogowe na ul. Malinowej w Osówcu.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita na koniec 2019 r.	Budżet Gminy (Rok 2019)	Plan na rok 2020	
		Budżet Gminy	FDS
54 476,70 zł	25 153,50 zł	1 664 577,45	ok. 850 000,00

1.11 Rozbudowa drogi gminnej G 50313C Osówiec-Dąbrówka Nowa.

Przebieg inwestycji

Można powiedzieć, że jest to droga, która skraca dystans z Sicienka do Bydgoszczy. Dokumentacja techniczna na wykonanie rozbudowy tej drogi została wykonana już w roku 2016. W roku następnym został wydany ZRID. Rok 2018 zaowocował wypłatą odszkodowań za przejęte pod rozbudowę drogi grunty. We wrześniu 2018 roku gmina złożyła wniosek do wojewody o

dofinansowanie tego zadania z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych, gminnych i powiatowych, który od roku 2019 został nazwany Funduszem Dróg Samorządowych. Dotacja taka w wysokości 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych zadania została gminie przyznana. W pierwszych miesiącach roku 2019, w przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca robót tj. firma REDON z Nakła n/Not. Prace budowlane prowadzone były w okresie od maja do końca sierpnia br, a ich efektem jest zupełnie nowa droga o nawierzchni bitumicznej o długości 1607 m i szerokości 5,5 m. W ramach zadania został wykonany chodnik od drogi powiatowej w Osówcu do świetlicy wiejskiej, zjazdy do posesji oraz rowy odwadniające i ścieki przykrawężnikowe do odprowadzania wody. Pobocza, rowy i skarpy zostały wyhumusowane i obsiane trawą. Na skrzyżowaniu dróg w Osówcu i Dąbrówce Nowej zostało zamontowane oświetlenie w postaci lamp solarnych hybrydowych.

Efekt rzeczowy inwestycji w 2019 r.

1	Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m	1 607 m
2	Bitumiczna nawierzchnia drogi	9 440 m ²
3	Chodnik z brukowej kostki betonowej o szerokości 1,5 m	92 m
4	Zjazdy do posesji o nawierzchni bitumicznej	694 m ²
5	Przepusty pod drogą i zjazdami	169 m
6	Roboty w zakresie odwodnienia – ścieki przykrawężnikowe	450 m
7	Bariery drogowe	180 m
8	Latarnie solarne hybrydowe oświetlenia drogowego	2 szt.
9	Kształtowanie terenów zielonych (humusowanie z obsianiem trawą)	4 800 m ²
10	Instalowanie znaków drogowych – oznakowanie pionowe	27 szt.
11	Kompensacja przyrodnicza – nasadzenia drzew (lipa, klon, jarząb)	14 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy	BP - FDS
	Rok 2019	Rok 2019
2 608 248,08 zł	1 219 774,62 zł.	1 218 042,00 zł



Fot. 39. Tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania inwestycji ze środków FDS na 2019 r.



Fot. 40. Droga gminna Osówiec-Dąbrówka Nowa, tak wyglądała przed rozbudową.




Fot. 41 i 42. Wycinka lasu i drzew przydrożnych była konieczna.



Fot. 43 i 44. Nastał czas na wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi.




Fot. 45 i 46. No i na końcu ładna nawierzchnia, pobocza i rowy odwadniające

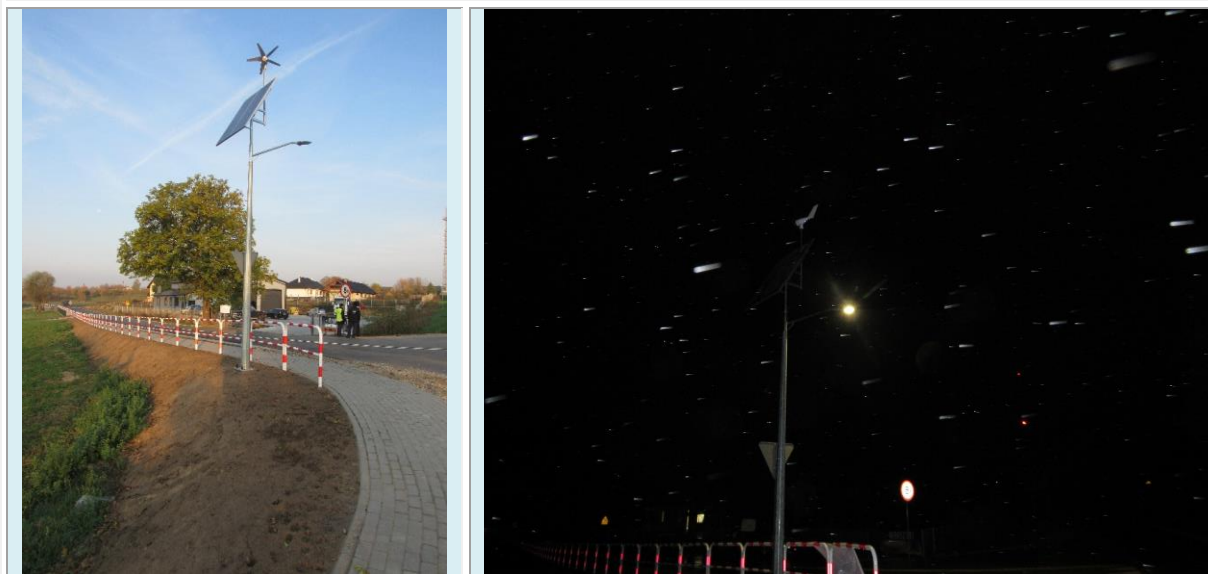

Fot. 47 i 48 Nowe oświetlenie solarne na skrzyżowaniach, w dzień i w nocy.



Fot. 49. W ciągu drogi został wybudowany chodnik do świetlicy wiejskiej w Osówcu.

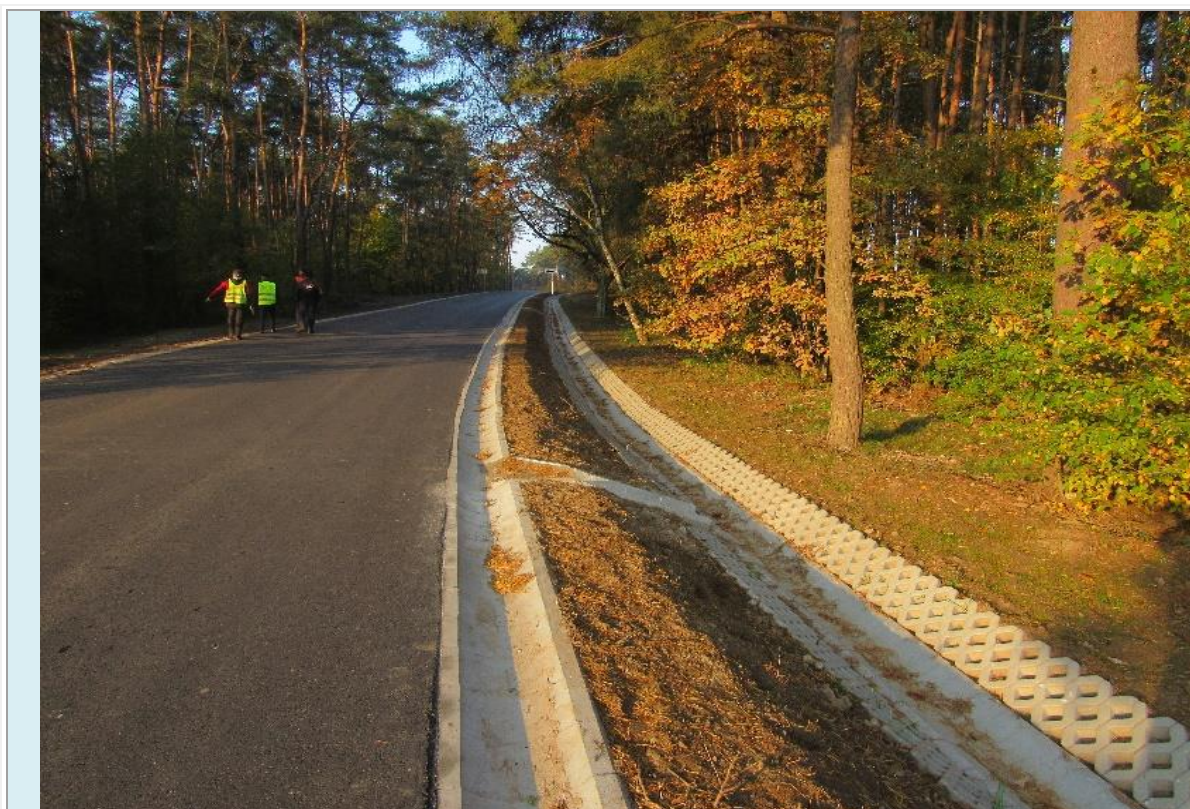

Fot. 50. W barwach jesieni, droga wygląda imponująco.



Fot.51 Słupki kilometrażowe zwiększają bezpieczeństwo ruchu na drodze.

1.12 Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku ul. Mała Góra.**Przebieg inwestycji**

Potrzebę przebudowy drogi – ul. Mała Góra w Pawłówku zgłaszali mieszkańcy tej części miejscowości podczas zebrań wiejskich. Jest to droga, przy której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a jednocześnie łączy drogę krajową nr 10 ze stacją PKP w Pawłówku. Pierwszym etapem przebudowy drogi było opracowanie w roku 2017 dokumentacji technicznej, której podstawowe założenia zostały omówione przez projektanta i uzgodnione z inwestorem i Radą sołecką sołectwa Pawłówek. Po żmudnych ustaleniach dokumentacji technicznej z PKP, opracowanie zostało zakończone i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi przewidziano w budżecie gminy na rok 2019. Wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykonawca prac, wszystkie roboty wykonała w okresie od maja do 15 lipca 2019 r, a ich efektem jest nowa droga o nawierzchni bitumicznej oraz zjazdy do wszystkich posesji.

Inwestycja była współfinansowana z rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019. Kwota dofinansowania stanowi 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Efekt rzeczowy inwestycji w 2019 r.

1	Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4-5 m	416 m
2	Powierzchnia nawierzchni bitumicznej drogi	2 021 m ²
3	Zjazdy do posesji o nawierzchni bitumicznej	206 m ²
4	Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej	62 m ²
5	Kształtowanie terenów zielonych (humusowanie i obsianie trawą)	808 m ²
6	Oznakowanie pionowe (nowe znaki drogowe)	12 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy	BP - FDS
	Rok 2019	Rok 2019
533 607,62 zł	263 199,73 zł	261 745,00 zł



Fot. 52. Tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania inwestycji ze środków FDS.



Fot. 53. Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne na ul. Mała Góra w Pawłótku.



Fot. 54. Ul. Mała Góra w Pawłówku po przebudowie.



Fot. 55. Droga, ul. Mała Góra w Pawłówku po przebudowie.



Fot. 56. Skrzyżowanie ul. Mała Góra z drogą krajową nr 10 w Pawłówku.

1.13 Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2 – opracowanie dokumentacji technicznej.


Przebieg inwestycji

Droga będąca celem planowanego przedsięwzięcia jest typową drogą osiedlową przebiegającą przez teren zwartej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w miejscowości Wojnowo. O budowę drogi wnioskowali mieszkańcy sołectwa Wojnowo podczas zebrań wiejskich i w roku 2018 uznali budowę drogi za zadanie priorytetowe i podjęli uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 32 tys. zł na wykonanie w roku 2019 dokumentacji technicznej na budowę drogi. Celem projektu jest wykonanie nowej nawierzchni drogi, jej odwodnienie oraz zapewnienie dojazdu do wszystkich budynków mieszkalnych, które takiego dojazdu nie mają od strony drogi wojewódzkiej nr 244. Zrealizowanie celu drugiego wymaga wykupu części terenu stanowiącego własność wspólnot mieszkaniowych poszczególnych bloków mieszkalnych. Dlatego mieszkańcy poszczególnych wspólnot podjęli uchwały o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz gminy niezbędnego terenu do wykonania tzw. chwytnicy w celu zapewnienia dojazdu do każdego budynku mieszkalnego. W dalszej kolejności została wykonana mapa do celów projektowych i opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę drogi. Projekt przewiduje wykonanie drogi o nawierzchni z brukowej kostki betonowej, odwodnienie drogi

nastąpi do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) i zapewnieniem środków finansowych na ich wykonanie.

Efekt rzeczowy inwestycji

1. Została wykonana mapa do celów projektowych.
2. Została wykonana dokumentacja techniczna i podziały geodezyjne niezbędne do uzyskania zrid.

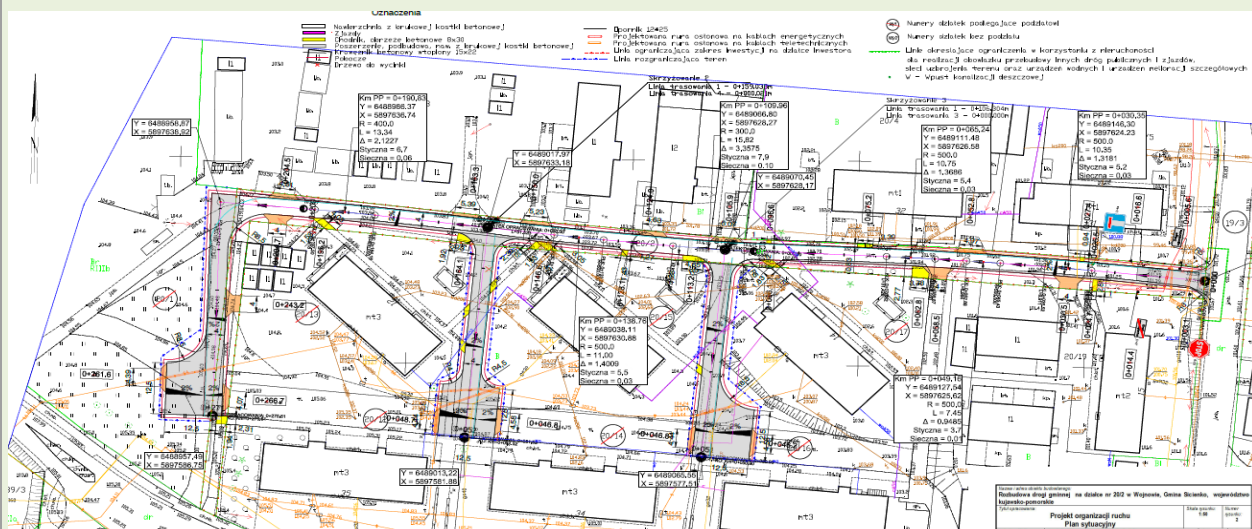

Fot. 57. Wyrzys z dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi w Wojnowie.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
31 906,20 zł	31 906,20 zł

1.14 Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu - opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji

Do niewielkiej miejscowości Trzciniec w gminie Sicienko nie dochodzi żadna droga o nawierzchni twardej. Z tego względu na wniosek wójta gminy do budżetu gminy na rok 2019 zostało wprowadzone przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Właściwe zaprojektowanie drogi wymaga wykupu terenu pod budowę, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. Z tego też


względu, z uwagi na długi czas oczekiwania na decyzje administracyjne wydawane przez inne organy, prac projektowych nie udało zakończyć się w br. Dlatego Rada Gminy podczas sesji w dniu 28.12.2019 r. podjęła uchwałę o przeniesieniu tego zadania do tzw. „środków niewygasających” co pozwala zrealizować to przedsięwzięcie w ramach tegorocznego budżetu w terminie do końca czerwca roku 2020. Opracowywany projekt techniczny przewiduje wykonanie rozbudowy drogi o długości ok. 1100 m i szerokości 4 m z poboczymi po 0,75 m dla ruchu KR 1 o nawierzchni bitumicznej. Z uwagi na niewielką szerokość jezdni przewiduje się także wykonanie 2 zatok mijankowych.

Efekt rzeczowy inwestycji

1	Została wykonana mapa do celów projektowych	kpl. 1
2	Została wykonana koncepcja projektu drogi i podziałów geodezyjnych niezbędnych do uzyskania zrid	kpl. 1

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
46 887,60 zł	46 887,60 zł

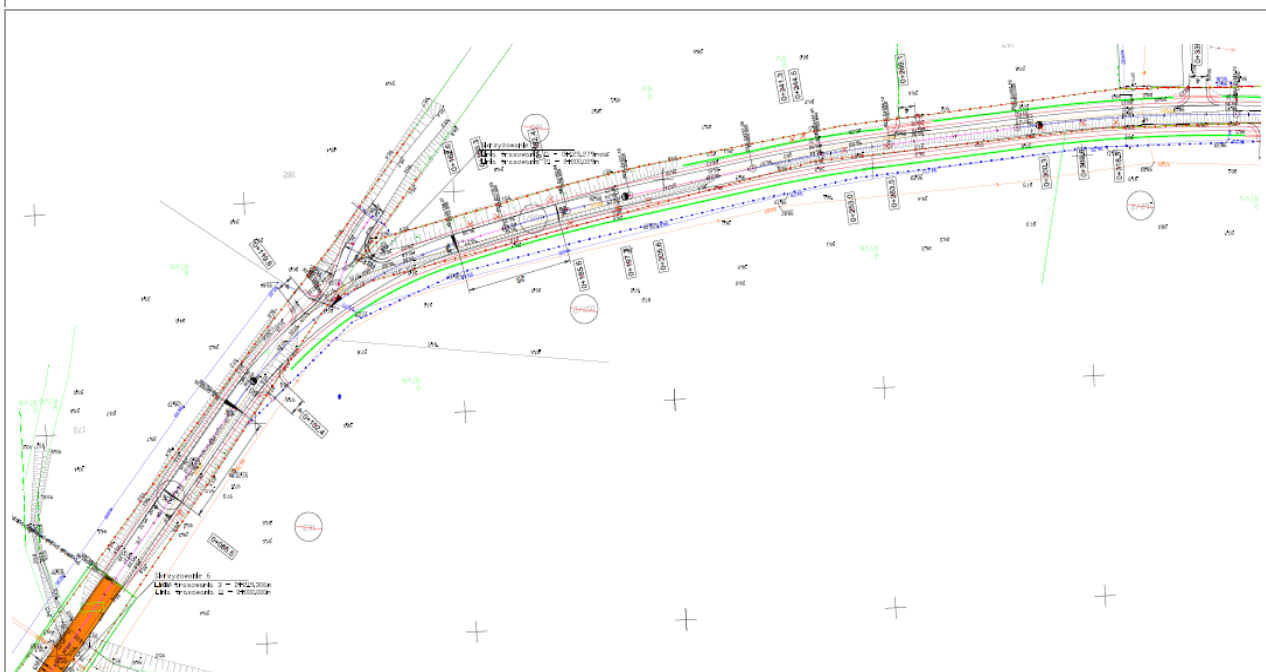

Fot. 58. Fragment drogi do Trzcínca- wyrys z dokumentacji technicznej.

1.15 Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko - Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji

Ambitne, ale też niezwykle istotne dla gminy zadanie inwestycyjne. Droga Sicienko-Dąbrówka Nowa, jest jedną z najważniejszych dróg w gminie. Skomunikowana jest z drogą wojewódzką nr 244 i dalej z drogą krajową nr 10 w Zielonczynie. Drogą tą, dzięki wybudowaniu w br. drogi Dąbrówka Nowa – Osówiec można szybko i krócej dojechać przez Osówiec do Bydgoszczy. Droga ta często stanowi alternatywny objazd dla wszystkich pojazdów (również Tirów) w przypadku coraz częstszych kolizji i wypadków na drodze krajowej nr 10. Obecnie droga jest w złym stanie technicznym i wymaga szybkiej interwencji. Jej rozbudowa będzie bardzo kosztowna, ale ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych i zapowiadane na ten cel środki finansowe dają nadzieję dofinansowania planowanego przedsięwzięcia z tego funduszu. Dlatego została podjęta decyzja o przygotowaniu w roku 2019 dokumentacji technicznej, a w roku 2020 złożenia wniosku o dofinansowanie z FDS na rok 2021. Po opracowaniu mapy do celów projektowych wyłoniono projektanta drogi i przystąpiono do właściwych prac projektowych. W trakcie opracowywania dokumentacji wykonano ocenę oddziaływania na środowisko i uzyskano decyzję środowiskową oraz operat wodnoprawny, w oparciu o który Przedsiębiorstw Państwowe Wody Polskie wydało decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym. Rozbudowa drogi wymaga zajęcia nowych terenów, dlatego niezbędnym było ustalenie granic prawnych nieruchomości i wykonanie podziałów geodezyjnych. Projekt budowlany przewiduje wykonanie drogi o długości ok. 2,5 km i szerokości jezdni 5,8 m, konstrukcja drogi dla ruchu KR2. W ciągu drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 2,5 m, kilka przepustów, poprawę widoczności na skrzyżowaniach z drogami przyległymi oraz zatoki autobusowe. Lepsze od obecnego będzie także skomunikowanie drogi z drogą wojewódzką nr 244 w Dąbrówce Nowej.


W dniu 31.10.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid).

Efekt rzeczowy inwestycji

1	Została wykonana dokumentacja techniczna i kosztorysowa oraz podziały geodezyjne	kpl.1
2	Został złożony w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy wniosek o wydanie decyzji zrid	kpl.1

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
111944,76 zł	111 944,76 zł

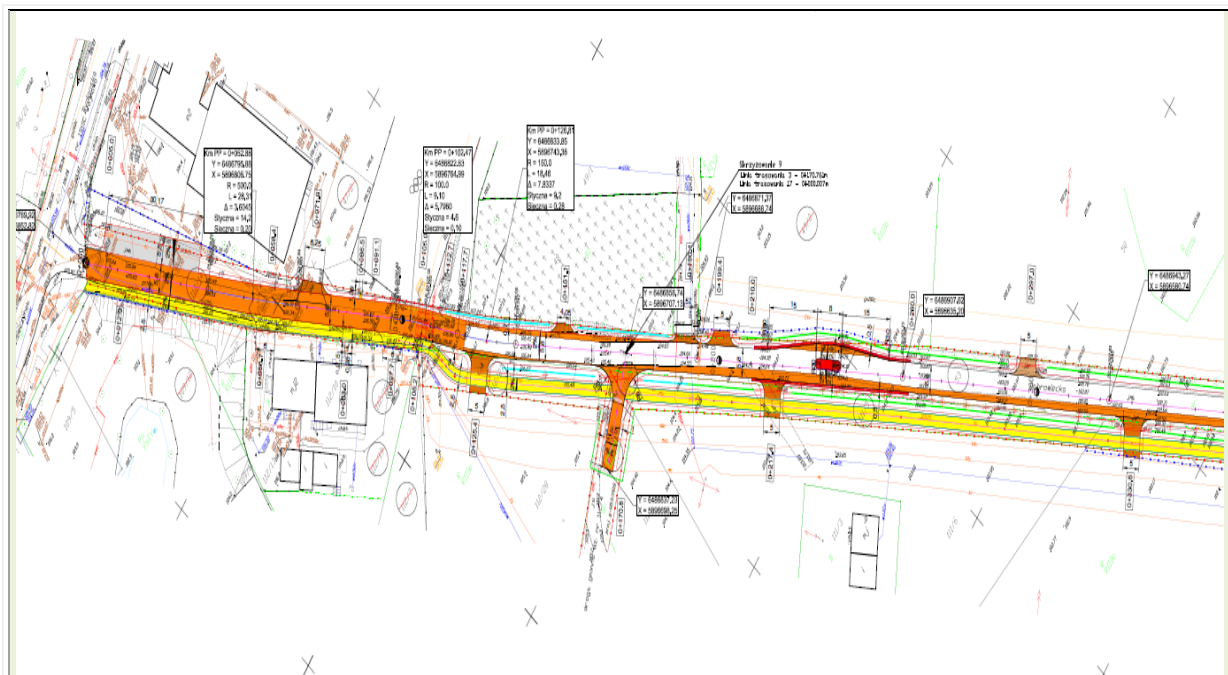

Fot. 59. Wyrys odcinka drogi z dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi Sicienko-Dąbrówka Nowa.

a. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo – Mochle – pomoc finansowa na wykup gruntów.

Przebieg inwestycji

W roku 2015 za środki finansowe gminy została opracowana dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 z Wojnowa do Mochla. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą a Urzędem Marszałkowskim dokumentacja techniczna została przekazana do ZDW w Bydgoszczy, który w roku 2016 wybudował przedmiotową ścieżkę rowerową. Gmina partycypowała również w kosztach wykonania robót budowlanych. Dodatkowo gmina zobowiązana była do udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wykup terenu zajętego pod budowę. Pomoc ta udzielona była w latach 2017 i 2018, a ostatnia transza tej pomocy przypadła na rok 2019. Tym samym całe zadanie zostało rozliczone. Wyplata odszkodowań w trzech kolejnych latach wynikała ze względów formalno-prawnych i wnoszonych odwołań od decyzji wydawanych przez wojewodę.

Efekt rzeczowy inwestycji

1. Została przekazana ostatnia transza pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wykup gruntu zajętego pod ścieżkę pieszo-rowerową.



Fot. 60. Wybudowana w roku 2016 ścieżka pieszo-rowerowa z Wojnowa do Mochla.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy - 2019
1 202 181,09 zł	72 570,00 zł

1.17 Remont drogi powiatowej 1528C Trzęmiętówko - Sicienka polegający na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienka przy ul. Mrteckiej, do ul. Polnej I etap - pomoc finansowa

Przebieg inwestycji

Od kilku lat mieszkańcy ulic: Mrteckiej, Wiklinowej i Polnej w Sicienku zabiegali o wybudowanie chodnika w ciągu ul Mrteckiej, która jest częścią drogi powiatowej 1528C. W br. władze gminy zawarły porozumienie ze Starostą Bydgoskim, na mocy którego powiat zlecił wykonanie dokumentacji technicznej i przystąpił do budowy chodnika jako I etap. Został wybudowany chodnik o długości 285 m, o nawierzchni z brukowej kostki betonowej. Gmina na wykonanie tego zadania udzieliła pomocy finansowej na rzecz powiatu w wysokości 180 tys. zł. Zgodnie z deklaracją starosty II etap zadania (do ul. Polnej) ma być wykonany w roku 2020.

Efekt rzeczowy inwestycji

1. Dokumentacja techniczna na budowę chodnika od ul. Klonowej do ul. Polnej.
2. Chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o długości 285 m.



Fot. 61. Chodnik w ciągu ul. Mroteckiej w Sicienکو – etap I.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy	Powiat Bydgoski
343 170,00 zł	180 000,00 zł	163 170,00 zł

1.18 Remont drogi gminnej na dz. nr 174/2 w Mochlu.**Przebieg zadania**

Zadanie polegało na wykonaniu remontu drogi dojazdowej o niewielkiej długości, bo zaledwie 35 m w Mochlu. Droga ta bezpośrednio skomunikowana jest z drogą, która była w br. przebudowywana. Dlatego podjęto decyzję, aby również ten krótki odcinek drogi wyremontować. Zadanie zostało zlecone do wykonania przez Zakład Komunalny w Sicienکو. W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię drogi z płyt ażurowych.

Efekt rzeczowy zadania

1	Droga o nawierzchni z płyt ażurowych	35 m
---	--------------------------------------	------

Struktura finansowania zadania	
Wartość całkowita	Budżet Gminy
26 910,68 zł	26 910,68 zł



Fot. 62. Remont drogi w Mochlu.

1.19 Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienku – opracowanie dokumentacji technicznej.


Przebieg inwestycji

W centrum Sicienka brakuje miejsc parkingowych. Znaczną część istniejących miejsc parkingowych zajmują samochody pracowników Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego. Niestety brakuje też dogodnego terenu gdzie można byłoby parking wybudować. Dlatego analizując obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dla Sicienka, podjęto decyzję, aby zaprojektować budowę drogi stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie na wolnej działce za budynkiem urzędu gminy utwardzić teren, na

którym możliwe będzie parkowanie samochodów przez pracowników urzędu gminy. Wykonana dokumentacja zakłada wybudowanie drogi o nawierzchni z brukowej kostki betonowej oraz utwardzenie ternu bezpośrednio przylegającego do drogi z płyt ażurowych, które będą przepuszczały wodę opadową i stanowić będą miejsca parkingowe. Wykonanie tego projektu zwolni miejsca parkingowe przy ul. Mroteckiej i Sportowej w Sicienku. Starosta Bydgoski na podstawie złożonej dokumentacji technicznej wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja projektu nastąpi w latach kolejnych.

Efekt rzeczowy inwestycji

1. Została sporządzona dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim.
2. Starosta Bydgoski wydał decyzję zrid.

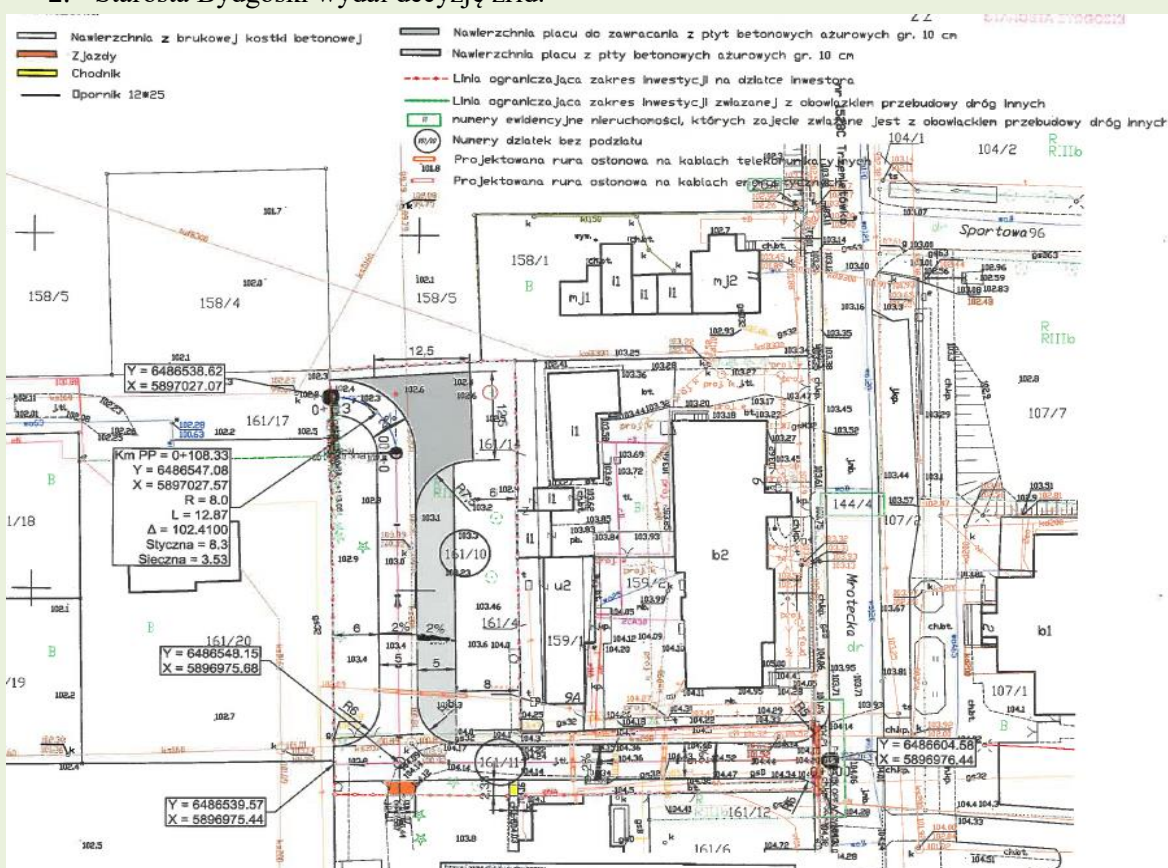

Fot. 63. Wyrys z dokumentacji technicznej na realizację zadania.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
8 238,54 zł	8 238,54 zł

1.20 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych.

Realizacja zadania	
Jak w roku poprzednim pracownicy starostwa powiatowego w Bydgoszczy dokonali przeglądu dróg powiatowych na terenie gminy i wybrali najbardziej zniszczone odcinki dróg, które wymagają najpilniejszej naprawy poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej. W tym roku wskazano na trzy takie odcinki o łącznej długości całkowitej 1396 m. Prace budowlane zostały wykonane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym.	
Efekt rzeczowy zadania	
Wykonano nakładki bitumiczne na odcinkach dróg powiatowych na terenie gminy Sicienko tj: a) Droga powiatowa nr 1909 C Krukówko-Wierzchucinek-Witoldowo (odcinek Samsieczno - Gliszcz) – $925,85\text{ m} \times 5,2\text{ m} = 4\,814,42\text{ m}^2$. b) Droga powiatowa nr 1910 C Samsiecznynek - Wojnowo (miejscowość Ugoda) – $330\text{ m} \times 5,5\text{ m} = 1\,815\text{ m}^2$. c) Droga powiatowa nr 1910 C Samsiecznynek - Wojnowo (miejscowość Ugoda) – $140\text{ m} \times 5,2\text{ m} = 728\text{ m}^2$. Remont na w/w drogach powiatowych polegał na ułożeniu warstwy ścieralnej o grub. 4 cm. Powierzchnia wyremontowanych dróg powiatowych to 7 357,42 m². Łączna długość wyremontowanych dróg powiatowych to 1 396 m.	
Struktura finansowania zadania	
Wartość całkowita	Powiat Bydgoski
324 903,66 zł	324 903,66 zł



Fot. 64. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Samsieczno-Gliszcz.



Fot. 65. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej przez Ugodę.

1.21 Zakup kruszywa do remontu dróg.**Realizacja zadania**

Na terenie gminy Sicienko duża część dróg ma nawierzchnię wykonaną z tłucznia kamiennego. Każdego roku przybywają również nowe odcinki wykonane w takiej technologii. Na ich wykonanie oraz właściwe utrzymanie stanu nawierzchni istniejących dróg zachodzi potrzeba zakupu kruszywa kamiennego. W roku 2019 gmina zakupiła łącznie na ten cel 3 000 ton kruszywa granitowego oraz 2 000 ton gruzu budowlanego.

Materiał ten został wbudowany w drogi gminne przez Zakład Komunalny w Sicienku.

Efekt rzeczowy zadania

1	Kruszywo kamienne GRANIT	3 000 ton
2	Gruz budowlany	2 000 ton

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
333 555,73 zł	333 555,73 zł



Fot. 66. Kruszywo do naprawy i budowy dróg.


1.22 Budowa odcinka drogi gminnej nr G 50305C Samsieczno - Marynin-odcinek I od km 0+180 do km 0+603,60.

Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej została przygotowana w roku 2017. Całkowita długość drogi do budowy to 2 547 m. W roku 2018 został wybudowany pierwszy odcinek drogi od km 0+000 do km 0+180. Był to odcinek do końca zabudowy mieszkaniowej wsi Samsieczno. Zadanie to współfinansowane było przez Urząd Marszałkowski z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W roku 2019 gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych. Z uwagi na wysoki koszt budowy drogi, zadanie zostało podzielone na trzy odcinki. Złożony wniosek został przyjęty do współfinansowania z FDS. Dlatego pod koniec roku 2019 został w przetargu wyłoniony wykonawca robót, firma COLOS, która w roku 2020 wybuduje pierwszy odcinek drogi od km 0+180 do km 0+603,60. W celu możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej należało zaktualizować kosztorys inwestorski za kwotę 1 968 zł.

Efekt rzeczowy inwestycji

1. Został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z FDS, który został pozytywnie oceniony i przyjęty do dofinansowania.
2. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót, który w roku 2020 wybuduje pierwszy odcinek drogi.

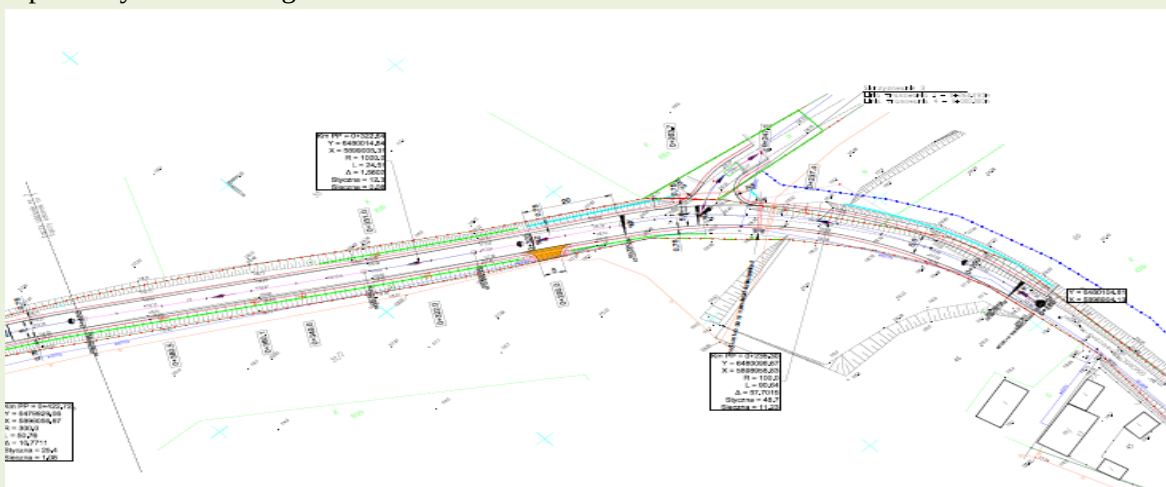

Fot.67. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę drogi Samsieczno-Marynin, I etap.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy -2019
431 926,58 zł	1 968,00 zł

Rozdział III. Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie obiektów kubaturowych.**1. Spis zrealizowanych inwestycji:****1) OBIEKTY KOMUNALNE**

- 1.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicieniu, opracowanie dokumentacji i studium wykonalności.
- 1.2 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicieniu.
- 1.3 Remont pomieszczeń w budynku na ul. Sportowej 2 z przeznaczeniem na pomieszczenia GOPS.
- 1.4 Remont budynku w Wojnowie 18 - opracowanie dokumentacji technicznej.

2) BUDYNKI GOK

- 2.1 Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie.

3) BUDYNKI OŚWIATOWE

- 3.1 Przystosowanie budynku SP w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych.

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie	kpl.	1
2.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicieniu	kpl.	1
3.	Remont pomieszczeń w budynku na ul. Sportowej 2	kpl.	1
4.	Przystosowanie budynku SP w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	kpl.	1

3. Struktura finansowania zadań remontowych i inwestycyjnych w 2019 roku:


Struktura finansowania inwestycji w zakresie obiektów kubaturowych		
<i>Wartość całkowita</i>	<i>Budżet Gminy</i>	<i>Dofinansowanie Budżet Państwa</i>
1 650 567,19 zł	1 415 567,19 zł	235 000,00 zł

1) OBIEKTY KOMUNALNE

1.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienکو opracowanie dokumentacji i studium wykonalności.

Przebieg inwestycji

W roku 2018 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku urzędu gminy w Sicienکو. Prace projektowe zostały zakończone w pierwszych miesiącach br. W związku z faktem ogłoszenia konkursu na dofinansowanie tego typu projektów z RPO WK-P na lata 2014-2020, zostało wykonane Studium Wykonalności projektu, które jest niezbędnym załącznikiem do wniosku. W maju br. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, o czym gmina została poinformowana w połowie grudnia br. W dniu 20 grudnia 2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Prace budowlane planowane są do wykonania w roku 2020.



Efekt rzeczowy inwestycji

1	Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych	kpl. 1
2	Studium Wykonalności projektu	kpl. 1
3	Pozytywnie zweryfikowany wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT BTOF	kpl. 1

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2019)
30 950,20	24 125,00



Fot. 68. Wyrys z dokumentacji technicznej-wygląd zaprojektowanej elewacji budynku .



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1.2 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku.

Przebieg inwestycji

Systematycznie zwiększający się zakres spraw, do prowadzenia których samorząd gminny jest zobowiązany, zwiększająca się liczba mieszkańców gminy i związana z powyższym zmiana regulaminu organizacyjnego urzędu gminy oraz wola świadczenia usług na rzecz mieszkańców na najwyższym poziomie, a także zapewnienie pracownikom dobrych warunków pracy wywołują potrzebę modernizacji budynku urzędu gminy. Z powyższych względów w roku bieżącym przystąpiono do częściowej modernizacji budynku urzędu. W połowie roku 2019 została zamontowana na piętrze budynku klimatyzacja oraz prowadzono prace projektowe na modernizację części pomieszczeń budynku. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe oraz czas oczekiwania na przyjęcie przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę nie udało się wykonać pozostałych prac. Przeprowadzono jednak postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Rada Gminy Sicienko w dniu 28 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę o



przeniesieniu zadania do wydatków niewygasających co pozwala na dokończenie zadania w ramach wydatków budżetowych roku 2019 do dnia 30.04.2020 r.

Efekt rzeczowy inwestycji

1. System klimatyzacji pomieszczeń na I piętrze budynku urzędu gminy – 14 biur.
2. Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na modernizację części pomieszczeń budynku.
3. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 2.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
207 936,05 zł	207 936,05 zł

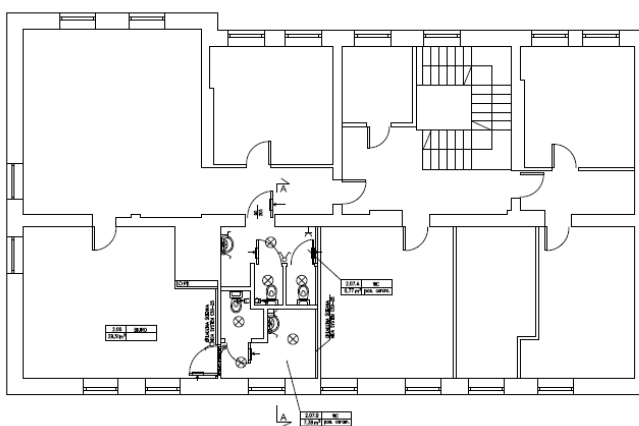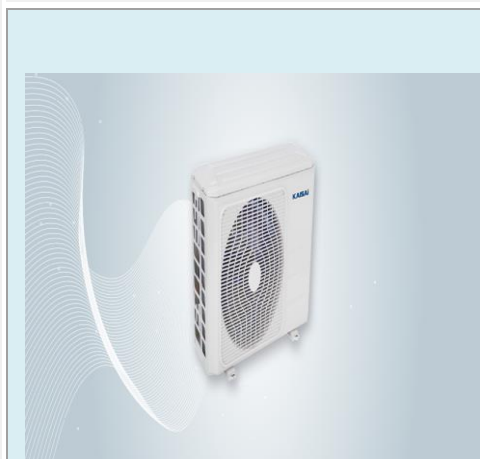

Fot.69. Klimatyzacja system multi split. Fot.70. Wyrzys z projektu na modernizację budynku.

1.3 Remont pomieszczeń w budynku na ul. Sportowej 2, z przeznaczeniem na pomieszczenia GOPS.

Realizacja zadania

W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego urzędu gminy została podjęta decyzja o zmianie lokalizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku. Dobrym miejscem pod nową siedzibę GOPS-u okazały się, wolne pomieszczenia po posterunku Policji, w budynku komunalnym przy ul. Sportowej 2. Ich stan techniczny wymagał jednak przeprowadzenia remontu. Dlatego sporządzono

niezbędną dokumentację, wyłoniono wykonawcę robót i w okresie letnim prace te zostały wykonane. Wyremontowane biura zostały wyposażone w nowe meble. Został przystosowany również system informatyczny zapewniający łączność z budynkiem urzędu gminy przy ul. Mroteckiej 9.

Efekt rzeczowy zadania

1. Wyremontowane pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem przy ul Sportowej 2 na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, w tym:
 - remont ścian i sufitów,
 - wymiana grzejników c.o. i płukanie instalacji,
 - wymiana podłóg,
 - remont WC i wydzielenie części socjalnej,
 - wydzielenie z części komunikacyjnej dodatkowego biura,
 - wymiana stolarki drzwiowej,
 - remont klatki schodowej,
 - wymiana instalacji elektrycznej.
2. Wyposażenie biur.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
77 932,40 zł	77 932,40 zł



Fot.71. Pomieszczenia GOPS w Sicienku przy ul. Sportowej 2.



Fot.72. Nowe pomieszczenie biurowe dla GOPS, przy ul. Sportowej 2 w Sicienku.

1.4 Remont budynku w Wojnowie 18 - opracowanie dokumentacji technicznej.

Realizacja zadania


Zmiana systemu oświaty i likwidacja gimnazjum sprawiło, że zwolniło się miejsce m.in. w budynku szkolnym w Wojnowie. Dlatego podjęto decyzję, aby oddziały przedszkolne w Wojnowie przenieść od 1 września 2019 r. do budynku szkoły. Tym samym obecny budynek przedszkola w Wojnowie można przeznaczyć na inny, społecznie oczekiwany cel. Mieszkańcy Wojnowa oczekują, aby do tego budynku przenieść świetlicę wiejską. Aby to zrobić należy wykonać remont tego obiektu, a będzie to wymagało środków finansowych. Pomocnym w poszukiwaniu tych środków okazał się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który poprzez LGD „Trzy Doliny” zapowiedział na I kw. 2020 roku konkurs na dofinansowanie tego typu projektów. Z tego względu w roku 2019 została przygotowana dokumentacja techniczna na wykonanie remontu budynku pod funkcję świetlicy wiejskiej w Wojnowie.

Efekt rzeczowy projektu

1. Dokumentacja techniczna na wykonanie remontu budynku Wojnowo 18.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
6 150,00 zł	6 150,00 zł

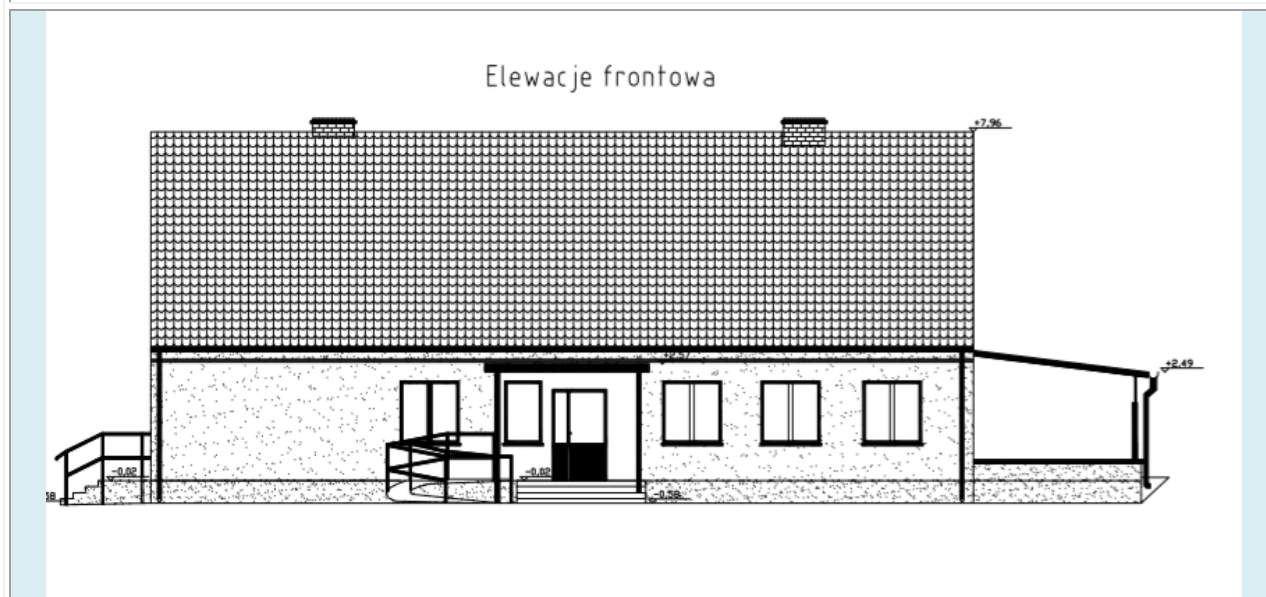

Fot.73. Wyrys z dokumentacji technicznej na remont budynku Wojnowo 18.

2) BUDYNKI GOK

2.1. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie.

Przebieg inwestycji

Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Teresinie nastąpiło w połowie roku 2018. Zgodnie z harmonogramem prac do końca roku 2018 wykonano stan surowy zamknięty obiektu oraz przystąpiono do wykonania robót wewnętrznych i wykończeniowych. Prace te kontynuowane były od początku roku 2019 i przebiegały bardzo sprawnie. Ich wykonawcą była firma budowlana Pana Jacka Jakubczaka z Bydgoszczy. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięto na koniec lutego br. Procedury odbiorowe nowego obiektu przeprowadzono w marcu 2019 r, a uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej OSP Teresin, która jest częścią obiektu nastąpiło w maju 2019 r. W ramach projektu został wykonany nowy obiekt świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej, wyposażony w meble świetlicowe, sprzęt i meble kuchenne, sprzęt audiowizualny. Teren działki został w całości ogrodzony, obsiany trawą

i zagospodarowany oraz wyposażony w stoły i ławki parkowe, zostały utwardzone kostką brukową dojścia, dojazdy i miejsca parkingowe. Do ogrzewania budynku zastosowano Odnawialne Źródła Energii – pompa ciepła.

Efekt rzeczowy inwestycji

1	Budynek kubaturowy jednokondygnacyjny świetlicy wiejskiej i remizy OSP	1 szt.
2	Przyłącza zewnętrzne: wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne	1 kpl.
3	Instalacje wewnętrzne: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjna, c.o. i c.w.u, teletechniczna, odgromowa	1 kpl.
4	Zagospodarowanie działki: ogrodzenie, zieleń, mała architektura, chodniki, parking	1 kpl.
5	Wyposażenie: świetlicy, zaplecza kuchennego, sanitariatów, remizy OSP	1 kpl.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2019)
986 819,70 zł	730 918,69 zł



Fot. 74. Plan zagospodarowania działki w Teresinie.



Fot. 75. Budynek świetlicy wiejskiej w Teresinie w trakcie budowy.



Fot. 76. Sala główna świetlicy z wyposażeniem.



Fot. 77. System ogrzewania budynku.

3) BUDYNKI OŚWIATY

3.1 Przystosowanie budynku SP w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych.

Przebieg inwestycji		
Zmiana systemu oświaty i likwidacja gimnazjum sprawiło, że w budynku SP w Wojnowie zwolniło się miejsce, aby przenieść do tego budynku oddziały przedszkolne, które dotychczas znajdowały się w innym budynku, oddalonym od szkoły kilkaset metrów. Działanie takie pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania przedszkola, poprawi warunki dla przedszkolaków oraz zwiększy ilość miejsc przedszkolnych w Wojnowie. Aby to uzyskać niezbędnym było wykonanie modernizacji budynku szkoły. Należało przeprowadzić modernizację segmentów B i C szkoły. W segmencie B zostały wyremontowane trzy sale lekcyjne pod potrzeby szkoły natomiast w segmencie C wyremontowano trzy duże sale pod potrzeby przedszkola, ciągi komunikacyjne, pomieszczenie świetlicy, pokój dla nauczycieli przedszkola, pomieszczenie techniczne oraz sanitariaty. W ramach zadania w celu zapewnienia bezpośredniego dojścia do przedszkola, został wybudowany chodnik oraz droga wewnętrzna z miejscami postojowymi. Cały projekt możliwy był do wykonania dzięki dotacji w kwocie 235 000,00 zł, jaka została pozyskana przez gminę z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rok 2019 będącej w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów.		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1	Modernizacja sal lekcyjnych nr 41,42 i 48 w segmencie B	1 kpl.
2	Modernizacja pomieszczeń nr 61, 62, 63, 68 i 69 w segmencie C	1 kpl.
3	Modernizacja sanitariatów nr 64 i 65 z przystosowaniem ich dla potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym	1 kpl.
4	Modernizacja sanitariatu (nr 66) i pomieszczenia socjalnego (nr 67)	1 kpl.
5	Modernizacja ciągów komunikacyjnych	1 kpl.
6	Droga dojazdowa o nawierzchni z kruszywa o szer. 4 m	66 m
7	Chodnik z nawierzchni z brukowej kostki betonowej, szer. 1,5 m	98 m
8	Plac z miejscami postojowymi o nawierzchni z kruszywa	193 m ²
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita	Budżet Gminy	Budżet Państwa
603 505,05 zł	368 505,05 zł	235 000,00 zł



Fot. 78. Sala lekcyjna w segmencie B.



Fot. 79. Sala przedszkolna w segmencie C.



Fot. 80. Wyremontowano ciągi komunikacyjne oraz wymieniono stolarkę drzwiową.



Fot. 81. Nowe sanitariaty dla potrzeb oddziałów przedszkolnych w Wojnowie.



Fot. 82. Chodnik do przedszkola oraz droga dojazdowa z miejscami postojowymi.

Rozdział IV. Inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

- 1.1 Budowa Placu zabaw w Sicienku -opracowanie dokumentacji technicznej.
1.2 Budowa Placu zabaw w Wojnowie -opracowanie dokumentacji technicznej.

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Ilość
1.	Dokumentacja techniczna na budowę placu zabaw w Sicienku	1 kpl.
2.	Dokumentacja techniczna na budowę placu zabaw w Wojnowie	1 kpl.

3. Struktura finansowania inwestycji w 2019 roku:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie sportu,	
Wartość całkowita	Budżet Gminy
8 675,27 zł	8 675,27 zł

1.1 Budowa Placu zabaw w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji

Istniejący w Sicienku przy ul. wykorzystywany jest głównie przedszkola. W związku z tym pracy przedszkola dla innych mieszkańcy zabiegają o budowę dla wszystkich dzieci przez cały lokalizacją pod plac zabaw budynku ITK w centrum roku opracowano dokumentację Starostwie Powiatowym w nie wymagających pozwolenia przygotowany i złożony planowanego przedsięwzięcia ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dedykowanych Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny”, której nasza gmina jest członkiem. W przypadku uzyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany w roku 2020.




Sportowej 2 plac zabaw przez dzieci uczęszczające do niedostępny jest w godzinach dzieci. Z tego względu innego placu zabaw dostępnego dzień. Uznano, że dobrą będzie zielony teren przy Sicienka. W ciągu bieżącego techniczną oraz dokonano w Bydgoszczy zgłoszenia robót na budowę. Następnie został wniosek o dofinansowanie

Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Dokumentacja techniczna na budowę placu zabaw	1 kpl.
2.	Wniosek o dofinansowanie zadania z PROW na lata 2014-2020	1 kpl.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy
4 675,27 zł		4 675,27 zł



Fot. 83. Teren na którym zaplanowano budowę placu zabaw dla dzieci w Sicienku.

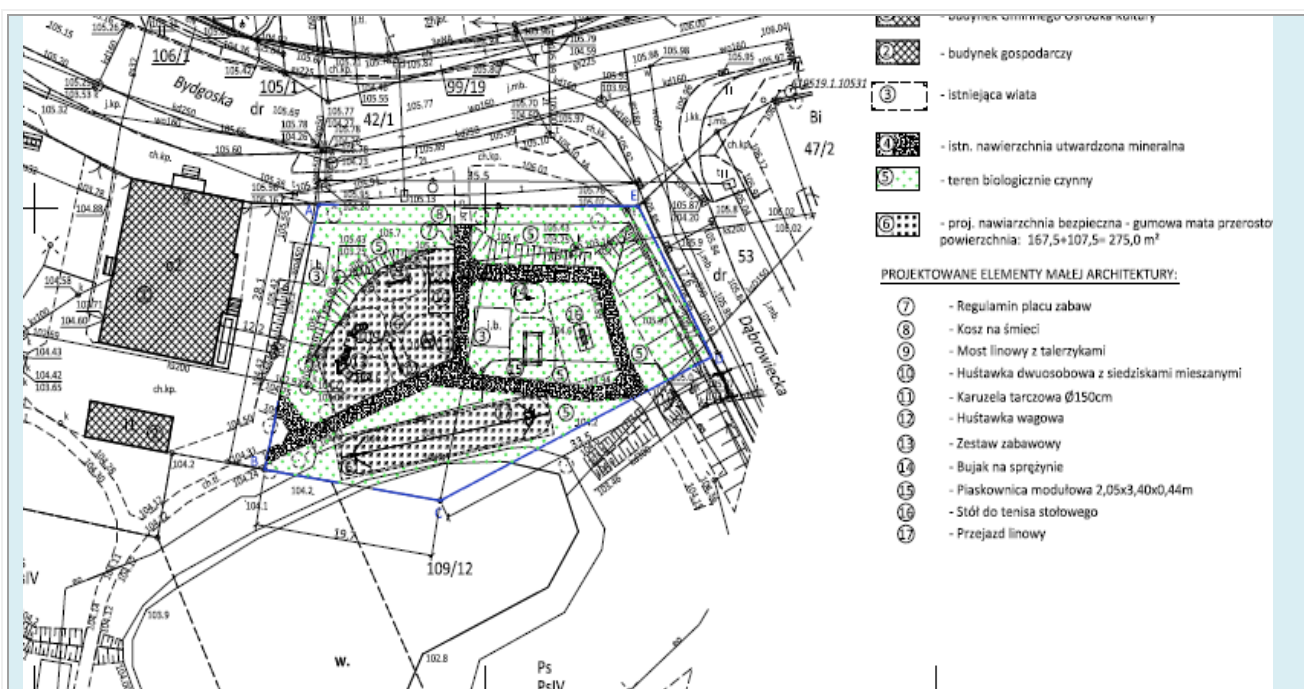

Fot. 84. Wyciąg z dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w Sicienku.

1.2 Budowa Placu zabaw w Wojnowie -opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji

Z dniem 1 września 2019 r. w Wojnowie zostało przniesione przedszkole do budynku Szkoły Podstawowej. W związku z tym zachodzi potrzeba wybudowania na terenie szkoły placu zabaw dla dzieci. Dlatego w ciągu bieżącego roku opracowano dokumentację techniczną oraz dokonano w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Następnie przygotowany i złożony wniosek o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dedykowanych Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny”, której nasza gmina jest członkiem. W przypadku uzyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany w roku 2020.



został

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Dokumentacja techniczna na budowę placu zabaw	1 kpl.
2.	Wniosek o dofinansowanie zadania z PROW na lata 2014-2020	1 kpl.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
4 000,00 zł	4 000,00 zł



Fot. 85. Teren, na którym zaplanowano budowę placu zabaw dla dzieci w Wojnowie.



Fot. 86. Wyciąg z dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w Wojnowie.

Rozdział V. Zakupy inwestycyjne.

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

1.1 Zakup samochodu dostawczego na potrzeby brygady gospodarczej.

1.2 Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy.

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Samochód dostawczy	szt.	1
2.	Samochód osobowy	szt.	1

3. Struktura finansowania inwestycji w 2019 roku:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie zakupów inwestycyjnych	
<i>Wartość całkowita</i>	<i>Budżet Gminy</i>
69 500,00 zł	69 500,00 zł

1.1 Zakup samochodów na potrzeby Urzędu Gminy.

Przebieg inwestycji	
W ciągu roku 2019 zostały postawione w stan likwidacji dwa samochody używane do realizacji zadań gminy. Były to: samochód Peugeot Boxer, wykorzystywany przez brygadę gospodarczą oraz samochód Volkswagen. Obydwa samochody użytkowane były przez ponad 20 lat, miały bardzo duży przebieg i ulegały częstym awariom, co niekorzystnie wpływało na organizowanie pracy. Dlatego została podjęta decyzja o zakupie innych samochodów. Ze względów finansowych postanowiono kupić samochody używane, ale w dobrym stanie technicznym. I tak, na potrzeby brygady gospodarczej w Urzędzie Gminy, został zakupiony samochód Peugeot Furgon (Fot.87), rok produkcji-2011, z silnikiem 2 198 cm³, liczba miejsc-7, dopuszczalna masa ca.-3 500 kg, a dla potrzeb obsługi Urzędu Gminy, w miejsce zlikwidowanego Volkswagena został zakupiony samochód Nissan Qashqai (Fot.88), rok produkcji 2007, z silnikiem benzynowym o pojemności 1997 cm³.	
Struktura finansowania zadania	
<i>Wartość całkowita</i>	<i>Budżet Gminy</i>
69 500,00 zł	69 500,00 zł

Efekt rzeczowy inwestycji

Fot. 87. Samochód Peugeot Furgon na potrzeby brygady gospodarczej.



Fot. 88. Samochód osobowy Nissan zakupiony w roku 2019.

Rozdział VI. Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego.

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

1) Budowa nowego oświetlenia ulicznego:

- 1.1 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej.
- 1.2 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej.
- 1.3 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dąbrowieckiej w Osówc.
- 1.4 Budowa oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40).
- 1.5 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie - I etap.
- 1.6 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa.
- 1.7 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówc na ul. Przy Lesie.
- 1.8 Budowa oświetlenia przy części zamieszkałych działek nr 101/...w Osówc - dokumentacja projektowa.
- 1.9 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku.
- 1.10 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowej w Sicienku.
- 1.11 Montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca.
- 1.12 Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki – Osowiec, między posesjami 41,48 i 68 - etap I.
- 1.13 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w Trzemiętowo Kol. - opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.14 Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23 w Trzemiętówku.
- 1.15 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Pawłóvk.
- 1.16 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i Wrzosowej w Pawłóvk – I etap.
- 1.17 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Świerkowej w Pawłóvk.
- 1.18 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - ul. Krótka.
- 1.19 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - ul. Wąska.
- 1.20 Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłóvk - przy przystanku autobusowym na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej.
- 1.21 Rozbudowa oświetlenia ul. Dworska, Grodzka i Królewska w Dąbrówce Nowej – opracowanie dokumentacji i postawienie jednej lampy – I etap.
- 1.22 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Malinowej w Osówc.
- 1.23 Rozbudowa oświetlenia na drodze do tartaku w Teresinie.

2) Podniesienie standardu oświetlenia – podwieszenia wykonane przez ENEA Oświetlenie:

- 2.1 Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Starowiejskiej w Osówc.
- 2.2 Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Akacyjowej w Sicienku.
- 2.3 Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Goncarzewy (blok nr 1).
- 2.4 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Wierzchucicach.
- 2.5 Budowa 1 punktu świetlnego w Ugodzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1532C Ugoda-Strzelewo i drogi gminnej w kierunku posesji nr 12.
- 2.6 Budowa 1 punktu świetlnego w Zawadzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1533C Sitno-Zawada z drogą prowadzącą do posesji nr 21.

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Długość linii zasilającej [m]	Ilość pkt. świetlnych [szt]
1.	ul. Lawendowa w Dąbrówce Nowej	245	4
2.	ul. Ziemiańska w Dąbrówce Nowej	lam. solarna	1
3.	ul. Dąbrowiecka w Osówcu	lam. solarna	1
4.	Gliszcz Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40)-I etap	253	3
5.	ul. Zbożowa w Kruszynie - I etap	477	4
6.	Nowa Ruda na dz. 163/2	dok. tech.	1
7.	ul. Przy Lesie w Osówcu	0	1
8.	Osiedle mieszkaniowe na dz. nr 101/.. w Osówcu	dok. tech.	1
9.	ul. Klonowa w Sicieniu	233	4
10.	ul. Akacyjowa w Sicieniu	207	4
11.	Droga do Kamieńca (od strony dr.woj. 244)	300	5
12.	Droga gminna Osówek – Szczutki – I etap	206	3
13.	Droga gminna w Trzemiętowo Kol.	dok. tech.	1
14.	Droga gminna przy posesji nr 23 w Trzemiętówku	15	1
15.	ul. Leśna w Pawłótku	358	6
16.	ul. Dębowa i Wrzosowa w Pawłótku – I etap	173	3
17.	ul. Świerkowa w Pawłótku	0	4
18.	Zielonczyn - ul. Krótka	75	1
19.	Zielonczyn - ul. Wąska	125	2
20.	Pawłówek przystanek autob. przy ul. Orzechowej	67	1
21.	ul. Dworska, Grodzka i Królewska w Dąbrówce Nowej – I etap	26 dok. tech.	1 1
22.	ul. Malinowej w Osówcu	172	4
23.	Droga gminna do tartaku w Teresinie	100	2
24.	Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Starowiejskiej w Osówcu	0	3
25.	Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Akacyjowej w Sicieniu	55	1
26.	Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Goncarzewy (blok nr 1)	132	1
27.	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Wierzchucicach	149	1
28.	Skrzyżowaniu drogi powiatowej 1532C Ugoda-Strzelewo i drogi gminnej w kierunku posesji nr 12 w Ugodzie	0	1
29.	Skrzyżowaniu drogi powiatowej 1533C Sitno-Zawada z	563	1

	drogą prowadząca do posesji nr 21 w Zawadzie		
Razem		3 931	63

3. Struktura finansowania zadań w 2019 roku:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie oświetlenia		
<i>Wartość całkowita</i>	<i>Budżet Gminy</i>	<i>Udział mieszkańców</i>
423 059,75 zł	419 369,75 zł	3 690,00 zł

1.1 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej.

Przebieg inwestycji		
Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej została wykonana w roku 2018 przez mieszkańca tej ulicy. Podczas zebrania wiejskiego sołectwa Osówiec we wrześniu 2018 r. mieszkańcy zdecydowali, aby część funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 16 000,00 zł przeznaczyć na budowę tego oświetlenia. W połowie roku 2019 został wyłoniony wykonawca robót, który zrealizował wykonany wcześniej projekt. W finansowaniu inwestycji uczestniczyli mieszkańcy ulicy Lawendowej, którzy na ten cel dobrowolnie zebrali i wpłacili do kasy gminnej kwotę 3 690,00 zł.		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Linia kablowa typu YAKXS 4x35 mm ²	245 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy o wys. 10 m, z wysięgnikiem	4 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa LED o mocy 53W, 6 650 lm	4 szt.
4.	Szafka oświetleniowa jednofazowa	1 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2019)	Mieszkańcy ul. Lawendowej
28 684,06 zł	23 705,02 zł	3 690,00 zł



Fot. 89. Nowe oświetlenie na ul. Lawendowej w Dąbrowce Nowej.

1.2 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrowce Nowej.

Przebieg inwestycji


O realizację zadania wnioskowali mieszkańcy tej części miejscowości Dąbrowka Nowa, podczas zebrania wiejskiego ws. podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2019. W związku z tym, że w roku 2019 była realizowana budowa drogi gminnej Osówek – Dąbrowka Nowa, która w części przebiega przez ul. Ziemiańską, a projekt drogi przewidywał oświetlenie skrzyżowania ul. Ziemiańskiej i Grodzkiej w Dąbrowce Nowej, dlatego wniosek mieszkańców został w taki sposób zrealizowany. W ramach zadania budowy drogi została zamontowana latarnia uliczna solarna, hybrydowa. Wartość finansowa tego zadania uwzględniona jest w kosztach budowy drogi, która dofinansowana była ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Lampa solarna hybrydowa	1 szt.
----	-------------------------	--------

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
Wartość wybudowanego oświetlenia – 10 063,24 zł została uwzględniona w kosztach Rozbudowy drogi Osówek – Dąbrówka Nowa	

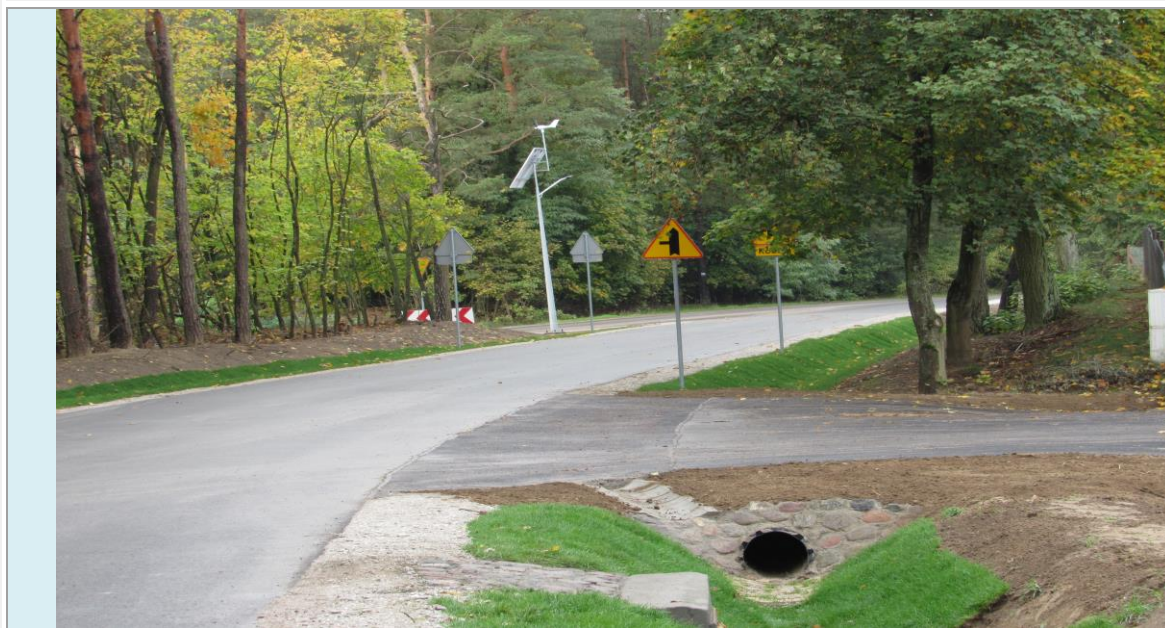

Fot. 90. Nowy punkt świetlny – latarnia solarna na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej.

1.3 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dąbrowieckiej w Osówcu.

Przebieg inwestycji

O realizację zadania wnioskowali mieszkańcy miejscowości Osówek. W związku z tym, że w roku 2019 była realizowana budowa drogi gminnej Osówek – Dąbrówka Nowa, która w części przebiega przez ul. Dąbrowiecką, a projekt drogi przewidywał oświetlenie skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Dąbrowiecką w Osówcu, dlatego wniosek mieszkańców został w taki sposób zrealizowany. W ramach zadania budowy drogi została zamontowana latarnia uliczna solarna, hybrydowa. Wartość finansowa tego zadania uwzględniona jest w kosztach budowy drogi, która dofinansowana była ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Lampa solarna hybrydowa	1 szt.
----	-------------------------	--------

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

Wartość wybudowanego oświetlenia – 10 063,25 zł została uwzględniona w kosztach Rozbudowy drogi Osowiec – Dąbrówka Nowa



Fot. 91. Nowy punkt świetlny – latarnia solarna na ul. Dąbrowieckiej w Osówcu.

1.4 Budowa oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia – etap I.

Przebieg inwestycji

Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gliszcz. Jego celem była budowa nowej linii oświetlenia drogowego na terenie nowej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Gliszcz Kolonia. Po wykonaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonawca - PW. „KALA” z Bartlewa, wyłoniony w trybie zapytania ofertowego wykonał roboty budowlano – montażowe przewidziane do wykonania w roku 2019 jako I etap realizacji projektu. W wyniku realizacji zadania w Gliszczu powstała nowa infrastruktura oświetlenia ulicznego z trzema latarniami z oprawami typu LED z redukcją mocy.

Efekt rzeczowy inwestycji

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm²

253 m

2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m	3 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.	3 szt.
4.	Szafka oświetleniowa jednofazowa	1 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
35 345,74 zł	35 345,74 zł



Fot. 92 i 93. Nowa infrastruktura oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kol.

1.5 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie - I etap.

Przebieg inwestycji

Konieczność realizacji zadania inwestycyjnego został zgłoszona przez mieszkańców Kruszyna na zebraniu wiejskim w roku 2017. W roku 2018 została wykonana mapa do celów projektowych, dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Podczas zebrania wiejskiego ws. podziału funduszu sołectwa Kruszyn na rok 2019, mieszkańcy postanowili część tego funduszu w kwocie 15 tys. zł przeznaczyć na wykonanie w br. I etapu zaprojektowanego oświetlenia. Prace budowlano-montażowe w zakresie I etapu zostały wykonane w połowie roku 2019 przez firmę budowlaną z Chojnic. Ich efektem jest linia kablowa oraz 4 latarnie uliczne z oprawami typu LED z redukcją mocy.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa YAKYXS 4x16 mm ²	473 m
2.	Linia kablowa YAKY 4x35 mm ² (przyłącze zasilające SO)	4 m
3.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m	4 szt.

4.	Oprawa oświetleniowa z lampą URBINO LED 55 W, 6100 lm.	4 szt.
5.	Szafka oświetleniowa trójfazowa	1 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2019)
35 464,70 zł	24 470,53 zł



Fot. 94 i 95. Prace budowlano - montażowe przy budowie oświetlenia na ul. Zbożowej w Kruszynie.

1.6 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie – dokumentacja techniczna.

Przebieg inwestycji


Konieczność realizacji zadania inwestycyjnego została zgłoszona przez mieszkańców Nowej Rudy na zebraniu wiejskim sołectwa Mochle w roku 2018. Mieszkańcy postanowili część funduszu sołeckiego sołectwa Mochle na rok 2019 w kwocie 5 tys. zł przeznaczyć na wykonanie w br. dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244. W ciągu roku została wykonana mapa do celów projektowych, dokumentacja techniczna oraz złożono wniosek do wojewody kujawsko-pomorskiego o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji tego projektu planuje się w roku 2020.

Efekt rzeczowy inwestycji

Została sporządzona dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim. Zaprojektowano linię kablową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 na terenie działki nr 163/2 wraz ze słupami oświetleniowymi.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
7 981,93 zł	7 981,93 zł

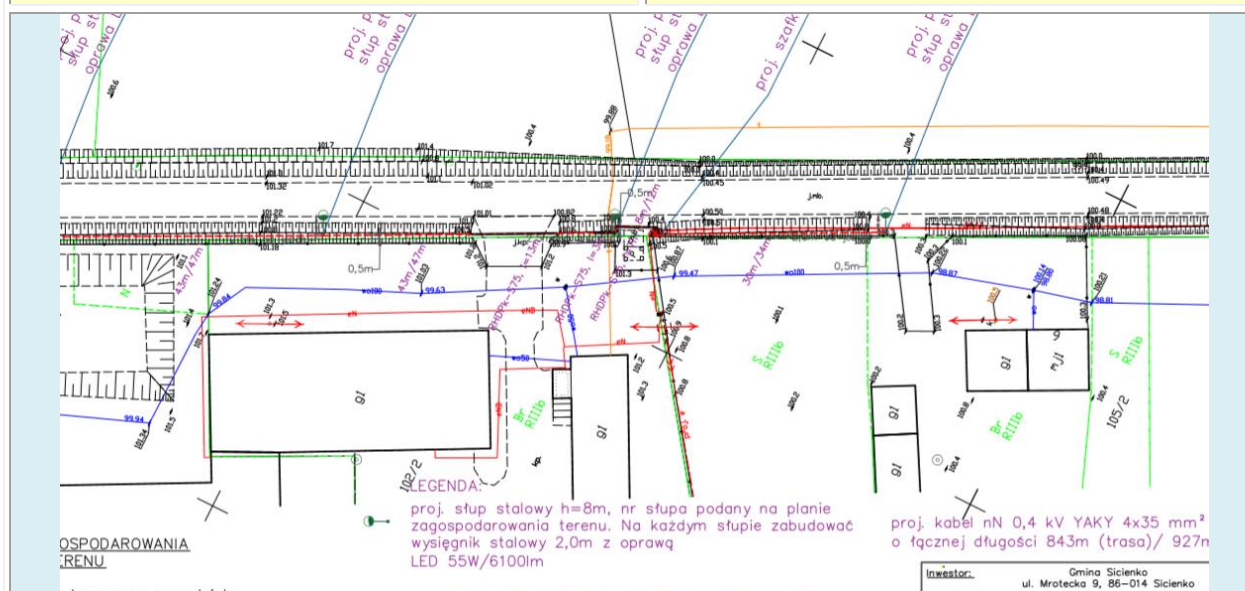

Fot. 96. Wyrzys z plan sytuacyjnego oświetlenia w Nowej Rudzie (fragment dokumentacji technicznej).

1.7 Budowa oświetlenia w Osówcu – ul. Przy Lesie.

Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na ul. Przy Lesie w Osówcu została wykonana w roku 2013. Od tego czasu projekt jest realizowany. Co roku montowane są kolejne latarnie uliczne. W roku bieżącym na wniosek mieszkańców oraz wsparcie finansowe ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Osowiec na 2019 r. w kwocie 2 tys. zł została wybudowana kolejna latarnia uliczna w miejscu wskazanym przez mieszkańców ulicy. Prace budowlano-montażowe zostały wykonane przez PPHU ELJAN s.c. z Książa Wlkp.

Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m wraz z wysięgnikiem	1 szt.
2.	Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 70 W	1 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy (Rok 2019)
81 932,32 zł		3 444,00 zł
		
Fot. 97. Nowy punkt świetlny na ul. Przy Lesie w Osówcu.		

1.8 Budowa oświetlenia przy części zamieszkałych działek nr 101/.. w Osówcu - dokumentacja projektowa.

Przebieg inwestycji
Na terenie nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych na działkach 101/... w Osówcu buduje się coraz więcej domów. Na wniosek mieszkańcy tego osiedla na zebraniu wiejskim w roku 2018 podjęto uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego sołectwa Osówiec na rok 2019, w


kwocie 13 tys. zł na wykonanie w br. dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego. W ciągu roku została wykonana mapa do celów projektowych, dokumentacja techniczna oraz w październiku został złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Roboty budowlano-montażowe w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej wykonywane będą w kolejnych latach z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim	1 kpl.
----	---	--------

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
10 071,24 zł	10 071,24 zł

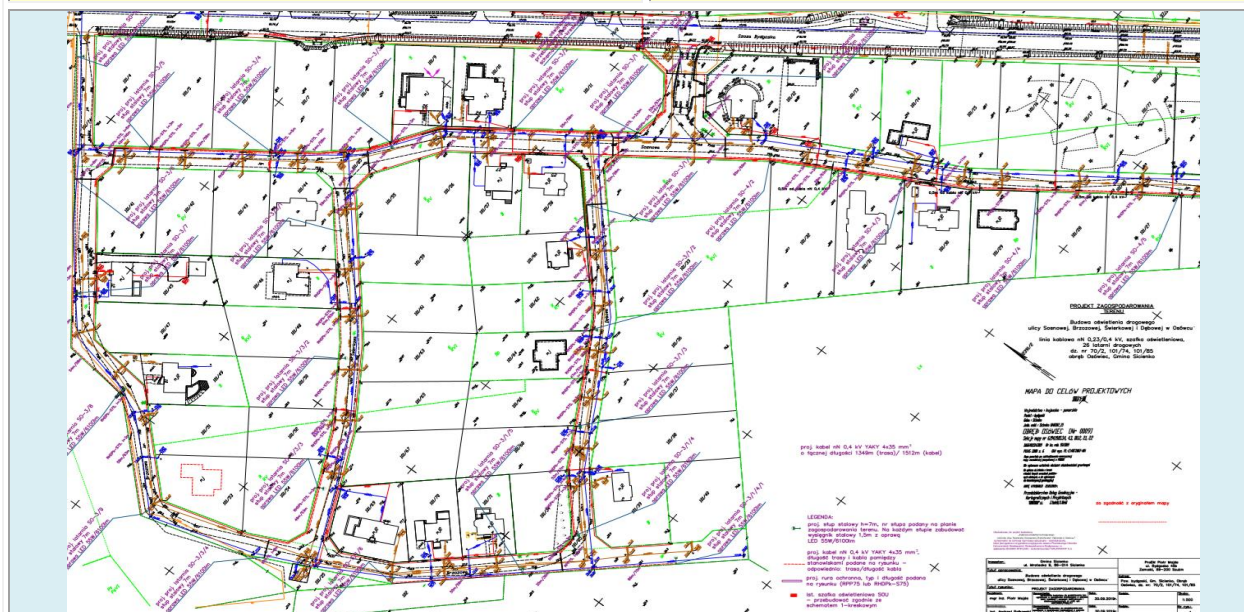

Fot. 98. Plan sytuacyjny oświetlenia na terenie dz. nr 101/... w Osówcu.

1.9 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku.

Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na ul. Klonowej w Sicienku została wykonana w roku 2018. Podczas zebrania wiejskiego sołectwa Sicienko we wrześniu 2018 r. mieszkańcy zdecydowali, aby część funduszu sołectkiego na rok 2019 w kwocie 12 824,90 zł przeznaczyć na

budowę tego oświetlenia. Wiosną roku 2019 został wyłoniony wykonawca robót, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa, który zrealizował wykonany wcześniej projekt. Odbiór końcowy odbył się już 26 kwietnia 2019 r. i od tego dnia ulica Klonowa jest ładnie oświetlona.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa YAKY 4x16 mm ²	230 m
2.	Linia kablowa YAKY 4x35 mm ² (przyłącze zasilające SO)	3 m
3.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m	4 szt.
4.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 50 W, 5 500 lm.	4 szt.
5.	Szafka oświetleniowa jednofazowa	1 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2019)
33 080,08 zł	28 474,50 zł



Fot. 99. Oświetlenie drogowe na ul. Klonowej w Sicienku.

1.10 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacjowej w Sicienku.**Przebieg inwestycji**

Pierwszy odcinek ul. Akacjowej (od ul. Lipowej) został oświetlony w latach ubiegłych. O kontynuację oświetlenia wnioskowali mieszkańcy tej ulicy podczas zebrania wiejskie w Sicienku w roku 2018. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców w budżecie gminy na rok 2019 zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie oświetlenia do końca ul. Akacjowej. Z uwagi na złożony stan własnościowy istniejącego oświetlenia zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza z nich, jako część inwestycyjna polegała na opracowaniu dokumentacji technicznej, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wykonaniu linii kablowej oświetlenia drogowego oraz montaż czterech latarni ulicznych z oprawami typu LED z redukcją mocy. Prace budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa. Druga część tego zadania została zakwalifikowana jako zadanie nieinwestycyjne, polegające na podniesieniu standardu oświetlenia należącego do firmy Enea. W ramach tego zadania została przedłużona linia oświetleniowa Enea i zamontowano jedną latarnię uliczną.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Linia kablowa YAKY 4x35 mm ²	207 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m	4 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6 100 lm. z redukcją mocy	4 szt.
4.	Szafka oświetleniowa jednofazowa	1 szt.
5.	Linia kablowa	55 m
6.	Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 100 W	1 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2019)
55 646,89 zł	31 665,58 zł
3 660,85 zł	3 660,85 zł



Fot. 100 i 101. Oświetlenie drogowe na ul. Akacyjowej w Sicienکو.

1.11 Budowa oświetlenia w Kamieńcu.

Przebieg inwestycji

W roku 2017 została sporządzona dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim. Zaprojektowano od istniejącej lampy (skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką 244 w kierunku do wsi Kamieniec) linię kablową wraz z 5 słupami oświetleniowymi. Podczas zebrania wiejskie sołectwa Strzelewo ws. podziału funuszu sołeckiego na rok 2019, mieszkańcy podjęli uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego w kwocie 25 tys. zł na wykonanie robót budowlano-montażowych zaprojektowanego wcześniej oświetlenia. Do robót budowlanych przystąpiono już wczesną wiosną 2019 r. Prace wykonane były przez PPHU ELJAN s.c z Książa Wlkp. Wynikiem realizacji projektu jest linia kablowa z pięcioma latarniami i oprawami typu LED.

Efekt rzeczowy inwestycji

1	Linia kablowa YAKY 4x35 mm ²	300 m
2	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m	5 szt.
3	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6 100 lm. z redukcją mocy	5 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy - 2019 r.
34 096,22 zł	29 089,50 zł



Fot. 102. Linia oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej do Kamieńca.

1.12 Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki – Osówiec między posesjami 41,48 i 68 - etap I.

Przebieg inwestycji

Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szczutki, które na ten cel przeznaczyło kwotę 16 735,86 zł. Jego celem była budowa nowej linii oświetlenia drogowego na terenie nowej zabudowy w miejscowości Szczutki w ciągu drogi gminnej z Osówca do Szczutek. Po wykonaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonawca -PW. „KALA” z Bartlewa, wyłoniony w trybie zapytania ofertowego wykonał roboty budowlano –montażowe przewidziane do wykonania w roku 2019, jako I etap realizacji projektu. W wyniku realizacji zadania w Gliszczu powstała nowa infrastruktura oświetlenia ulicznego z trzema latarniami z oprawami typu LED z redukcją mocy.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa YAKY 4x35 mm ²	206 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m	3 szt.

3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.	3 szt.
4.	Szafka oświetleniowa jednofazowa	1 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
28 776,31 zł	28 776,31 zł



Fot. 103. Wykopy pod ułożenie linii kablowej do oświetlenia drogi w Szczutkach.



Fot.104. Nowoczesna oprawa LED z redukcją mocy firmy LUG.

1.13 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w Trzemiętowo Kol. – opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji

Mieszkańcy Trzemiętowa na zebraniu wiejskim w roku 2018 postanowili część funduszu sołeckiego na rok 2019, w kwocie 14 tys. zł przeznaczyć na wykonanie w br. dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej przebiegającej przez Trzemiętowo Kolonia. W ciągu roku uzyskano warunki przyłączenia do sieci Enea Operator i podpisano umowę przyłączeniową. Następnie została wykonana mapa do celów projektowych, dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim i został złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa YAKY 4x35 mm ²	15 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m	1 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.	1 szt.
4.	Szafka oświetleniowa jednofazowa	1 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
11 745,27 zł	11 745,27 zł



Fot.106. Szafka oświetlenia drogowego w Trzemińtówku.



Fot.107. Latarnia uliczna na drodze w Trzemińtówku.

1.15 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Pawłóoku.**Przebieg inwestycji**

Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołectkiego na rok 2019 sołectwa Pawłówek. Jego celem była budowa nowej linii oświetlenia drogowego na terenie nowej zabudowy w ciągu ulicy Leśnej. W ramach zadania sporządzono mapę do celów projektowych, uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej, następnie została wykonana dokumentacja techniczna, którą po uzgodnieniu z mieszkańcami ulicy skierowano do Starosty Bydgoskiego celem wydania pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu wykonawca robót wyłoniony w przetargu tj. P.W. ELEKTROBRAND Jacek Jarzembski z Pawłówka wykonał roboty budowlano – montażowe. W wyniku realizacji zadania na ul. Leśnej w Pawłóoku powstała nowa infrastruktura oświetlenia

ulicznego z sześcioma latarniami z oprawami typu LED z redukcją mocy.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa YAKY 4x35 mm ²	358 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m	6 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.	6 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
34 497,81 zł	34 497,81 zł



Fot.108. Wykopy pod ułożenie linii kablowej do oświetlenia ul. Leśnej.



Fot.109. Nowe oświetlenie na ul Leśnej z oprawmi LED z redukcją mocy firmy LUG.

1.16 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i Wrzosowej w Pawłówku.

Przebieg inwestycji

Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 sołectwa Pawłówek. Jego celem była budowa nowej linii oświetlenia drogowego na terenie nowej zabudowy w ciągu ulicy

Dębowej i Wrzosowej. W ramach zadania sporządzono mapę do celów projektowych, uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej, następnie została wykonana dokumentacja techniczna, którą po uzgodnieniu z sołtysem skierowano do Starosty Bydgoskiego celem wydania pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu wykonawca robót wyłoniony w przetargu wykonał roboty budowlano – montażowe w zakresie przewidzianym do wykonania w roku 2019, jako I etap realizacji inwestycji. W wyniku realizacji I etapu, na ul. Dębowej i Wrzosowej w Pawłótku powstała nowa infrastruktura oświetlenia ulicznego z trzema latarniami z oprawami typu LED z redukcją mocy.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa YAKY 4x35 mm ²	173 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m	3 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.	3 szt.
4.	Szafka oświetleniowa jednofazowa	1 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
26 745,58 zł	26 745,58 zł



Fot.110. Nowe oświetlenie na ul. Dębowej z oprawmi LED z redukcją mocy firmy LUG.

1.17 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Świerkowej w Pawłówku, etap II i III.**Przebieg inwestycji**


Dokumentacja techniczna i I etap realizacji oświetlenia drogowego w ciągu ul. Świerkowej w Pawłówku został wykonany w latach ubiegłych. W ostatnim czasie na tej ulicy wybudowano kilka nowych domów mieszkalnych i powstała potrzeba budowy kolejnych punktów świetlnych. Dlatego w br. na wybudowanej wcześniej linii kablowej oświetlenia drogowego z pozostawionymi zapasami kabla zostały zamontowane cztery nowe latarnie. Zadanie tegoroczne realizowane było w dwóch etapach. Pierwszy z nich (jedna latarnia) został wykonany przez firmę PPHU ELJAN s.c. z Książa Wlkp. w marcu br. Etap drugi (3 latarnie) został wykonany przez firmę P.W. ELEKTROBRAND Jacek Jarzembski z Pawłówka, z nieodpłatnie przekazanych gminie przez wykonawcę drogi S5 materiałów, w sierpniu br. Tym samym cały projekt w zakresie ul. Świerkowej w Pawłówku został w tym roku zamknięty.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m	1 szt.
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m	3 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W	4 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
6 642,00 zł	6 642,00 zł



Fot.111. Nowe oświetlenie na ul. Świerkowej w Pawłówku.

1.18 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - ul. Krótka.**Przebieg inwestycji**

Dokumentacja techniczna na budowę przedmiotowego oświetlenia została wykonana w roku 2018. Współfinansowana była ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zielonczyn na rok 2018. W roku 2018 uzyskano również decyzję o pozwoleniu na budowę. Z tego względu możliwe było wykonanie robót budowlano-montażowych już w pierwszych miesiącach br. Prace te zostały wykonane przez firmę P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa w maju 2019 r.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa YAKY 4x25 mm ²	75 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 6 m	1 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED o mocy 70 W, 6 700 lm.	1 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2019)
13 835,04 zł	9 901,50 zł



Fot.112. Nowe oświetlenie na ul. Krótkiej w Zielonczynie.

1.19 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - ul. Wąska.

Przebieg inwestycji		
Dokumentacja techniczna na budowę przedmiotowego oświetlenia została wykonana w roku 2018. Współfinansowana była ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zielonczyn na rok 2018. W roku 2018 uzyskano również decyzję o pozwoleniu na budowę. Z tego względu możliwe było wykonanie robót budowlano-montażowych już w pierwszych miesiącach br. Prace te zostały wykonane przez firmę P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa w maju 2019 r.		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Linia kablowa YAKY 4x25 mm ²	125 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 6 m	2 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED o mocy 70 W, 6 700 lm.	2 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy (Rok 2019)
21 276,54 zł		17 343,00 zł
		
Fot.113. Nowe oświetlenie na ul. Wąskiej w Zielonczynie.		

1.20 Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłótku - przy przystanku autobusowym na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej.

Przebieg inwestycji

Niewielkie zadanie, długość linii kablowej oświetlenia drogowego to zaledwie 67 m, ale okazało się bardzo skomplikowanym proceduralnie w fazie projektowania, która realizowana była w roku 2018. Długi okres projektowania, który sprawił, że zadanie nie zostało ukończone w ubiegłym roku wynikał z tego, że linia kablowa przebiegała przez grunty gminne, prywatne i będące własnością skarbu państwa we władaniu GDDKiA stanowiących pas drogowy, drogi krajowej nr 10. Projekt dokumentacji technicznej był bardzo długo uzgadniany z poszczególnymi właścicielami terenu, a następnie należało na tak niwielki odcinek uzyskać pozwolenie na budowę od wojewody i od starosty. Po uzyskaniu pozwoleń, co miało już miejsce w tym roku możliwym było wybudowanie zaplanowanego oświetlenia. Prace budowlano-montażowe zostały wykonane przez firmę P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa w terminie dwóch dni, w maju 2019 r.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa YAKY 4x25 mm ²	67 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 6 m	1 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED o mocy 70 W, 6 700 lm.	1 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy- Rok 2019
17 470,50 zł	12 678,42 zł



Fot.114. Oświetlenie przy przystanku autobusowym przy drodze krajowej nr 10 w Pawłówku.

6.21 Rozbudowa oświetlenia, ul. Dworska, Grodzka i Królewska w Dąbrówce Nowej – opracowanie dokumentacji i postawienie jednej lampy.

Przebieg inwestycji		
Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 sołectwa Dąbrówka Nowa, które na ten cel przeznaczyło kwotę 12 tys. zł. Jego celem było zaprojektowanie nowej linii oświetlenia drogowego w ciągu ul. Grodzkiej i wykonanie I etapu robót budowlano-montażowych polegających na postawieniu latarni na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej z ul. Królewską. W ramach zadania sporządzono mapę do celów projektowych, uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej, następnie została wykonana dokumentacja techniczna, którą po uzgodnieniu z sołtysiem skierowano do Starosty Bydgoskiego celem wydania pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu wykonawca robót wyłoniony w przetargu wykonał roboty budowlano – montażowe w zakresie przewidzianym do wykonania w roku 2019, jako I etap realizacji inwestycji. W wyniku realizacji I etapu prac, na ul. Grodzkiej powstała nowa infrastruktura oświetlenia ulicznego z jedną latarnią i oprawą typu LED z redukcją mocy. Zaprojektowana linia oświetleniowa będzie mogła być rozbudowywana w kolejnych latach.		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Linia kablowa YAKY 4x35 mm ²	26 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m	1 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.	1 szt.
4.	Szafka oświetleniowa jednofazowa	1 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy
21 697,66 zł		18 692,77 zł



Fot.115. Nowe oświetlenie na ul. Grodzkiej w Dąbrowce Nowej z oprawą LED z redukcją mocy firmy LUG.

1.22 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Malinowej w Osówcu.

Przebieg inwestycji		
Wybudowane oświetlenie w br. jest elementem składowym dużego projektu pn. Przebudowa drogi gminnej Osowiec Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej. Z uwagi na okres jesienno - zimowy, kiedy oświetlenie jest najbardziej potrzebne, gmina zaleciła wykonawcy, aby w roku 2019 wykonał zaprojektowane oświetlenie drogowe na ul. Malinowej. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni dróg zostaną wykonane w roku 2020.		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Linia kablowa oświetlenia drogowego	172 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy	4 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa typu LED	4 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy
Wartość wybudowanego oświetlenia – 24 268,40 zł została uwzględniona w kosztach Rozbudowy dróg: ul. Pozimkowa, Jagodowa i Malinowa w Osówcu		



Fot.116. Nowe oświetlenie na ul. Malinowej w Osówcu z oprawami LED.

1.23 Rozbudowa oświetlenia na drodze do tartaku w Teresinie.**Przebieg zadania**

Droga gminna w Teresinie (w kierunku Kazina) była oświetlona dotychczas tylko na odcinku zabudowy mieszkaniowej. W ostatnich latach na jej dalszym odcinku powstał tartak oraz gminna przepompownia ścieków. Z tego względu rozbudowa oświetlenia stała się uzasadniona. W roku 2019 na istniejącej linii energetycznej zostały zamontowane dwie oprawy oświetleniowe, które rozwiązały problem. Prace te zostały wykonane w ramach zawartej przez gminę Umowy PUO na rok 2019 z firmą Enea, która ma charakter ryczałtowy w zakresie konserwacji infrastruktury oświetleniowej.

**Efekt rzeczowy zadania**

1.	Przewód sterujący	100 m
2.	Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 70 W	2 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

Oświetlenie zostało wykonane przez firmę Enea Oświetlenie w ramach zawartej umowy na Pełną Usługę Oświetleniową na 2019 rok.



Fot.117. Nowe punkty świetlne na drodze do tartaku w Teresinie.

2) Podniesienie standardu oświetlenia na istniejących liniach:

2.1 Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Starowiejskiej w Osówc.

Przebieg zadania

Dowieszenie kolejnych opraw na istniejącej linii oświetlenia drogowego w ciągu ul Starowiejskiej zostało zgłoszone przez mieszkańców Osówc, a realizowane było ze środków funduszu sołeckiego tego sołectwa na rok 2019. Poprzednie dowieszenia miały miejsce w roku 2017. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

Efekt rzeczowy zadania

1	Oprawa oświetleniowa typu SGS 101/070W	3 szt.
2	Wysięgniki	3 szt.



Fot.118. Oświetlenie ul. Starowiejskiej.



Fot.119. Oświetlenie ul. Starowiejskiej.



Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 377/OP/UI/2019 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2019)
5 525,38 zł	3 126,88 zł

2.2 Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Goncarzewy.

Przebieg zadania

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego przeznaczili część funduszu sołeckiego w kwocie 4 tys. zł sołectwa Teresin na rok 2019 na ten cel. Celem przedsięwzięcia był rozbudowa linii energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Goncarzewy, przy drodze w kierunku bloku mieszkalnego nr 1 i powieszenie na wskazanym przez mieszkańców słupie, nowej oprawy oświetleniowej. Zadanie (ze względów technicznych i względów bezpieczeństwa) wymagało również wymiany wskazanego słupa. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

Efekt rzeczowy inwestycji

1	Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 70 W	1 szt.
2	Wysięgnik	1 szt.

3	Linka oświetleniowa AsXSn 25 mm ²	132 m
4	Nowy słup	1 szt.



Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 377/OP/UI/2019 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
9 415,65 zł	9 415,65 zł



Fot. 120. Nowa oprawa oświetlenia drogowego na drodze do bloku nr 1 w Goncarzewy.

2.3 Podniesienie standardu oświetlenia w Wierzchucicach.

Przebieg zadania

Dowieszenie nowej, kolejnej oprawy na istniejącej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi

gminnej z Wierzchucinka do Wierzchucic zostało zgłoszone przez mieszkańców Wierzchucic, którzy postanowili część funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 2 500,00 zł przeznaczyć na ten właśnie cel. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. W ramach zadania z uwagi na kolizję z istniejącym w ciągu linii transformatorem, konieczne było przeniesienie istniejącej szafki oświetleniowej i zamontowanie 149 m. nowej linki oświetleniowej.

Efekt rzeczowy zadania

1	Oprawa oświetleniowa typu SGS 101/070W	1 szt.
2	Wysięgnik	1 szt.
3	Linka oświetleniowa	149 m



Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 377/OP/UI/2019 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
6 697,73 zł	6 697,73 zł



Fot. 121. Oświetlenie drogi z Wierzchucinka do Wierzchucic.

2.4 Podniesienie standardu oświetlenia w Ugodzie.

Przebieg zadania		
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Ugody, którzy podczas zebrania wiejskiego przeznaczyli część funduszu sołeckiego w kwocie 7 tys. zł sołectwa Zawada-Ugoda na rok 2019 na ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej infrastrukturze energetycznej nowego oświetlenia drogowego (1 latarnia) na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1532C Ugoda-Strzelewo z drogą gminną w kierunku posesji nr 12 w Ugodzie. W ramach zadania, na istniejącym słupie została zamontowana nowa szafka oświetleniowa oraz wysięgnik z oprawą typu LED. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o.		
Efekt rzeczowy zadania		
1	Szafka oświetleniowa	1 szt.
2	Wysięgnik	1 szt.
3	Oprawa typu LED	1 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy
6 370,85 zł		6 370,85 zł
		 <i>Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego w Ugodzie wykonano na istniejącej instalacji energetycznej stanowiącej własność ENEA w ramach zawartej umowy Nr 377/OP/UI/2019 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.</i>
Fot.122. Nowe oświetlenie drogowe w Ugodzie.		

2.5 Podniesienie standardu oświetlenia w Zawadzie.

Przebieg zadania		
Zadanie realizowane na wniosek mieszkańców Zawady, którzy podczas zebrania wiejskiego przeznaczili część funduszu sołeckiego w kwocie 7 tys. zł sołectwa Zawada-Ugoda na rok 2019 na ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej infrastrukturze energetycznej nowego oświetlenia drogowego (1 latarnia) na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1533C Sitno-Zawada z drogą gminną w kierunku posesji nr 21 w Zawadzie. W ramach zadania na istniejącym słupie została zamontowana nowa szafka oświetleniowa oraz wysięgnik z oprawą typu LED. W ramach zadania została zamontowana linka oświetleniowa przebiegająca po istniejących słupach energetycznych przez cały obszar zabudowy tej części miejscowości Zawada, co pozwoli w przyszłości, bez większych kosztów na dowieszenie kolejnych opraw oświetleniowych. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o.		
Efekt rzeczowy zadania		
1	Linka oświetleniowa AsXSn 2x25mm ²	563 m
2	Wysięgnik	1 szt.
3	Oprawa typu LED	1 szt.
 Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 377/OP/UI/2019 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.		
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy
13 778,04 zł		13 778,04 zł



Fot.123. Wybudowane w roku 2019 oświetlenie na skrzyżowaniu dróg w Zawadzie.

Rozdział VII. Inne ważne – strategiczne, ponadlokalne inwestycje realizowane na terenie Gminy Sicienko w roku 2019.

1. Spis zrealizowanych inwestycji:

- 1.1 Budowa drogi ekspresowej S 5.
- 1.2 Budowa drogi ekspresowej S 10 - opracowanie STEŚ.
- 1.3 Budowa sieci gazowej Osówiec – Szczutki – Mochle – opracowanie dokumentacji technicznej.

1.1 Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km.

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót
POLAQUA Sp. z o.o. (lider) ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno DRAGADOS S.A. (partner) Avda. Del Camino de Santiago 50, 28050 Madryt, Hiszpania
W roku 2017 ruszyła budowa drogi ekspresowej S 5. Inwestorem zadania jest GDDKiA oddział w Bydgoszczy. Przedstawiciele gminy Sicienko bardzo aktywnie uczestniczyli w procesie ostatecznego wyboru trasy i szczegółowych rozwiązań projektowych dbając o to, aby nowa droga ekspresowa była optymalnym rozwiązaniem dla mieszkańców naszej gminy. Jest to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Budowa drogi na odcinku Nowe Marzy–Bydgoszcz–granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego” realizowana jest z podziałem na siedem odcinków. Odcinek 4 - od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km przebiega w części przez teren gminy Sicienko. Od drogi krajowej nr 25 w Tryszczynie przebiegać będzie przez Szczutki gdzie usytuowane będzie miejsce obsługi podróżnych (MOP) dalej przez Osówiec, a następnie przez Pawłówek do granicy z gminą Białe Błota. W Pawłówniku zaprojektowany jest duży węzeł drogowy, który spinać będzie drogę S 5, planowaną S 10 oraz drogę krajową nr 80 (w części ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy), przebudowę której również w roku 2017 rozpoczęto, a na koniec roku 2019 zostało już niewiele prac do wykonania. W ramach realizacji S 5 wykonane zostaną drogi serwisowe. Do najbardziej istotnych należą drogi serwisowe oznaczone roboczo nr 29 i 27 w Pawłówniku. Budowa drogi S-5 w roku 2019 miała być zakończona. Niestety stan zaawansowania prac jest jeszcze daleki do zakończenia. Wykonawca ma przedłużony termin zakończenia wszystkich prac. Jednak w ciągu roku 2019 wykonano duży zakres robót. Warto odnotować, że na koniec roku 2019 został oddany do użytku odcinek nr 3 budowanej drogi S 5, w ramach którego został wybudowany węzeł Tryszczyn, który w części usytuowany jest na terenie naszej gminy.
Wartość inwestycji (cena ofertowa z przetargu)
328 476 590,77 zł




Fot. 124. Nowy wiadukt i droga S5 w budowie w Szczutkach.



Fot.125. Budowa odcinka drogi S5 i MOP w Szczutkach.




Fot.126. Budowa odcinka drogi S5 przez Osówiec.

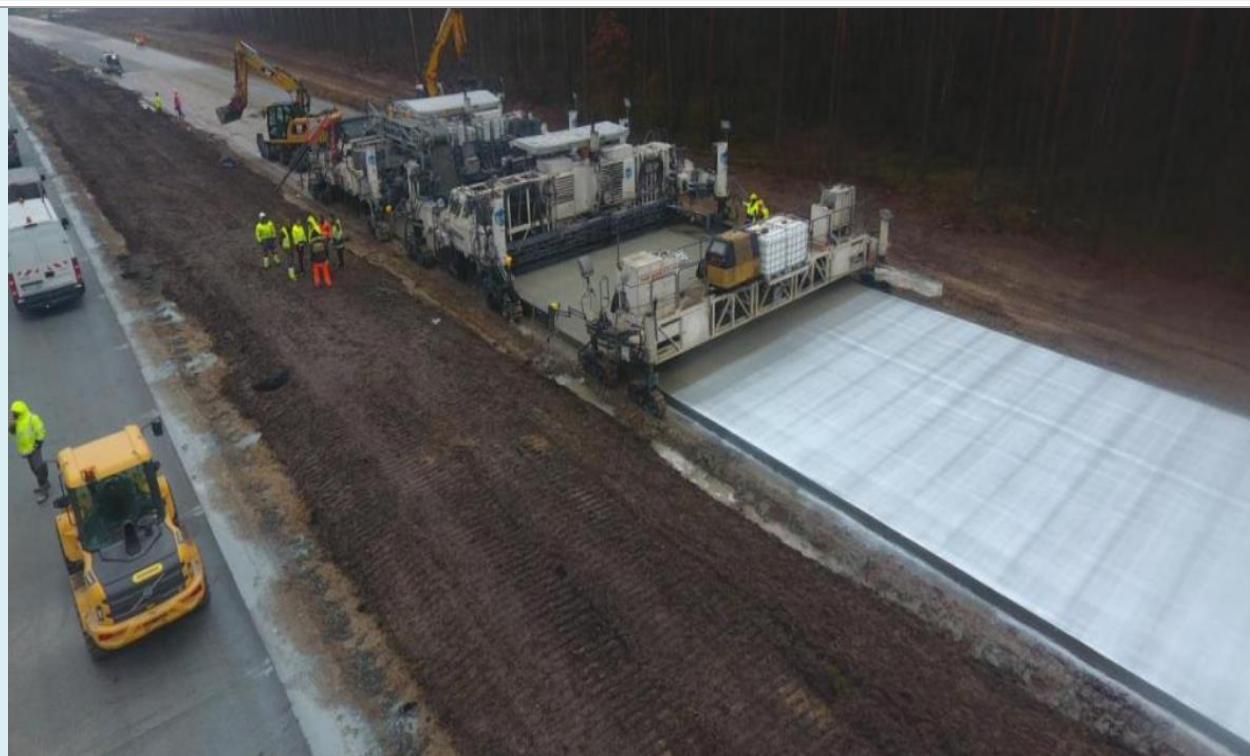

Fot. 127. Układanie nawierzchni betonowej na drodze S5 w Pawłówku.

1.2 Budowa drogi ekspresowej S 10 – przygotowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowego.

Przebieg zadania	
Inwestor: GDDKiA oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6	Wykonawca STEŚ: MOSTY KATOWICE Sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40 - 555 Katowice
Po raz trzeci rozpoczęły się prace koncepcyjne mające na celu przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S 10 na odcinku Pawłówek – Wyrzysk. Wszyscy pamiętamy ile emocji wśród mieszkańców Kruszyń, Pawłówek i Dąbrówki Nowej wywołała koncepcja drogi przedstawiona przez GDDKiA w Bydgoszczy kilka lat wcześniej. Obecne STEŚ na zlecenie GDDKiA opracowuje firma MOSTY Katowice. W dniu 26 czerwca 2019 r. w Sali gimnastycznej w Sicienku, z inicjatywy inwestora i wykonawcy studium odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyło wielu mieszkańców, którzy mogli zapoznać się ze wstępną koncepcją przebiegu planowanej drogi. Inwestor przedstawił 5 rozpatrywanych wariantów. Mieszkańcy mogli zadawać pytania oraz składać pisemne uwagi i zastrzeżenia. Również władze gminy przesłały do inwestora swoje uwagi oraz oczekiwania ws. przebiegu drogi, rozwiązania kolizji z istniejącą siecią dróg lokalnych oraz potencjalnych kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną stanowiącą własność gminy.	

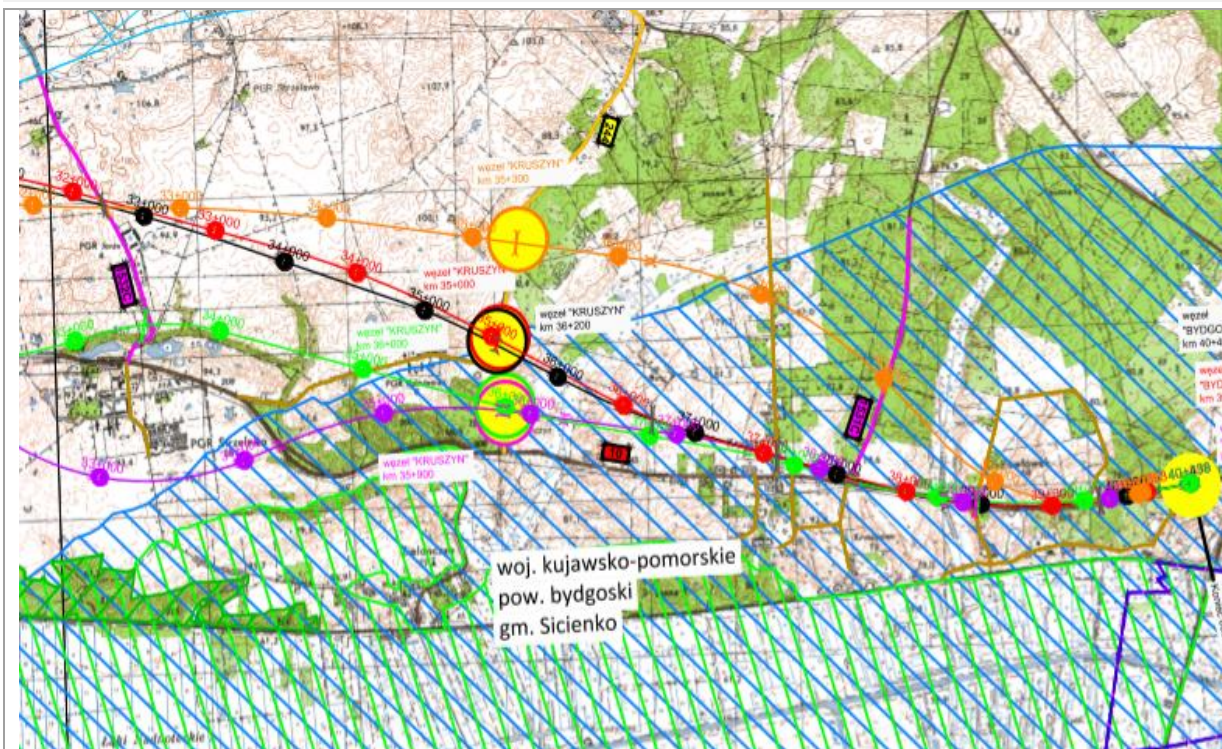

Fot. 128. Wyrys z koncepcji przebiegu drogi S 10 przez teren gminy Sicienko (5 wariantów).

1.3 Budowa sieci gazowej Osówiec – Szczutki – Mochle – opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji

Inwestor:

**Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy**

W roku 2019 rozpoczęły się prace projektowe dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z Osówca Wyb. przez Osówiec do Szczutek i połączenie z istniejącym gazociągami w Mochlu. W ciągu roku przedstawiciele PSG z Bydgoszczy, podczas zebrań wiejskich w Osówcu i Szczutkach przedstawili plany i zamierzenia przygotowywanej inwestycji i zachęcali mieszkańców do składania wniosków o przyłączenie do sieci. Wybrane biuro projektowe z Płocka, w ciągu roku 2019 procedowało decyzję lokalizacyjną oraz przygotowało dokumentację techniczną dla budowy gazociągu. Obecnie projekt jest w trakcie uzgodnień i niebawem zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w roku 2020.




Fot. 129. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę gazociągu do Szczutek.

Rozdział VIII. Struktura finansowania inwestycji zrealizowanych w Gminie Sicienko w 2019 roku.


1. Struktura wydatków na realizację zadań w roku 2019

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota (zł)	Udział w wydatkach całkowitych (%)	Udział w wartości środków zewnętrznych
1	Gmina Sicienko	6 915 744,93	54,39	
2	Budżet Państwa	2 137 667,00	16,81	36,86
3	Unia Europejska	1 578 918,72	12,42	27,23
4	Województwo Kujawsko-Pomorskie	81 000,00	0,64	1,40
5	Powiat Bydgoski	1 531 960,27	12,05	26,42
6	Inwestorzy prywatni	469 515,31	3,69	8,10
7	RAZEM	12 714 806,23	100	100

2 Źródła finansowania zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych na terenie gminy Sicienko w 2019 roku.

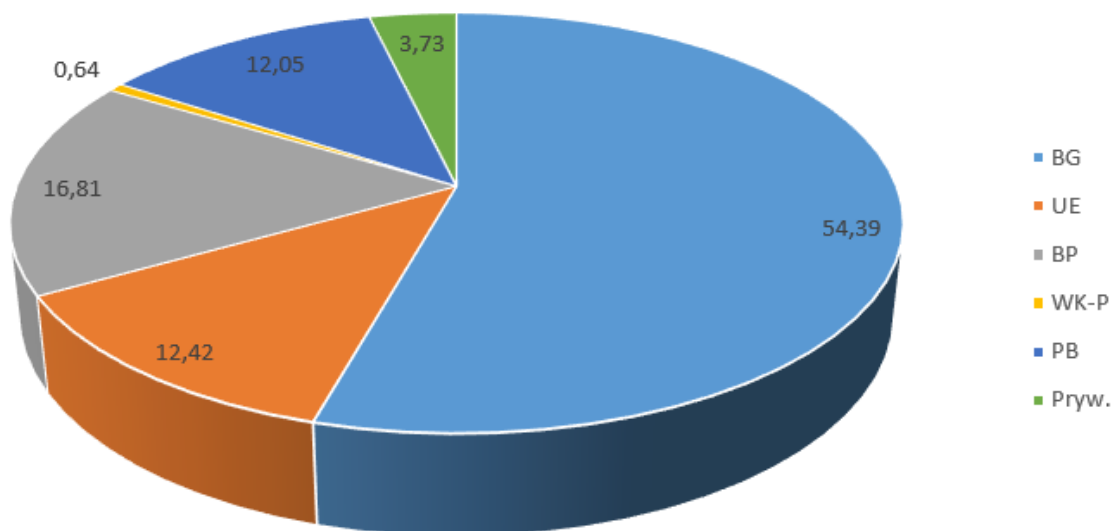

3. Struktura wydatków inwestycyjnych i remontowych w roku 2019

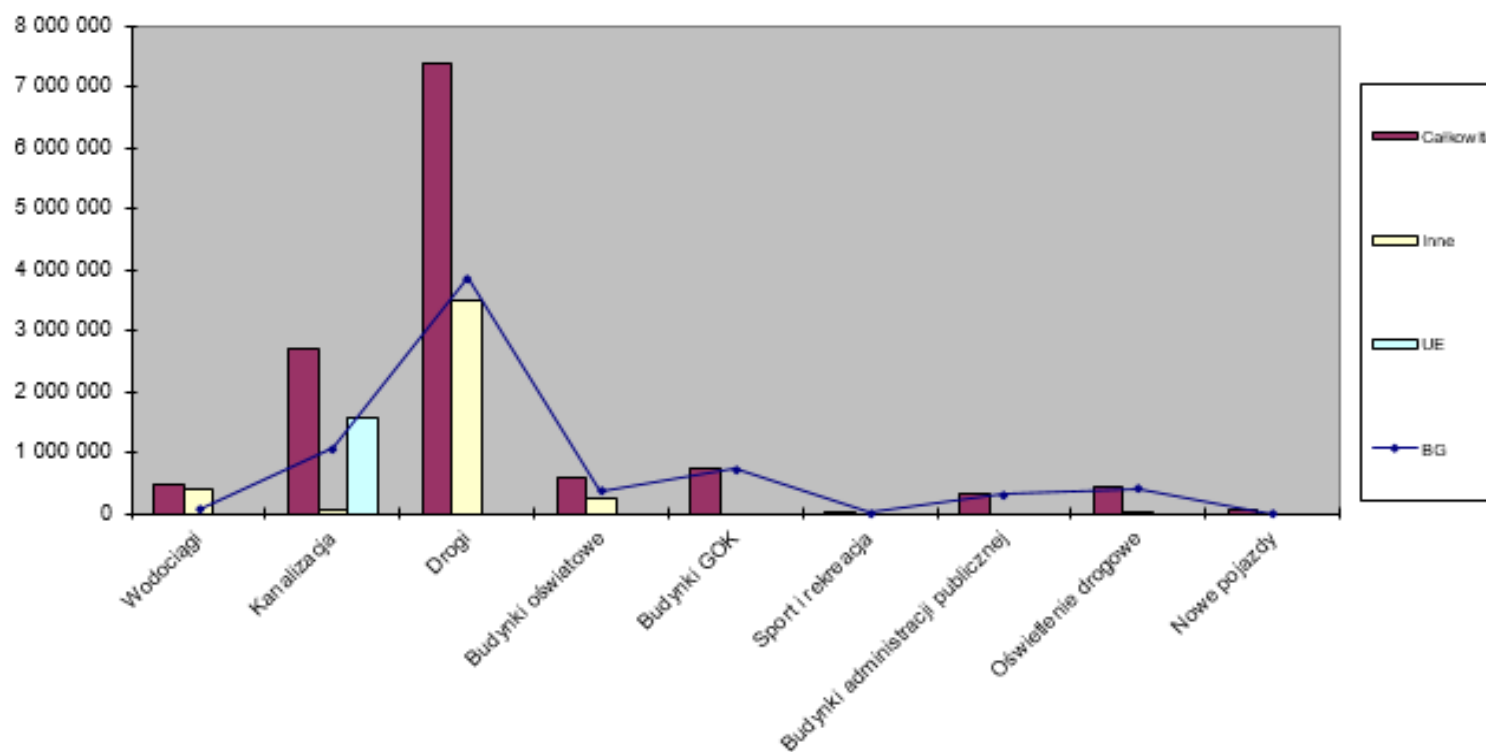

8.4 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE W ROKU 2019 NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania w roku 2019 zł	Kwota dotacji zł	Źródło dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	
I	Zadania na realizację których środki finansowe wpłynęły na rachunek gminy				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Osówcu	2 248 875,92	1 485 418,72	UE-FS -POLiS 2014-2020	zadanie zakończone
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie-etap III	177 803,50	93 500,00	UE-FS -POLiS 2014-2020	zadanie w toku
3	Budowa drogi gminnej w Mochlu	854 176,34	422 880,00 81 000,00	Budżet Państwa -FDS Urząd Marszałkowski w Toruniu	zadanie zakończone
4	Przebudowa drogi w Pawlówku, ul. Mała Góra	524 944,73	261 745,00	Budżet Państwa -FDS	zadanie zakończone
5	Rozbudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osowiec	2 437 816,62	1 218 042,00	Budżet Państwa -FDS	zadanie zakończone
6	Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km 2+ 547 - odcinek I	1 968,00	8 000,00	Budżet Państwa -FDS	zadanie będzie realizowane, odcinek I w roku 2020. Wartość zadania 508 154,01 zł + wykup gruntu
7	Przebudowa drogi gminnej Osowiec Wyb. ul. Poziomkowa, Jagodowa i Malinowa	25 153,50	1 284 409,00	Budżet Państwa -FDS	zadanie będzie kontynuowane w roku 2020 i tu zostanie wykorzystana i rozliczona dotacja. Wartość zadania w roku 2020 - 1 664 577,45 zł.
8	Przebudowa drogi gminnej w Łukowcu od km 0+000 do km 1+217	0,00	397 213,00	Budżet Państwa -FDS	zadanie będzie realizowane w roku 2020 i tu zostanie wykorzystana i rozliczona dotacja. Wartość zadania 601 744,27 zł
9	Przystosowanie budynku SP w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	603 505,05	235 000,00	Budżet Państwa - rezerwa ogólna	zadanie zakończone
10	Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko	146 901,18	146 901,18	UE-RPO/ZIT-2014-2020	udział gminy polegał na wkładzie rzeczowym w postaci udostępnienia sal na prowadzenie zajęć. Projekt zakończony
11	Aktywna Jesień Życia	139 016,94	139 016,94	UE-RPO/ZIT-2014-2020	projekt realizowany przez GOPS
12	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażanie RPO WK-P na lata 2014-2020, poprzez realizację ZIT wojewódzkiego dla BTOF	13 862,19	12 732,19	UE-POPT-2014-2020	
RAZEM środki zewnętrzne jakie wpłynęły na rachunek gminy w roku 2019		7 174 023,97	5 785 858,03		
II	Zadania na które zostały podpisane w roku 2019 umowy na dofinansowanie				
Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość zadania (zł)	Kwota dotacji zł	Źródło dotacji	Uwagi
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie-etap III	5 796 742,15	3 972 489,41	UE-FS -POLiS 2014-2020	zadanie kontynuowane będzie w roku 2020
2	Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km 2+ 547	2 895 116,29	1 693 635,00	Budżet Państwa -FDS	dotacja będzie wykorzystana w latach 2021-2025 na realizację odcinków 1-3.
3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap*	8 568 138,38	3 890 650,20	UE-RPO/ZIT-2014-2020	zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku	326 834,42	256 763,16	UE-RPO/ZIT-2014-2020	zadanie realizowane będzie w roku 2020

RAZEM wartość planowanych zadań i przyznanych dotacji na ich realizację w latach kolejnych	17 586 831,24	9 813 537,77		
SUMA I-II	24 760 855,21	15 599 395,80		

* Wniosek o dofinansowanie został oceniony w roku 2019 pozytywnie, Umowa zostanie podpisana w lutym 2020 roku.

Uwaga: Dotacje z budżetu państwa zostały przyznane na podstawie wartości kosztorysowych planowanych zadań, natomiast ich faktyczna wielkość nie może przekroczyć 50% wartości faktycznych, które zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Dlatego w części przypadków mogą być niższe.

ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W ROKU 2019

Lp.	Zakres wykonanych robót	Miejsce realizacji	Termin	Jednostka miary	Ilość	Wartość PLN	Źródło finansowania		Uwagi
							Budżet gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/19	ZADANIA WODOCIAGOWE - 2019								
1	Sieć wodociągowa Ø 110 i Ø 90	Osówiec	2019	mb.	159,20	27 548,95	27 548,95	0,00	
2	Sieć wodociągowa Ø 90	Trzemiętowo	2019	mb.	206	35061,92	35061,92	0,00	
3	Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia - Mochle- opracowanie dokumentacji.	Mochle	2019	szt.	1	6 541,90	6 541,90	0,00	Dokumentacja techniczna na budowę wodociągu. Analiza w zakresie lokalizacji zbiorn.
4	Przebudowa wodociągu, skrzyżowanie ulic Kolejowa-Mrotecka - opracowanie dokumentacji technicznej	Sicienko	2019	szt.	1	2 945,23	2 945,23	0,00	Dokumentacja techniczna
5	Budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych	Gmina Sicienko	2019	szt/m	90/1163,5	358109,42	0,00	358109,42	Inwestorzy prywatni
6	Wykonanie sieci wodociągowych dla prywatnych inwestorów	Nowa Ruda	2019	mb.	266,10	36208,50	0,00	36208,50	Inwestor prywatny (14 osób)
RAZEM ZADANIA WODOCIĄGOWE		sieć wodociągowa		mb.	631,30	466 415,92	72 098,00	394 317,92	Inwestorzy prywatni
		przyłącza wodociągowe		szt.	90/1163,5				
		dokumentacja techniczna		szt.	2				
II/19	ZADANIA KANALIZACYJNE - 2019								

1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III	Kruszyn	2019	Kanalizacja grawitacyjna Ø 200 i Ø160 -744,60 m; kanalizacja tłoczna - 461,40 m;					
a	sieć kanalizacyjna			mb.	1 206	177 997,70	84 497,70	93 500,00	POIiŚ
b	przykanaliki			szt.	0				
c	tłocznie			szt.	0				
2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Osówcu	Osówek	2019	Kanalizacja grawitacyjna-2732,10 m; kanalizacja tłoczna- 835,95 m; Przykanaliki - 565,40 m 129 szt; studnie betonowe -114; studnie PCV - 24.					
a	sieć kanalizacyjna Ø250;200;160,110			mb.	4 133,45	2 249 108,06	763 689,34	1 485 418,72	POIiŚ
b	przykanaliki			szt.	129				
c	tłocznie			szt.	2				
3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	Wojnowo	2019	x	x	31 365,00	31 365,00	0,00	
4	Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku SP w Kruszynie	Kruszyn	2019	Kanalizacja grawitacyjna Ø160 -115,5 m.; instalacja technologiczna w kuchni.					
a	sieć kanalizacyjna			mb.	115,5	169 069,75	169 069,75	0,00	
b	przykanaliki			szt.	1				
c	tłocznie			szt.	0				
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	Gmkian Sicienko	2019	szt.	8	45 848,81	16 000,00	29 848,81	Inwestorzy prywatni
6	Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych	Szczutki, Mochle, Trzemiętowo	2019	szt./m	55/555,6	37 217,08	0,00	37 217,08	Inwestorzy prywatni
7	Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych z dotacją gminy	Dąbrówka Nowa	2019	szt.	1	8 441,50	4000,00	4 441,50	Inwestor prywatny
RAZEM ZADANIA KANALIZACYJNE		sieć kanalizacyjna		mb.	5 454,95	2 719 047,90	1 068 621,79	1 650 426,11	UE - POIŚ Inwestorzy prywatni
		przykanaliki		szt.	185/1121				
		tłocznie		szt.	2				

III/19	INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE								
1	Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C)	Trzemiętowo	2019	mb.	564	394 961,41	197 480,00	197 481,41	Powiat Bydgoski
2	Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C w miejscowości Gliszcz - nawierzchnia, kanalizacja deszczowa	Gliszcz	2019	mb.	600	1 066 405,20	220 000,00	846 405,20	Powiat Bydgoski
3	Budowa ul. Stawowej w Sicienku	Sicienko	2019	mb.	177	198 545,81	198 545,81	0,00	
4	Budowa ul Grabowej w Sicienku- opracowanie dokumentacji technicznej	Sicienko	2019	szt.	1	23 464,71	23 464,71	0,00	
5	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie - dokumentacja projektowa	Teresin	2019	szt.	1	14 551,43	14 551,43	0,00	
6	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od posesji 33 do 41- opracowanie dokumentacji technicznej	Słupowo	2019	szt.	1	16 937,10	16 937,10	0,00	Wydatek niewygasający- 11 183,16 zł do 30.06.2020
7	Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219)	Mochle	2019	mb.	541	854 176,34	350 296,34	503 880,00	FDS - 422 880,00 FOGR - 81 000,00
8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - opracowanie dokumentacji technicznej	Szczutki	2019	szt.	1	42 651,48	42 651,48	0,00	Wydatek niewygasający- 40 075,86 zł do 30.06.2020

9	Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie - ul. Poziomkowa, Jagodowa i Malinowa - oświetlenie	Osówiec	2019	mb.	0	25 153,50	25 153,50	0,00	Wykonano oświetlenie ul. Malinowej
10	Przebudowa drogi gminnej w Pawłóku ul. Mała Góra	Pawłówek	2019	mb.	415,96	524 944,73	263 199,73	261 745,00	FDS
11	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2 - dokumentacja projektowa	Wojnowo	2019	szt.	1	31 906,20	31 906,20	0,00	
12	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu- dokumentacja projektowa	Trzciniec	2019	szt.	1	46 887,60	46 887,60	0,00	Wydatek niewygasający- 34 799,16 zł do 30.06.2020
13	Rozbudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osówiec	Dąbrówka Nowa, Osówiec	2019	mb.	1 607	2 437 816,62	1 219 774,62	1 218 042,00	FDS
14	Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko - Dąbrówka Nowa- opracowanie dokumentacji	Sicienko, Dąbrówka Nowa	2019	szt.	1	111 944,76	111 944,76	0,00	
15	Remont drogi powiatowej 1528C Trzemiętówko - Sicienko polegający na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienko przy ul. Mroteckiej do ul. Polnej, I etap.	Sicienko	2019	mb.	285	343 170,00	180 000,00	163 170,00	Powiat Bydgoski
16	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienku- dokumentacja techniczna	Sicienko	2019	szt.	1	8 238,54	8 238,54	0,00	
17	Remont drogi gminnej na dz. nr 174/2 w Mochlu- nawierzchnia utwardzona	Mochle	2019	mb.	35	26 910,68	26 910,68	0,00	

18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienka- wykup terenu	Wojnowo, Mochle	2019	x	x	72 570,00	72 570,00	0,00	
19	Zakup kruszywa do remontu dróg - 5 000 ton	Gmina Sicienka	2019	ton	5 000	333 555,73	333 555,73	0,00	3 tys ton- kruszywo 2 tys ton - gruz
20	Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej	Gmina Sicienka	2019	kpl.	1	337 420,97	337 420,97	0,00	W tym równiarka drogowa: Wynajęta z BPRD - 132 471,00
21	Wykonanie i dostawa znaków do oznakowania dróg gminnych	Gmina Sicienka	2019	kpl.	1	3 165,82	3 165,82	0,00	
22	Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km 2+ 547, w tym wykup gruntów zajętych pod drogę	Samsieczno, Marynin	2019	x	x	1 968,00	1 968,00	0,00	
23	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Sicienka	1909 Gliszcz 1910 Uroda	2019	mb.	925,85 470,00	324 903,66	0,00	324 903,66	Powiat Bydgoski
24	Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej	Gmina Sicienka	2019	x	x	135289,91	135289,91	0,00	
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY DRODOWE		nowe drogi		mb.	3 199	7 377 540,20	3 861 912,93	3 515 627,27	Powiat Bydgoski BP- FDS UM - FOGR
		nowe nakładki bitumiczne		mb.	1 396				
		nowe chodniki		mb.	849				
		kanalizacja deszczowa		mb.	600				
		dokumentacje techniczne		szt.	8				
		kruszywo do remontu dróg		ton	5000				

IV/19	OBIEKTY KOMUNALNE								
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - opracowanie dokumentacji i studium wykonalności	Sicienko	2019	szt.	1	24 125,00	24 125,00	0,00	
2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku	Sicienko	2019	szt.	1	207 936,05	207 936,05	0,00	Wydatek niewygasający- 139 584,70 zł do 30.042020
3	Remont pomieszczeń w budynku na ul. Sportowej 2 z przeznaczeniem na pomieszczenia GOPS	Sicienko	2019	szt.	1	77 932,40	77 932,40	0,00	
4	Remont budynku w Wojnowie 18 - opracowanie dokumentacji technicznej	Wojnowo	2019	szt.	1	6 150,00	6 150,00	0,00	
RAZEM OBIEKTY KOMUNALNE		Zmodernizowane obiekty		szt.	2	316 143,45	316 143,45	0,00	
		Dokumentacje techniczne		szt.	2				
V/19	OBIEKTY GOK								
1	Budowa światlicy wiejskiej w Teresinie	Teresin	2019	szt.	1	730 918,69	730 918,69	0,00	
RAZEM OBIEKTY GOK		Nowe budynki GOK		szt.	1	730 918,69	730 918,69	0,00	
		Zmodernizowane budynki GOK		szt.					

VI/19	OBIEKTY OŚWIATY								
1	Przystosowanie budynku SP w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	Wojnowo	2019	szt.	1	603 505,05	368 505,05	235 000,00	Budżet Państwa
RAZEM OBIEKTY OŚWIATY		Zmodernizowane budynki		szt.	1	603 505,05	368 505,05	235 000,00	
VII/19	SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA								
1	Plac zabaw w Sicienku -opracowanie dokumentacji technicznej	Sicienko	2019	szt.	1	4 675,27	4 675,27	0,00	
2	Plac zabaw w Wojnowie -opracowanie dokumentacji technicznej	Wojnowo	2019	szt.	1	4 000,00	4 000,00	0,00	
RAZEM S,T I R		Nowe obiekty		szt.	0	8 675,27	8 675,27	0,00	
		dokumentacje techniczne		szt.	2				
VIII/19	ZAKUPY INWESTYCYJNE								
1	Zakup samochodu do potrzeb brygady gospodarczej	Gmina Sicienko	2019	szt.	1	39 500,00	39 500,00	0,00	
2	Zakup samochodu	Gmina Sicienko	2019	szt.	1	30 000,00	30 000,00	0,00	
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		Nowe pojazdy		szt.	2	69 500,00	69 500,00	0,00	
IX/19	OŚWIETLENIE ULICZNE								
1	Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Starowiejskiej w Osówcu	nowa linia	2019	mb.	0	3 126,88	3 126,88	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	3				
2	Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Akacyjowej w Sicienku	nowa linia	2019	mb.	55	3660,85	3 660,85	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				

3	Podniesienie standardu oświetlenia w m. Goncarzewy (blok nr 1)	nowa linia	2019	mb.	132	9 415,65	9 415,65	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
4	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Wierzchucicach	nowa linia	2019	mb.	149	6 697,73	6 697,73	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
5	Budowa 1 punktu świetlnego w Ugodzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1532C Ugoda-Strzelewo i drogi gminnej w kierunku posesji nr 12.	nowa linia	2019	mb.	0	6370,85	6370,85	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
6	Budowa 1 punktu świetlnego w Zawadzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1533C Sitno-Zawada z drogą prowadzącą do posesji nr 21	nowa linia	2019	mb.	563	13 778,04	13 778,04	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
7	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej	nowa linia	2019	mb.	245	27 395,02	23 705,02	3690,00	wpłata mieszkańców ulicy
		nowe pkt. świetlne		szt.	4				
8	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej	nowa linia	2019	mb.	0	0,00	0,00	0,00	lampa solarna Wartość 10 063,24 ujęto w drogach
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
9	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dąbrowieckiej w Osówcu	nowa linia	2019	mb.	0	0,00	0,00	0,00	lampa solarna. Wartość 10 063,25 ujęto w drogach
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
10	Budowa oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40)	nowa linia	2019	mb.	253	35 345,74	35 345,74	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	3				
11	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie - I etap	nowa linia	2019	mb.	477	24 470,53	24 470,53	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	4				

12	Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa	dokumenytacja tech.	2019	kpl.	1	7 981,93	7 981,93	0,00	
13	Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu na ul. Przy Lesie (1 punkt)	nowa linia	2019	mb.	0	3 444,00	3 444,00	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
14	Budowa oświetlenia przy części zamieszkałych działek nr 101/... w Osówcu- dokumentacja projektowa	dokumenytacja tech.	2019	kpl.	1	10 071,24	10 071,24	0,00	
15	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku	nowa linia	2019	mb.	233	28 474,50	28 474,50	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	4				
14	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowej w Sicienku	nowa linia	2019	mb.	207	31 665,58	31 665,58	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	4				
15	Montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca	nowa linia	2019	mb.	300	29 089,50	29 089,50	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	5				
16	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec, pomiędzy posesjami 41,48 i 68 - etap I	nowa linia	2019	mb.	206	28 776,31	28 776,31	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	3				
17	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w Trzemiętowo Kol. - opracowanie dokumentacji technicznej	dokumentacja technicz	2019	kpl.	1	15 049,05	15 049,05	0,00	
18	Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23 w Trzemiętówku	nowa linia	2019	mb.	15	11 745,27	11 745,27	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
19	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w PawłóWKu	nowa linia	2019	mb.	358	34 497,81	34 497,81	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	6				
20	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i Wrzosowej w PawłóWKu	nowa linia	2019	mb.	173	26 745,58	26 745,58	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	3				
21	Budowa oświetlenia drogowego na	nowa linia	2019	mb.	0	6 642,00	6 642,00	0,00	

	ul.Świerkowej w Pawłównu	nowe pkt. świetlne		szt.	4				
22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - ul. Krótka	nowa linia	2019	mb.	75	9 901,50	9 901,50	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - ul. Wąska	nowa linia	2019	mb.	125	17 343,00	17 343,00	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	2				
24	Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłównu - przy przystanku autobusowym na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej	nowa linia	2019	mb.	67	12 678,42	12 678,42	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
25	Rozbudowa oświetlenia ul. Dworska, Grodzka i Królewska w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji i montaż 1 latarni	nowa linia	2019	mb.	26	18 692,77	18 692,77	0,00	
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
26	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Malinowej w Osówcu	nowa linia	2019	mb.	172	Wartość zadania została uwzględniona w kosztach rozbudowy drogi-ul. Pozimkowa, Jagodowa i Malinowa w Osówcu			
		nowe pkt. świetlne		szt.	4				
27	Rozbudowa oświetlenia na drodze do tartaku w Teresinie	nowa linia	2019	mb.	100	Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach umowy PUO na rok 2019			
		nowe pkt. świetlne		szt.	2				
RAZEM OŚWIETLЕНИЕ ULICZNE		nowa linia	2019	mb.	3931	423 059,75	419 369,75	3 690,00	Mieszkańcy ul. Lawendowej
		nowe pkt. świetlne		szt.	63				
		dokumentacja technicz		szt.	3				
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY		GMINA SICIENKO	2019			12 714 806,23	6 915 744,93	5 799 061,30	UE - POIŚ 1 578 918,72

**Opracowanie wykonano w Urzędzie Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
Referat Inwestycji i Rozwoju
Styczeń 2020 rok.**

Opracował: Krzysztof Kula

